BEEYONDTHEWORLD

Carry
the light.

CRAIE STUDIO / MOROCCO

Direction de production

Faire arriver la bonne personne, le bon produit et le bon matériel au bon endroit.

69 vues de votre parcours
Du brief au bilan final

UN CAS COMPLET POUR COMPRENDRE

Production imaginée • Novembre–décembre 2026
Inspirée de The Poetry of Contrasts
Personnes, budgets et résultats fictifs

Une production, un fil commun.

Le cuir cognac, le lin ivoire et la lumière minérale du Maroc relient les métiers. Les images montrent ce que chacun prépare et transmet.

01 LE BESOIN

Une campagne accessoires : matière, liberté et mouvement. Un sac CM-01, quatre pièces de collection et deux looks.

02 LES PERSONNES

Un talent fictif, Camille R. ; neuf membres d'équipe de production ; douze métiers représentés dans les guides.

03 LE CALENDRIER

Scouting le 2 novembre, préparation le 3, plateau du 4 au 6. Masters attendus le 20 novembre ; lancement prévu le 23.

04 LE PÉRIMÈTRE

12 photos finales et 3 films de 15 s, exportés en 9:16 et 4:5. Europe, digital, 12 mois ; paid media exclu.

05 LES MOYENS

34 500 EUR au total : 12 000 création + 14 000 production + 6 000 Bee + 2 500 action locale. Aucun paiement réel.

06 L'ACTION LOCALE

Atelier de 12 adultes ; cohorte de 60 pots. Dans la simulation, 54 sont vivants à J+30. Aucun impact réel démontré.

VOTRE RÔLE DANS LES ÉCHANGES

VOUS RECEVEZ

Le brief, les cadres approuvés, le budget autorisé et les disponibilités.

VOUS TRANSMETTEZ

Un planning réaliste, une équipe prête, les accès, réservations et sources organisées.

VOTRE PÉRIMÈTRE

La production propose les dépenses ; Bee garde la décision budgétaire.

Visuels créés avec ChatGPT Image. Ils illustrent un scénario, pas des personnes, produits ou événements réels de la campagne historique.

La campagne Craie Maroc est la référence réelle ; ce planning, ces montants et ces mesures sont inventés. Les pages suivantes sont des captures des composants du dashboard alimentés localement par le cas. Les boutons montrés dans le PDF ne sont pas interactifs.

Quand vous intervenez.

Chaque ligne se lit de gauche à droite. Cliquez sur une étape pour atteindre ses écrans. Une étape sans page dédiée reste visible pour comprendre le relais.

00	**Accès et espace personnel** Avant le brief	**CONTRIBUTION** Tous mes projets / Vue du projet / À traiter…	Chaque membre retrouve uniquement ses projets et prépare son profil.
01	**Brief de la marque** 19-23 octobre	**LECTURE** Périmètre du brief / 01 · Intention et émotion / 02 · Message et identité…	Un brief complet : intention, personnes, collection, images, formats, droits et échéance.
02	**Confiance du partenaire local** En parallèle du brief	**PAS D'ÉCRAN DÉDIÉ** Attendre le relais de Partenaire local.	Identité, organisation, gouvernance, compétences et présence locale documentées.
03	**Création et constitution de l'équipe** 24-30 octobre	**CONTRIBUTION** Proposition créative / Moodboard / Sélection du casting…	Concept, moodboard, casting, collection, équipe, accords et budget.
04	**Scouting : de Bee à Flower** 2 novembre	**CONTRIBUTION** Repérages : vue d'ensemble / Fiche lieu / Ajouter un lieu…	Lieux, lumière, accès, plans et affectations des sept disciplines.
05	**Préparation et feu vert** 3 novembre	**CONTRIBUTION** Itinéraire et déplacements / Réservations de l'équipe / Transport…	Itinéraire, réservations, matériel, looks, fitting et continuité beauté.
06	**Conception de l'action locale** Avant l'action terrain	**PAS D'ÉCRAN DÉDIÉ** Attendre le relais de Partenaire local et Bee.	Un atelier pour 12 adultes et un suivi de 60 pots, avec un budget séparé de 2 500 EUR.
07	**Flower : la production** 4-6 novembre	**CONTRIBUTION** Feuille de service / Suivi des plans / Aperçus pendant le tournage…	Feuille de service, prises, previews, backstage, dépenses, sauvegardes et brief de postproduction.
08	**Action terrain et pièces** 6 novembre	**PAS D'ÉCRAN DÉDIÉ** Attendre le relais de Partenaire local.	Avancement, dépenses et registres de l'action rattachés au même dossier.
09	**Montage, retouche et validations** 9-16 novembre	**CONTRIBUTION** Planning de postproduction / Sélection des images / Version et retouches…	Sélection, V01, retours précis, V02 et décision sur la bonne révision.
10	**Livraison et archivage** 20 novembre	**CONTRIBUTION** Livraison des masters / Droits et extensions / Archives et enseignements	12 photos, 6 exports vidéo, manifeste de fichiers, droits et dossier d'archive.
11	**Mesure et revue indépendante** 6-10 décembre	**PAS D'ÉCRAN DÉDIÉ** Attendre le relais de Partenaire local, Bee et expert attribué.	Dans l'exercice : 54 pots vivants sur 60, soit 90 % à J+30 ; cohorte et méthode explicites.
12	**Honey : bilan et prochaine production** Après réconciliation	**CONTRIBUTION** Bilan de production / Bilan social de production / Bilan environnemental de production…	Création, dépenses, activité de production, résultats admis et enseignements réunis.

00 / ACCÈS ET ESPACE PERSONNEL • AVANT LE BRIEF

Tous mes projets

Consulter et orienter

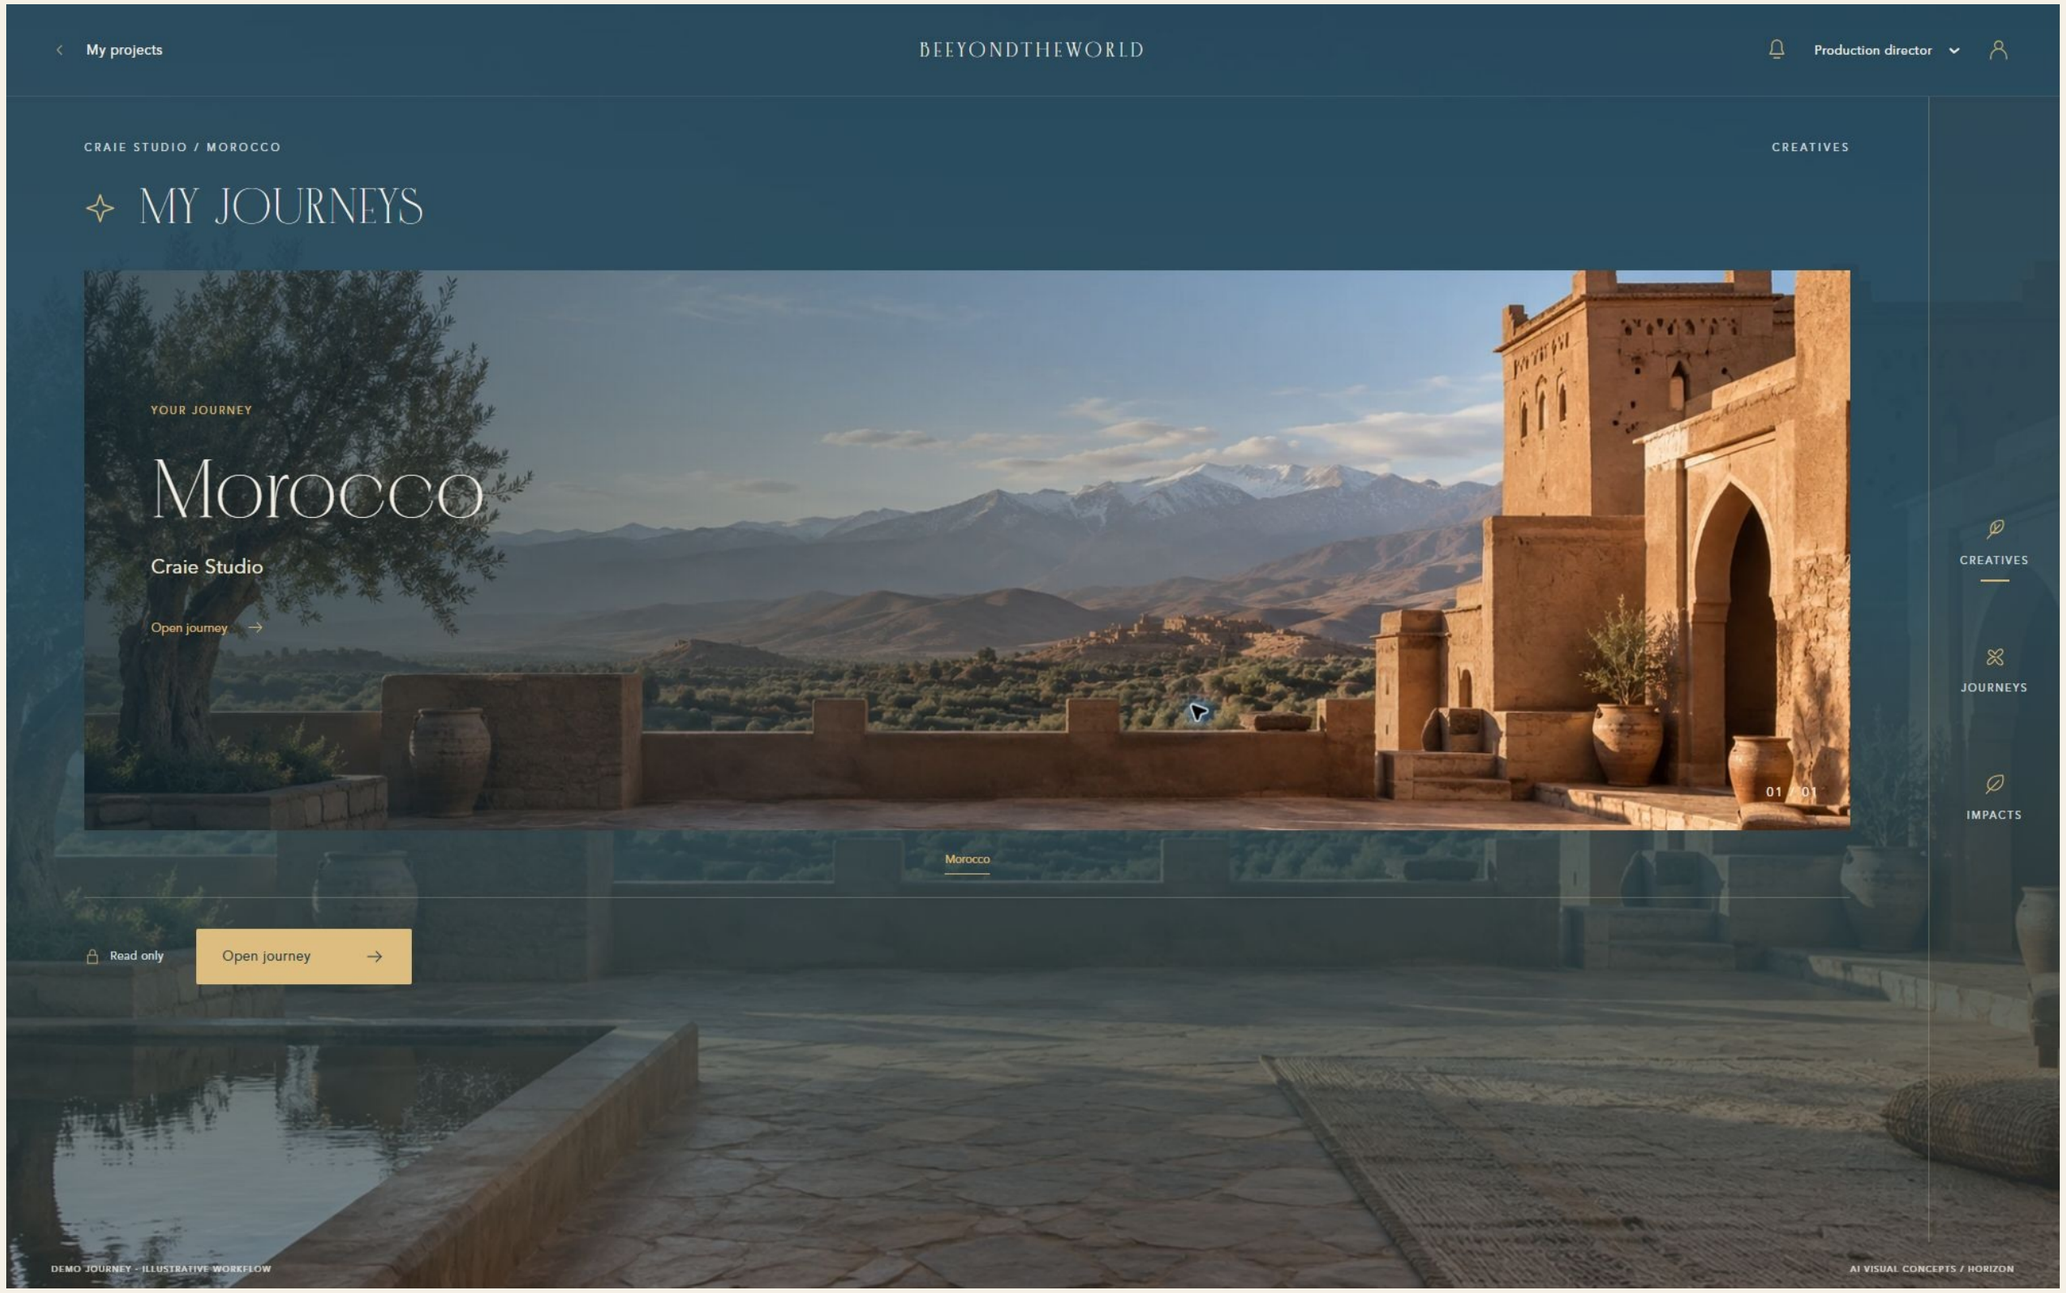

À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Ouvrir la production Craie Morocco depuis le portefeuille du métier. En usage réel, ce même écran regroupe tous ses projets attribués.

CE QUI PASSE À LA SUITE

Le rôle détermine les écrans et les actions disponibles. Bee attribue les accès.

00 / ACCÈS ET ESPACE PERSONNEL • AVANT LE BRIEF

Vue du projet

Consulter et orienter

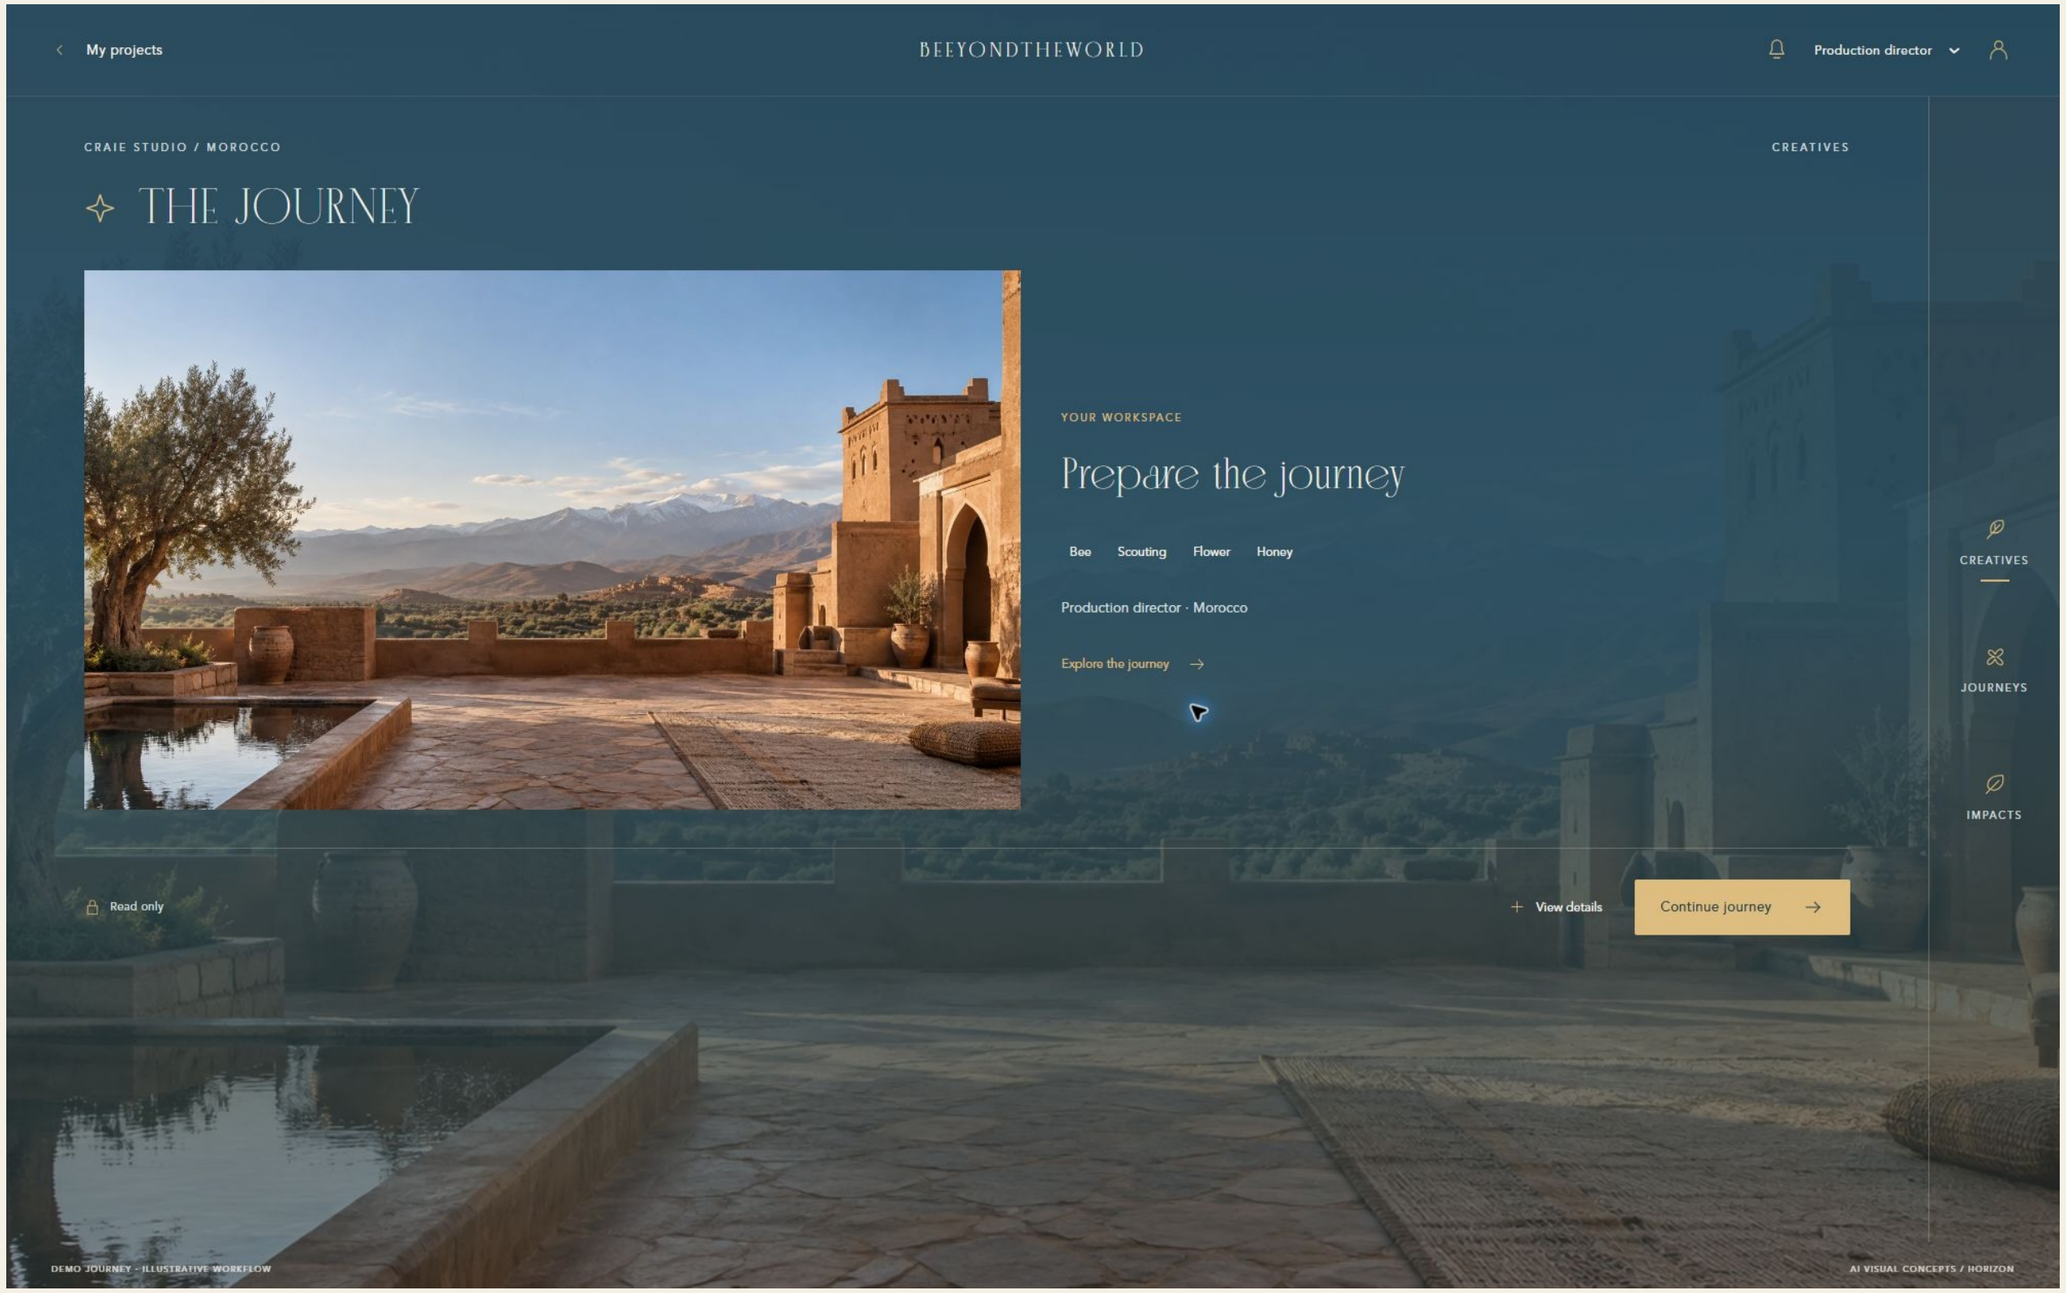

À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Préparer les informations et références affichées, vérifier leur cohérence avec le brief puis transmettre au responsable de l'étape.

CE QUI PASSE À LA SUITE

Le rôle détermine les écrans et les actions disponibles. Bee attribue les accès.

00 / ACCÈS ET ESPACE PERSONNEL • AVANT LE BRIEF

À traiter

Consulter et orienter

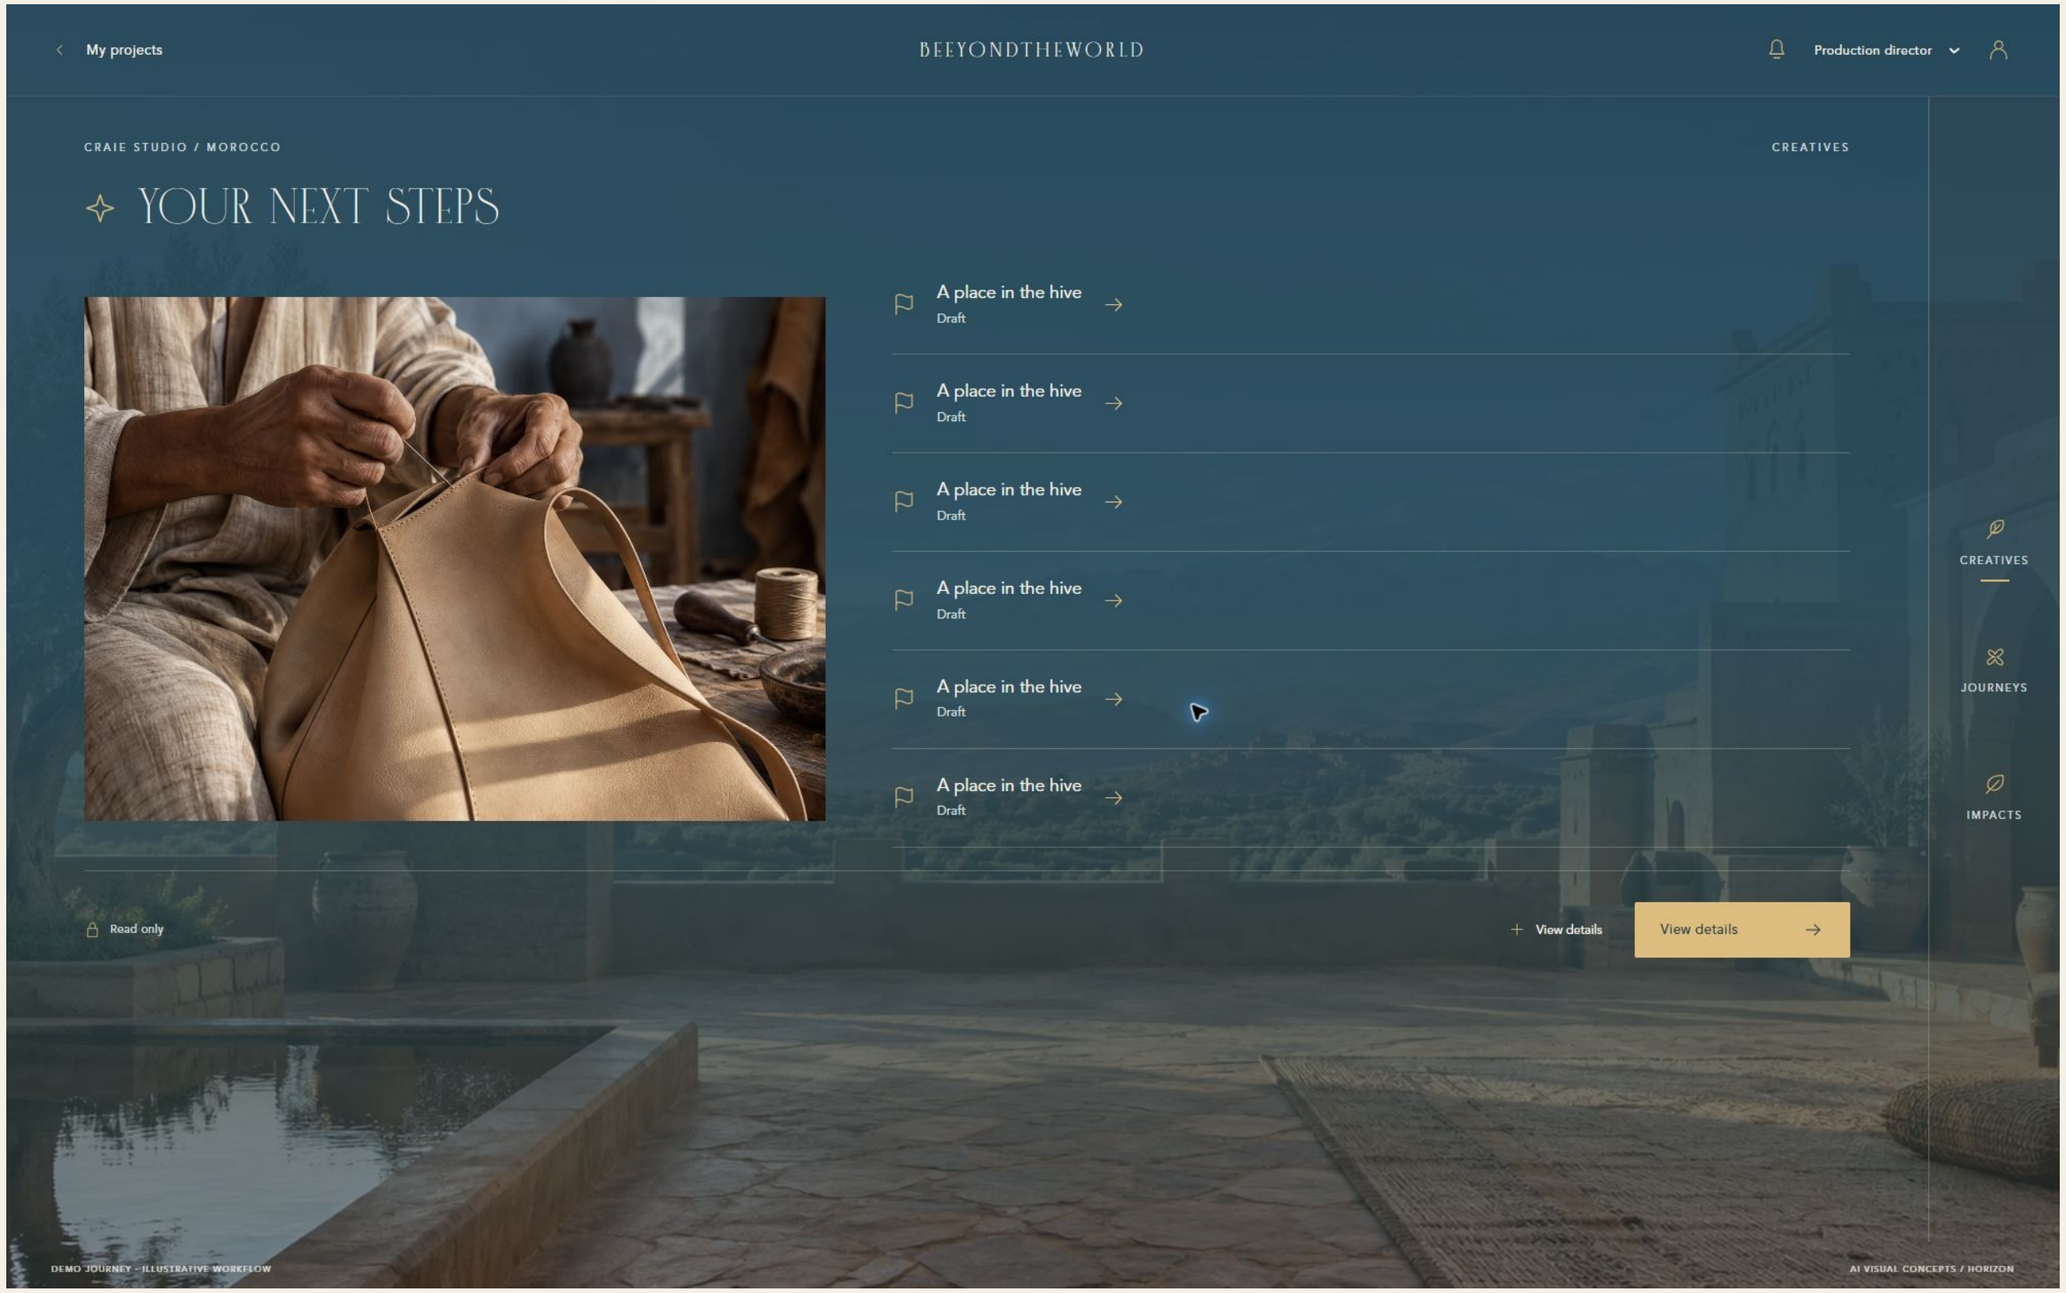

À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Préparer les informations et références affichées, vérifier leur cohérence avec le brief puis transmettre au responsable de l'étape.

CE QUI PASSE À LA SUITE

Le rôle détermine les écrans et les actions disponibles. Bee attribue les accès.

00 / ACCÈS ET ESPACE PERSONNEL • AVANT LE BRIEF

Calendrier commun · 1/2

Consulter et orienter

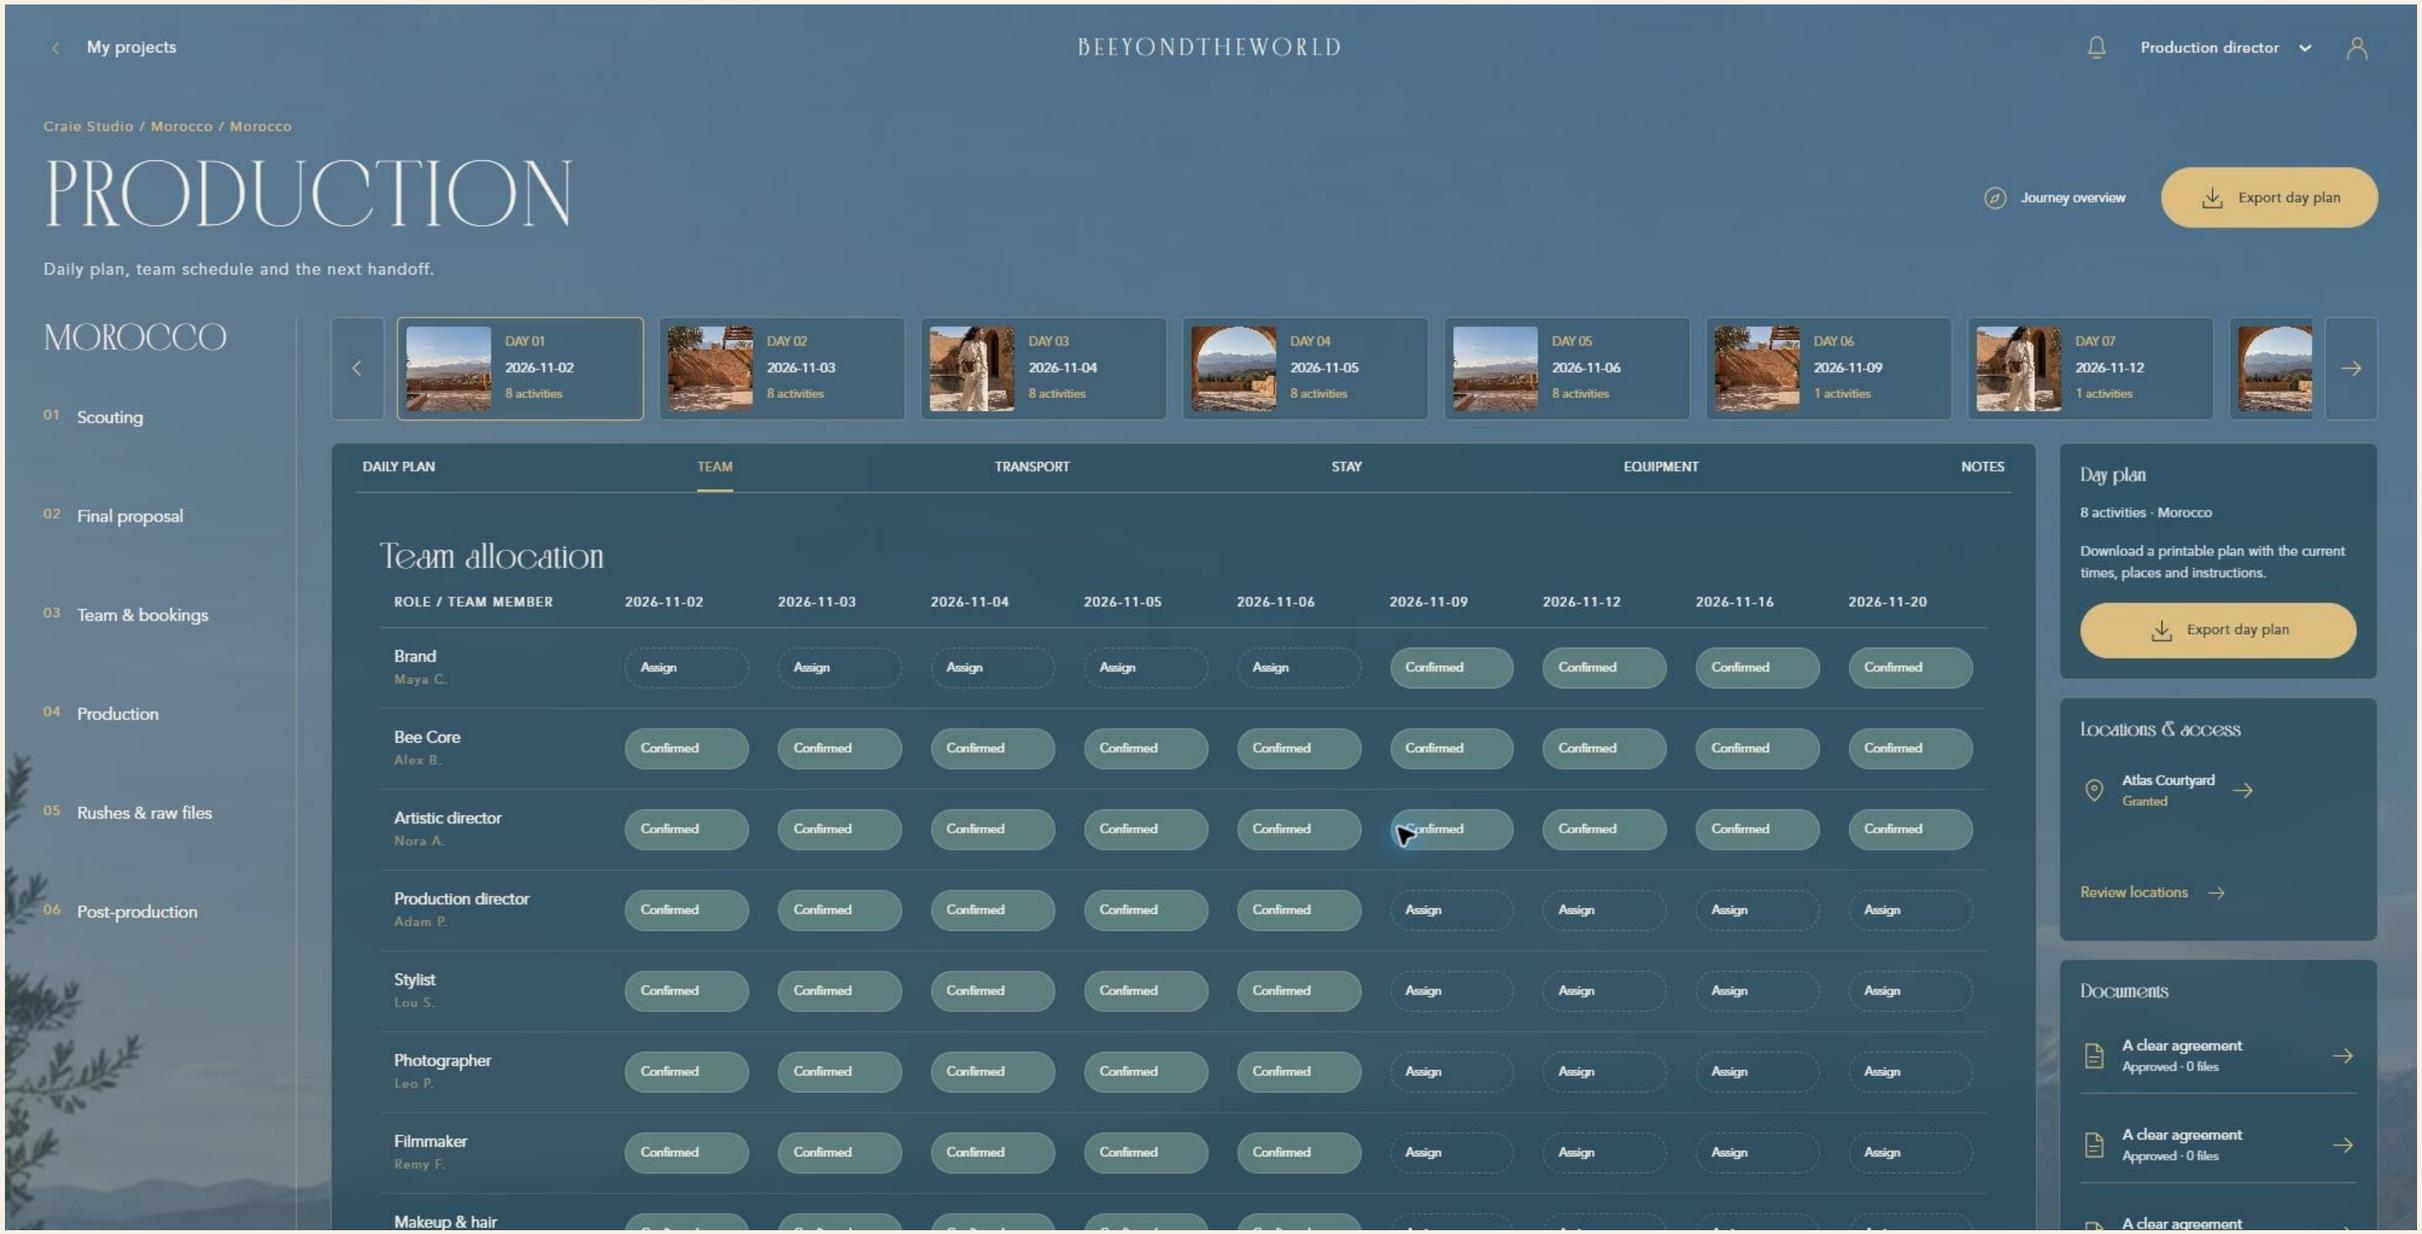

À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Préparer les informations et références affichées, vérifier leur cohérence avec le brief puis transmettre au responsable de l'étape.

CE QUI PASSE À LA SUITE

Le rôle détermine les écrans et les actions disponibles. Bee attribue les accès.

00 / ACCÈS ET ESPACE PERSONNEL • AVANT LE BRIEF

Calendrier commun · 2/2

Consulter et orienter

À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Préparer les informations et références affichées, vérifier leur cohérence avec le brief puis transmettre au responsable de l'étape.

CE QUI PASSE À LA SUITE

Le rôle détermine les écrans et les actions disponibles. Bee attribue les accès.

00 / ACCÈS ET ESPACE PERSONNEL • AVANT LE BRIEF

Accepter une invitation

Préparer / compléter

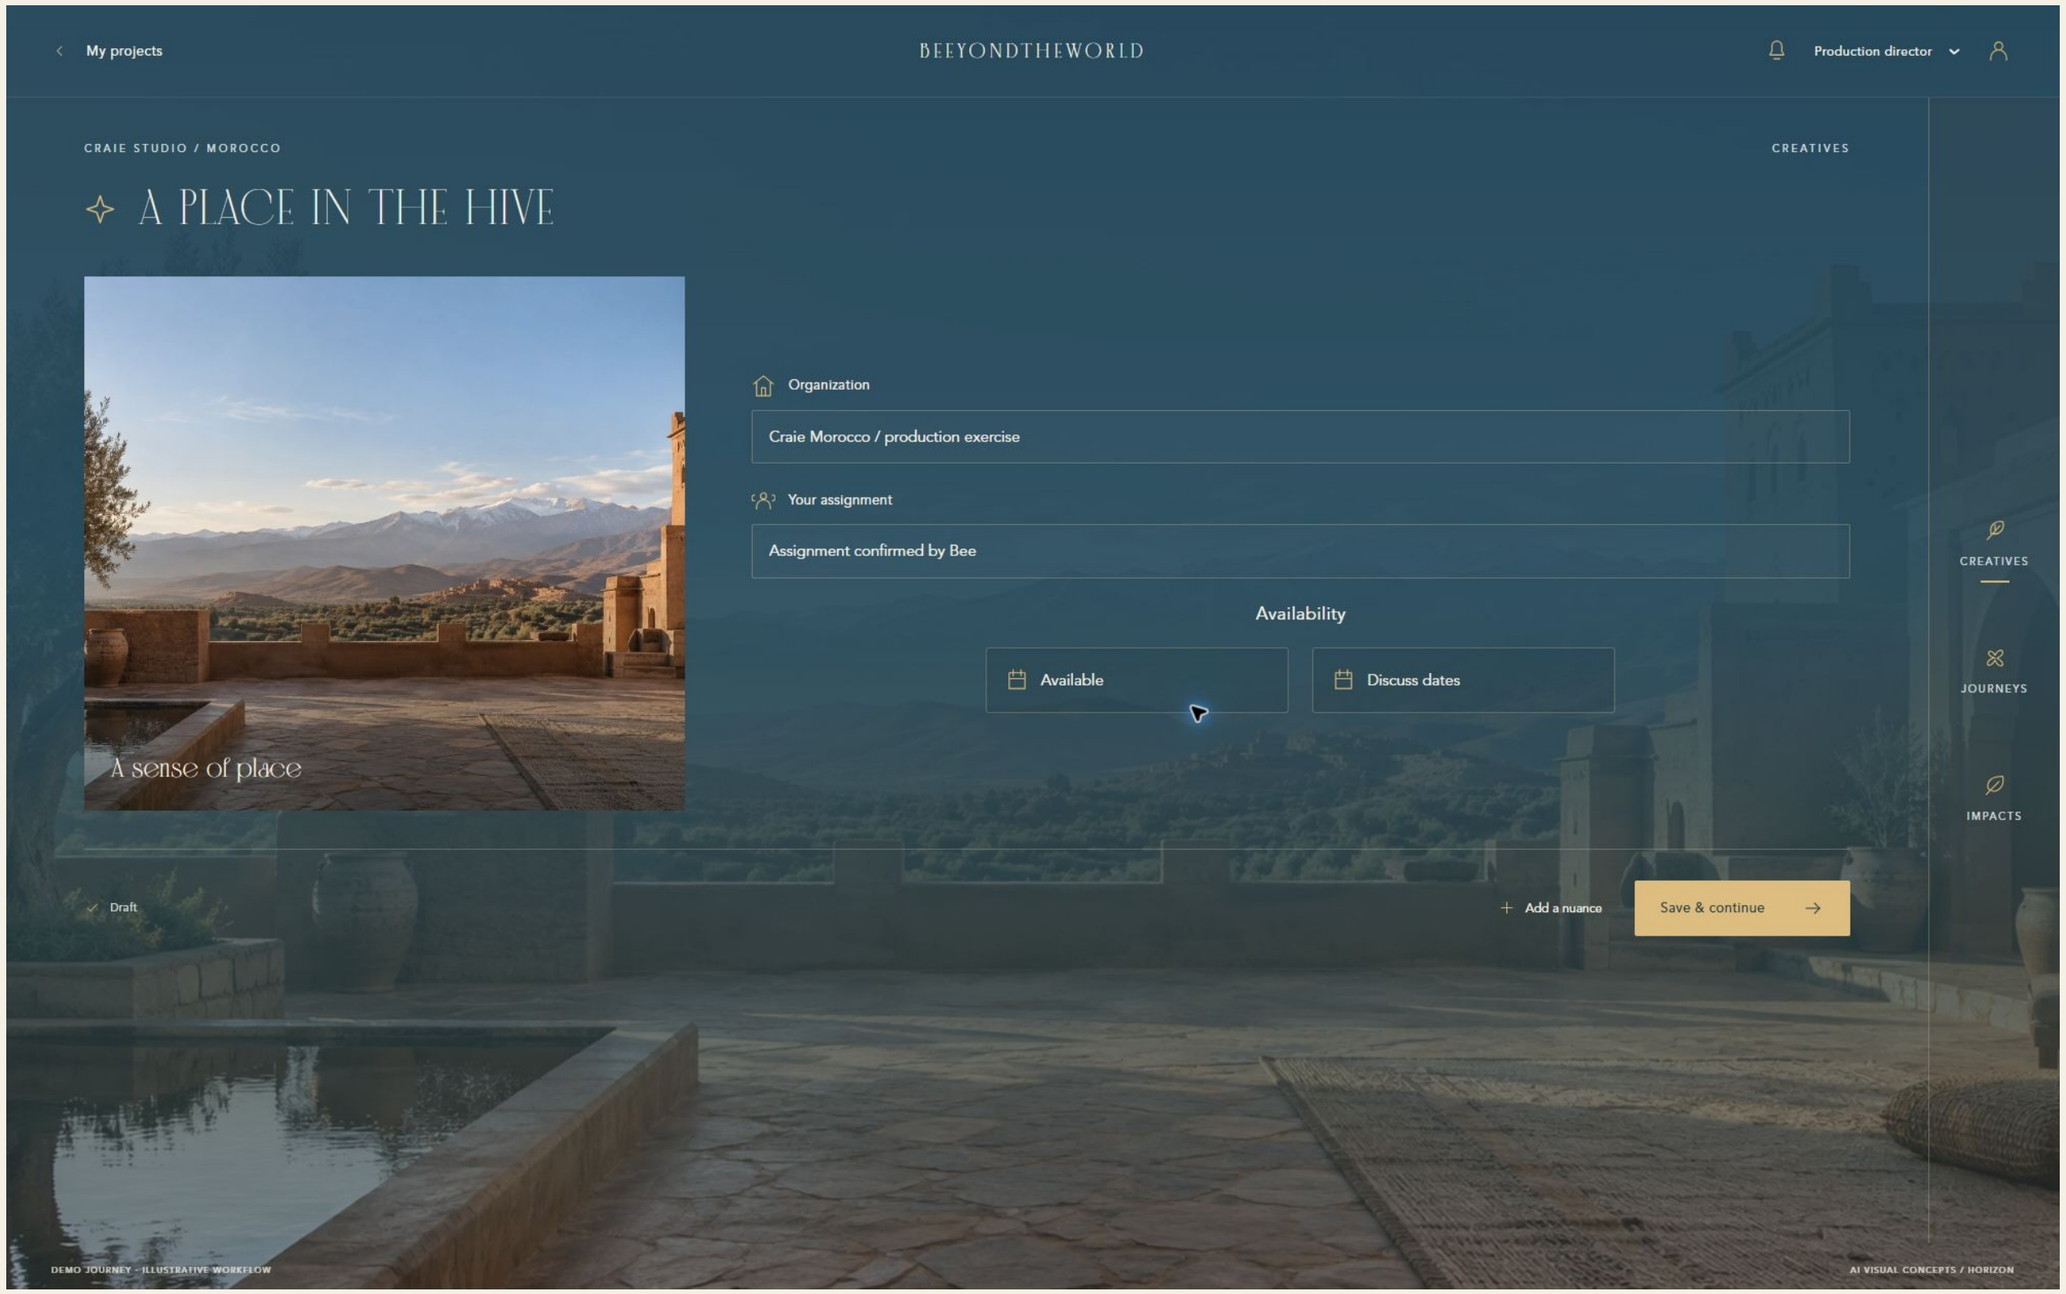

À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Accepter la mission après avoir vérifié son rôle, son organisation et les dates. L’accès à un projet ne donne pas accès à tous les projets de l’organisation.

CE QUI PASSE À LA SUITE

Le rôle détermine les écrans et les actions disponibles. Bee attribue les accès.

00 / ACCÈS ET ESPACE PERSONNEL • AVANT LE BRIEF

Profil professionnel

Préparer / compléter

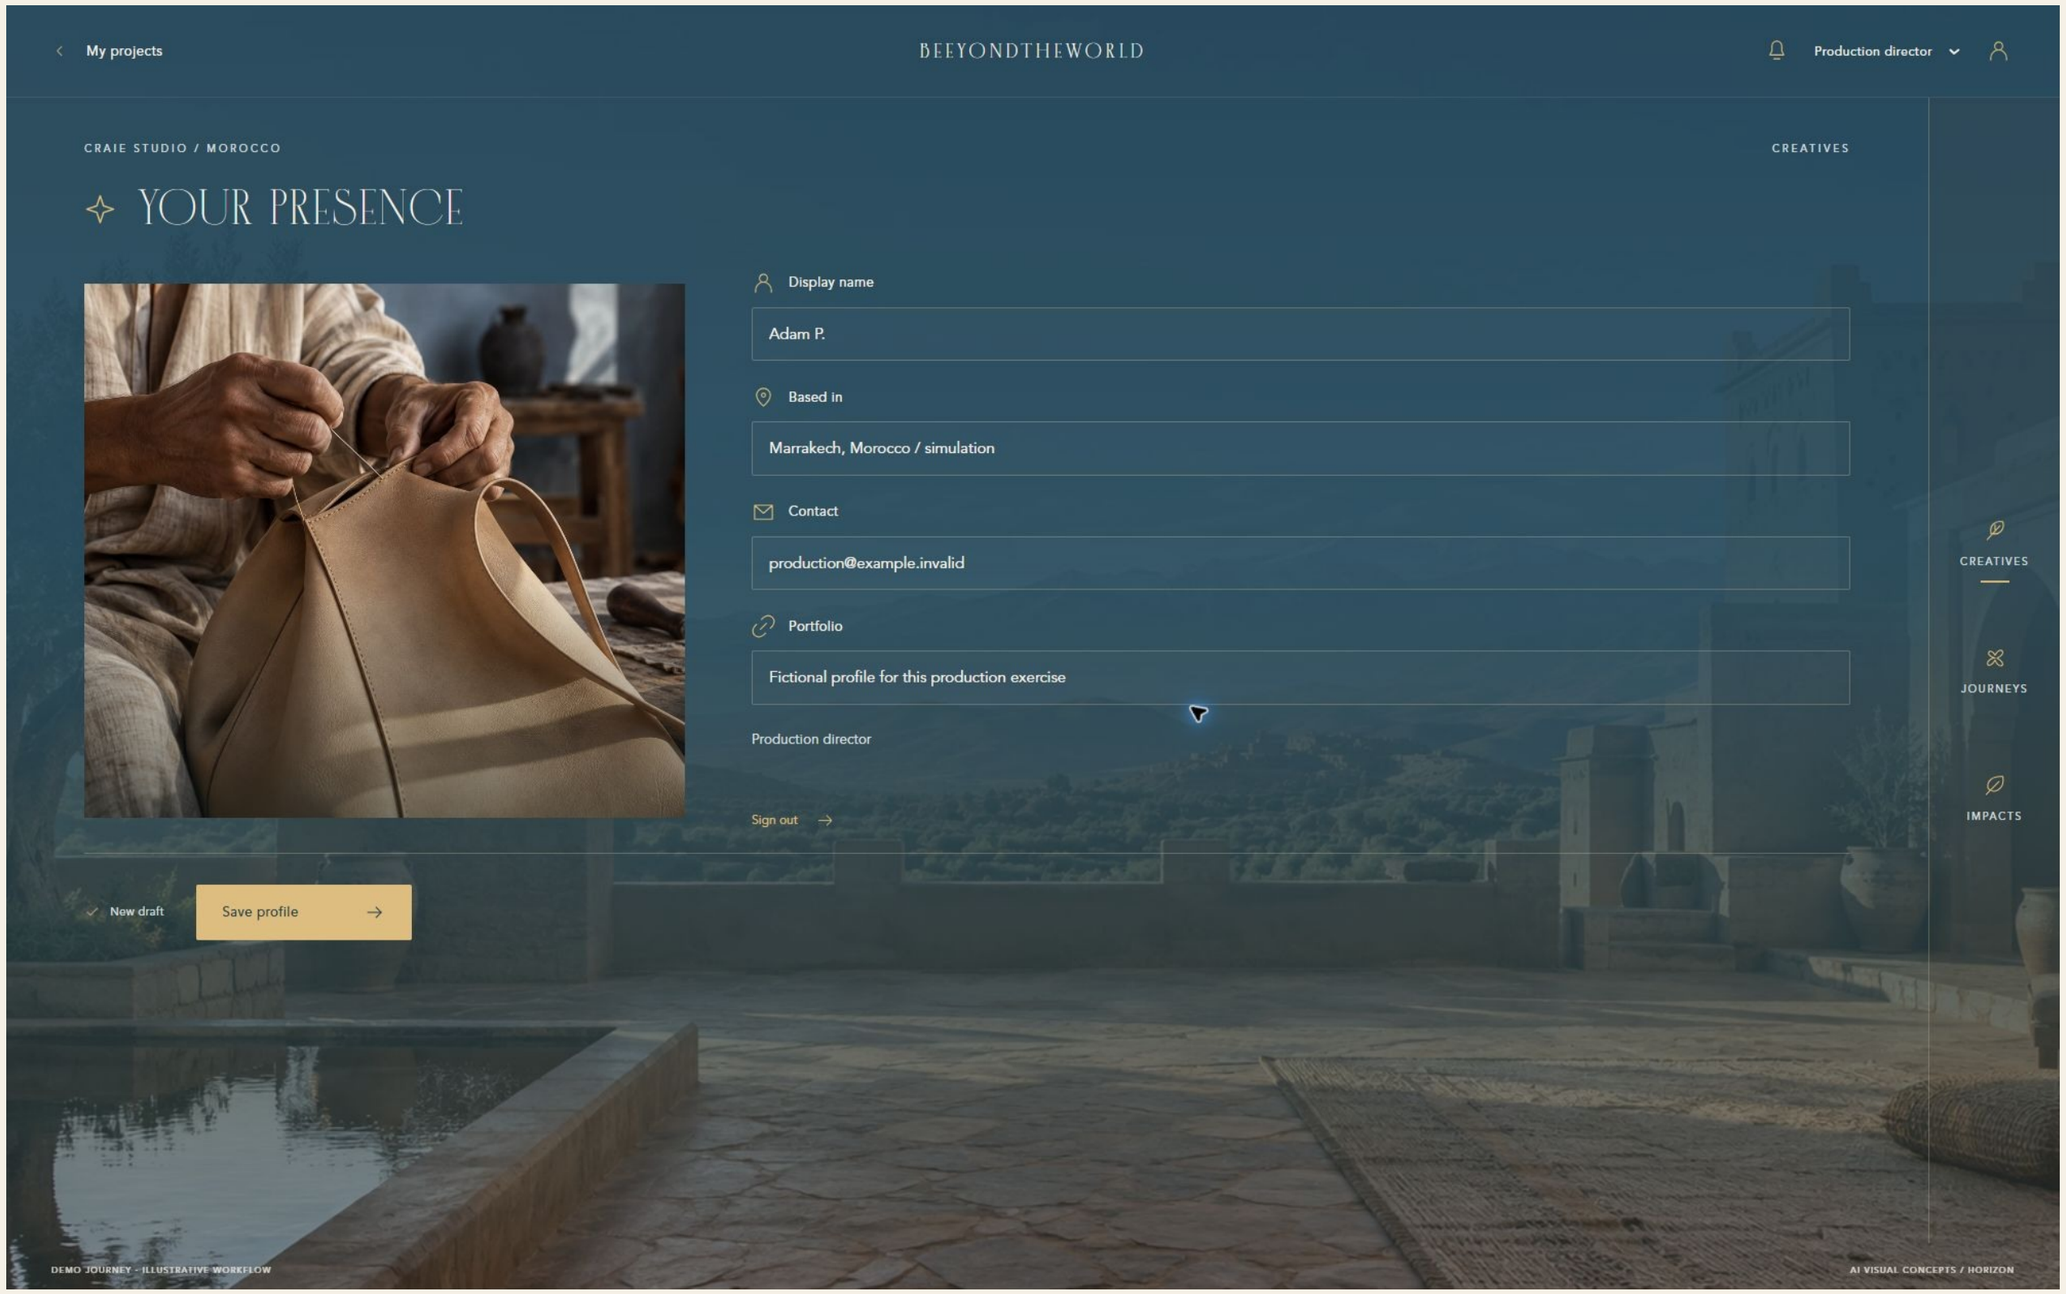

À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Compléter le profil professionnel utile à la mission. Les coordonnées et personnes présentées dans cet exercice sont fictives.

CE QUI PASSE À LA SUITE

Le rôle détermine les écrans et les actions disponibles. Bee attribue les accès.

01 / BRIEF DE LA MARQUE • 19-23 OCTOBRE

Périmètre du brief

Consulter

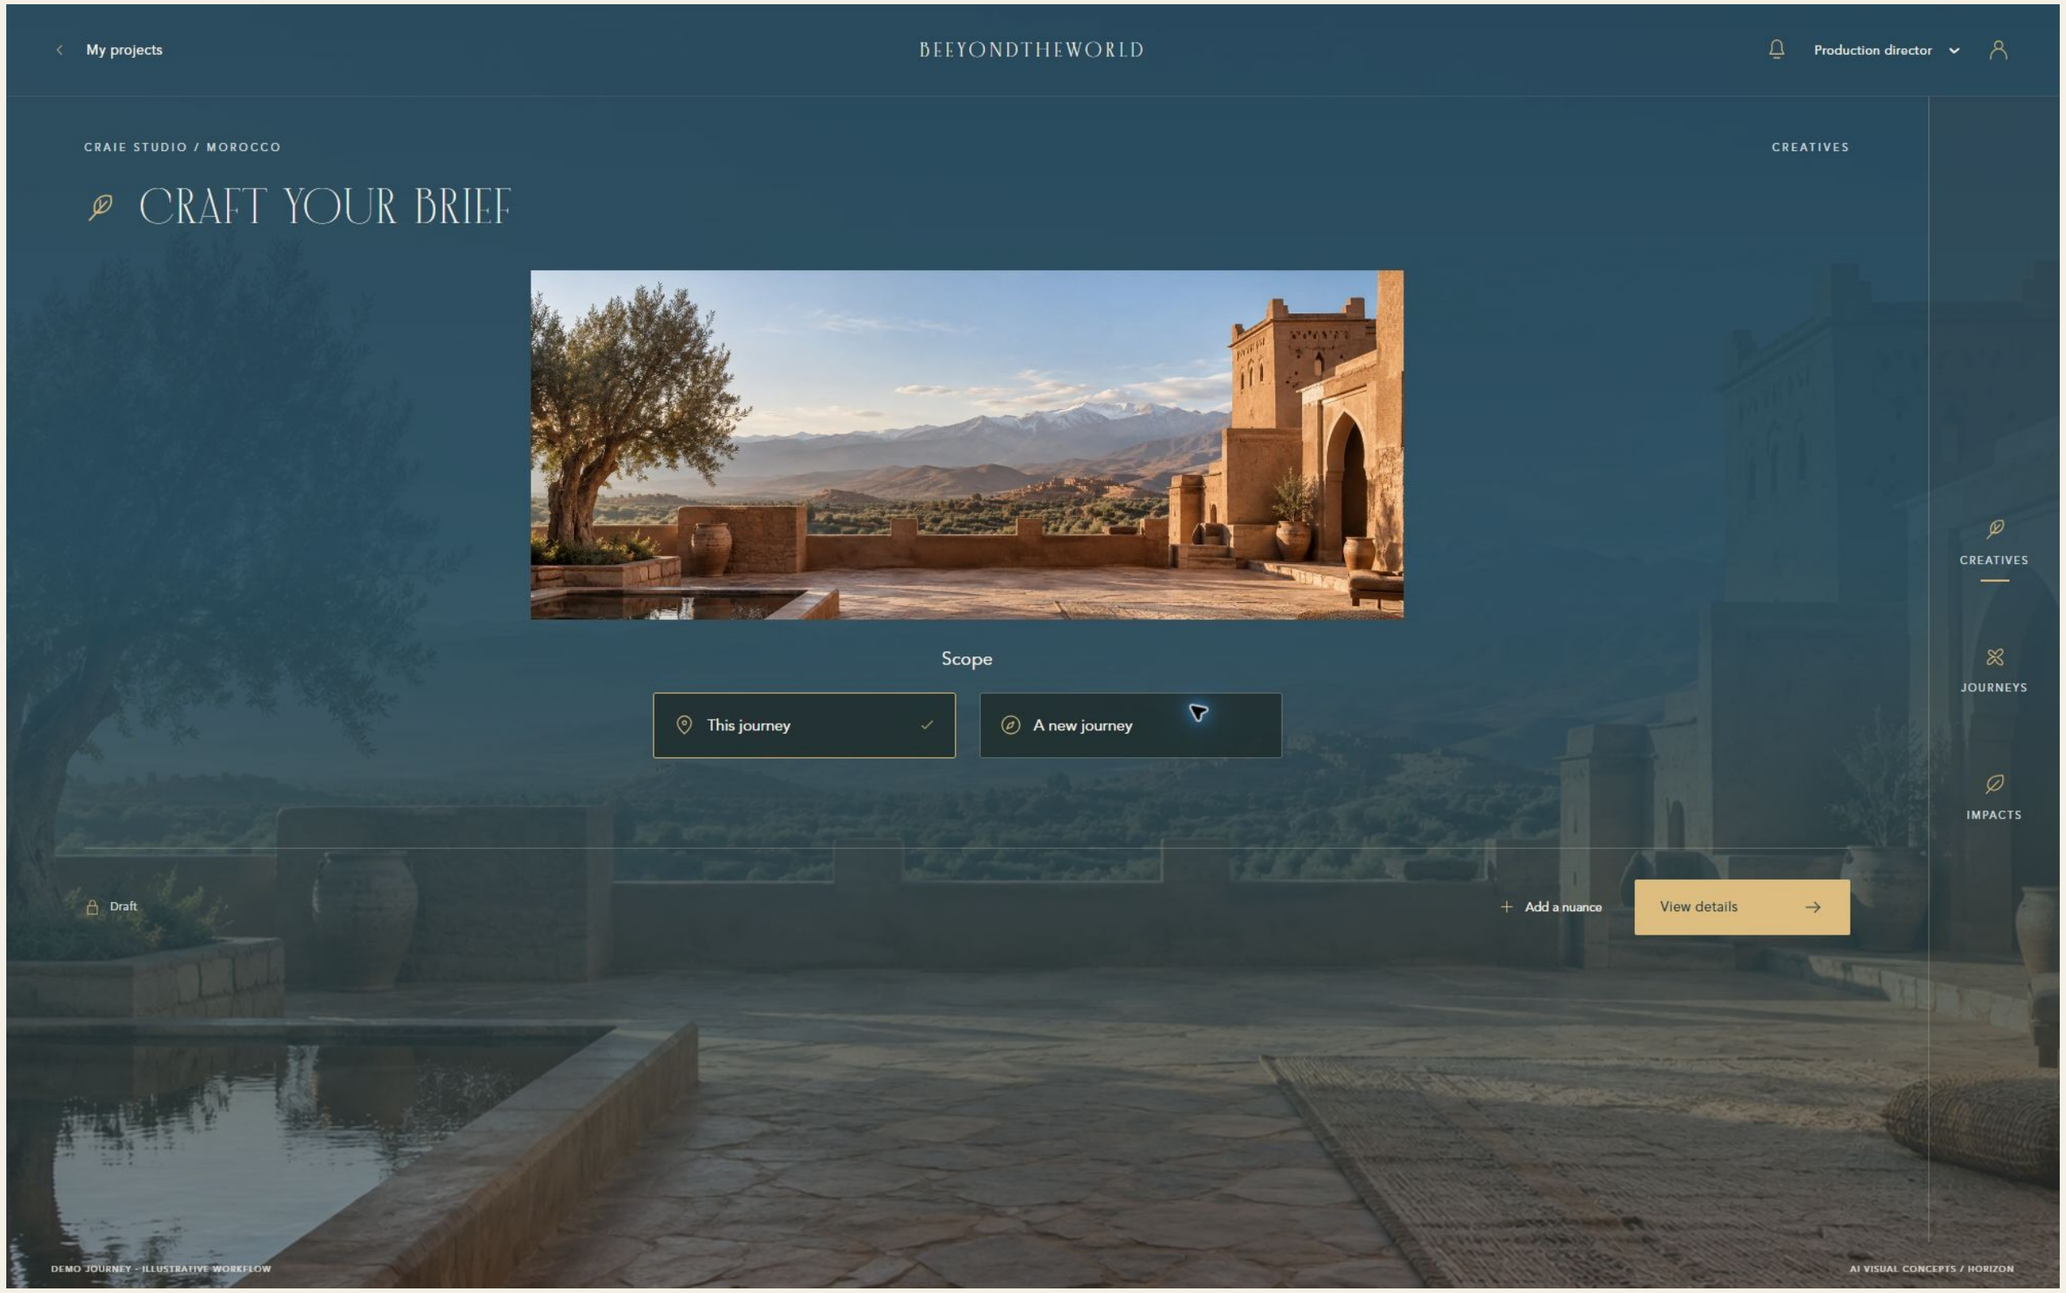

À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Lire cette partie du brief pour préparer sa contribution. Faire remonter une ambiguïté à Bee avant de la traduire en production.

CE QUI PASSE À LA SUITE

Bee vérifie le périmètre avant de lancer la proposition. Marque vers Bee et direction artistique.

01 / BRIEF DE LA MARQUE • 19-23 OCTOBRE

01 · Intention et émotion

Consulter

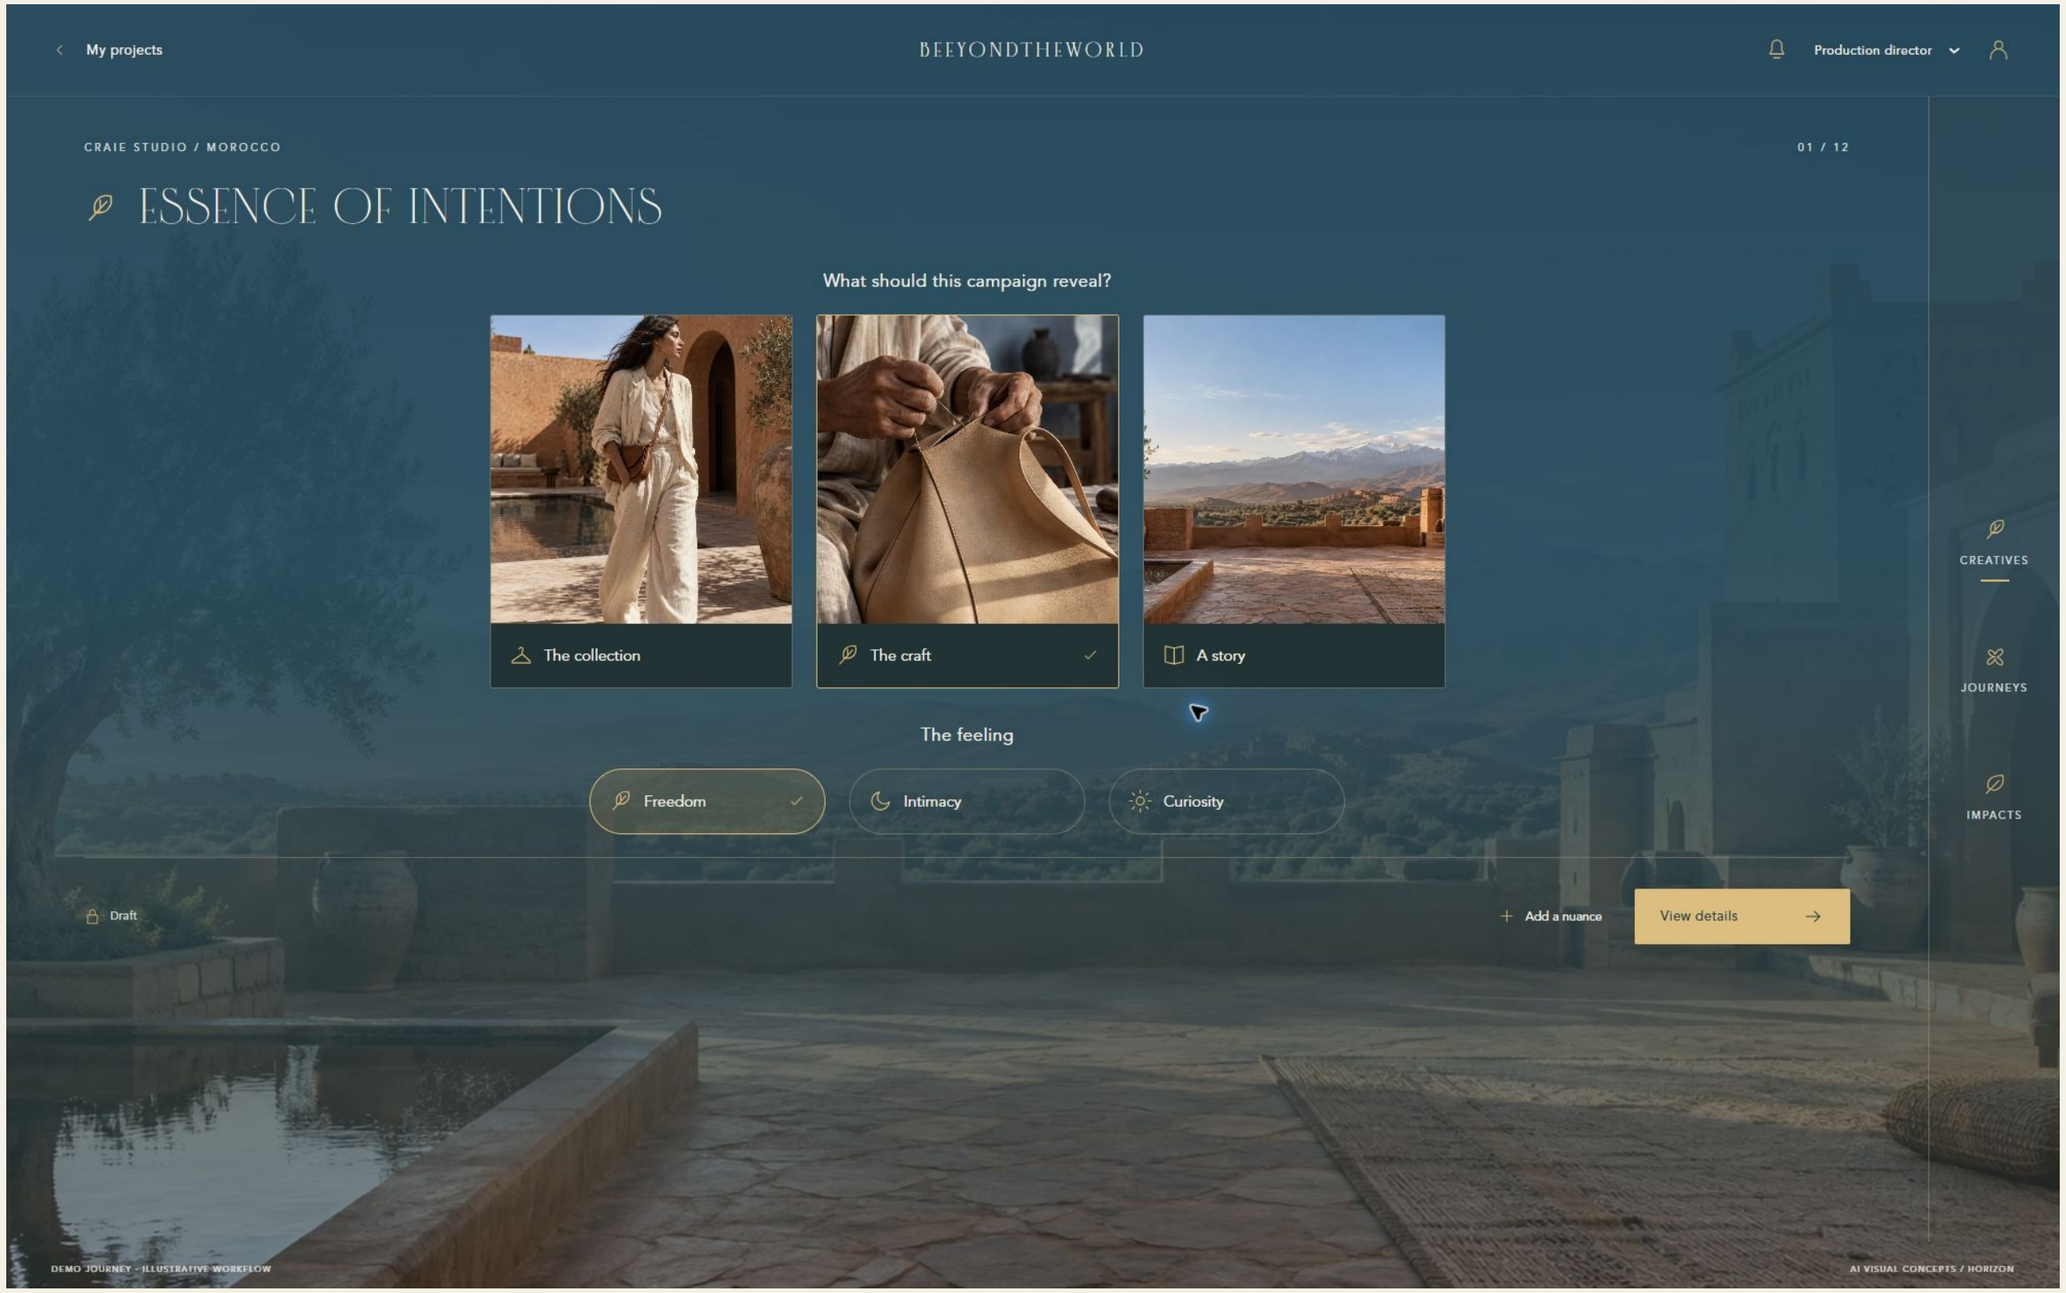

À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Lire cette partie du brief pour préparer sa contribution. Faire remonter une ambiguïté à Bee avant de la traduire en production.

CE QUI PASSE À LA SUITE

Bee vérifie le périmètre avant de lancer la proposition. Marque vers Bee et direction artistique.

01 / BRIEF DE LA MARQUE • 19-23 OCTOBRE

02 · Message et identité

Consulter

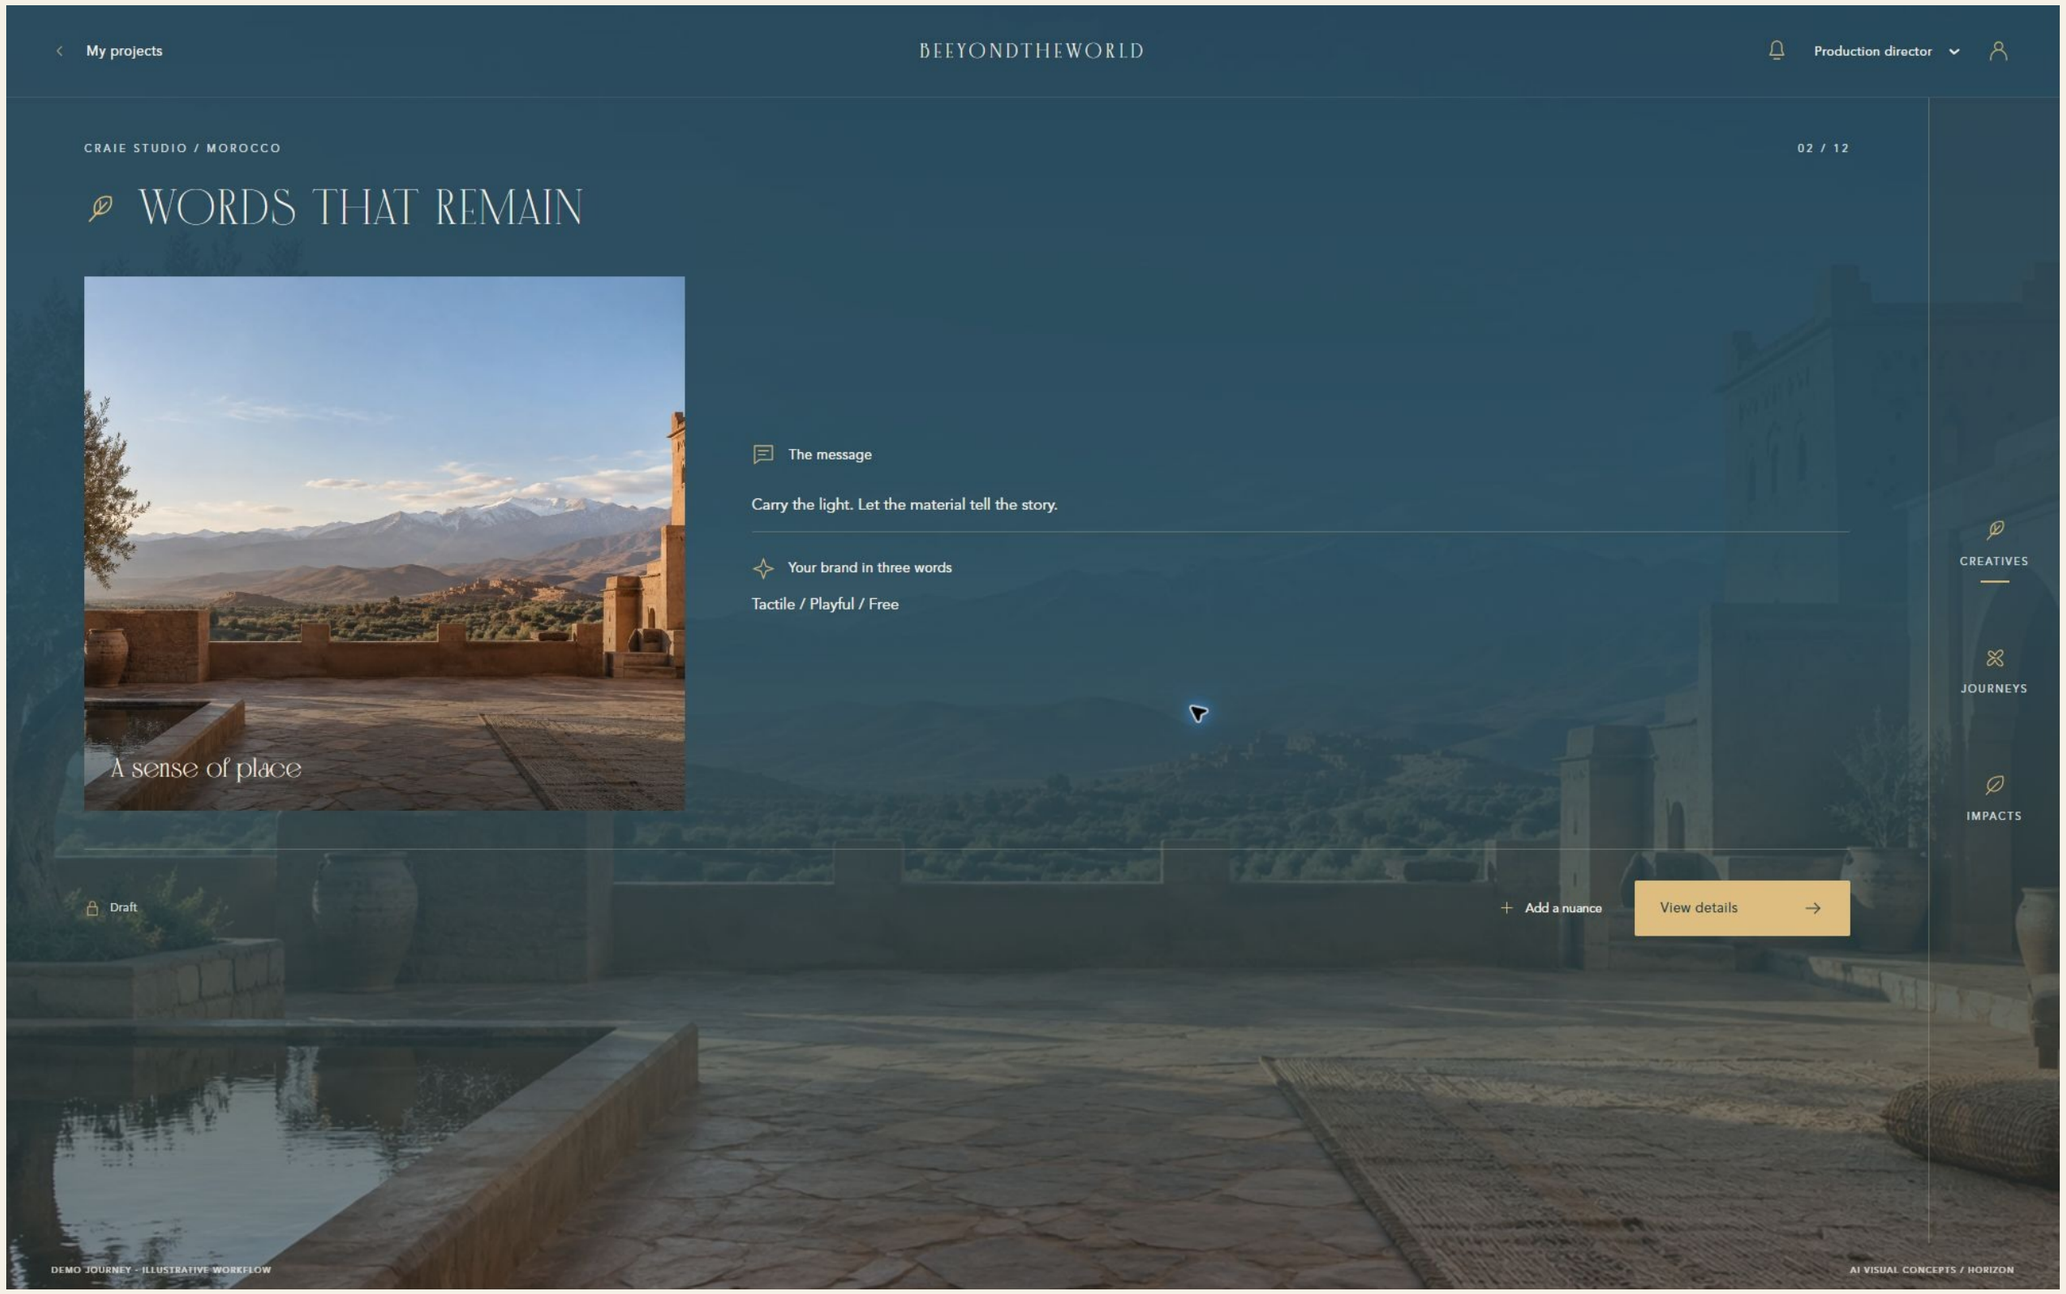

À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Lire cette partie du brief pour préparer sa contribution. Faire remonter une ambiguïté à Bee avant de la traduire en production.

CE QUI PASSE À LA SUITE

Bee vérifie le périmètre avant de lancer la proposition. Marque vers Bee et direction artistique.

01 / BRIEF DE LA MARQUE • 19-23 OCTOBRE

03 · Casting souhaité

Consulter

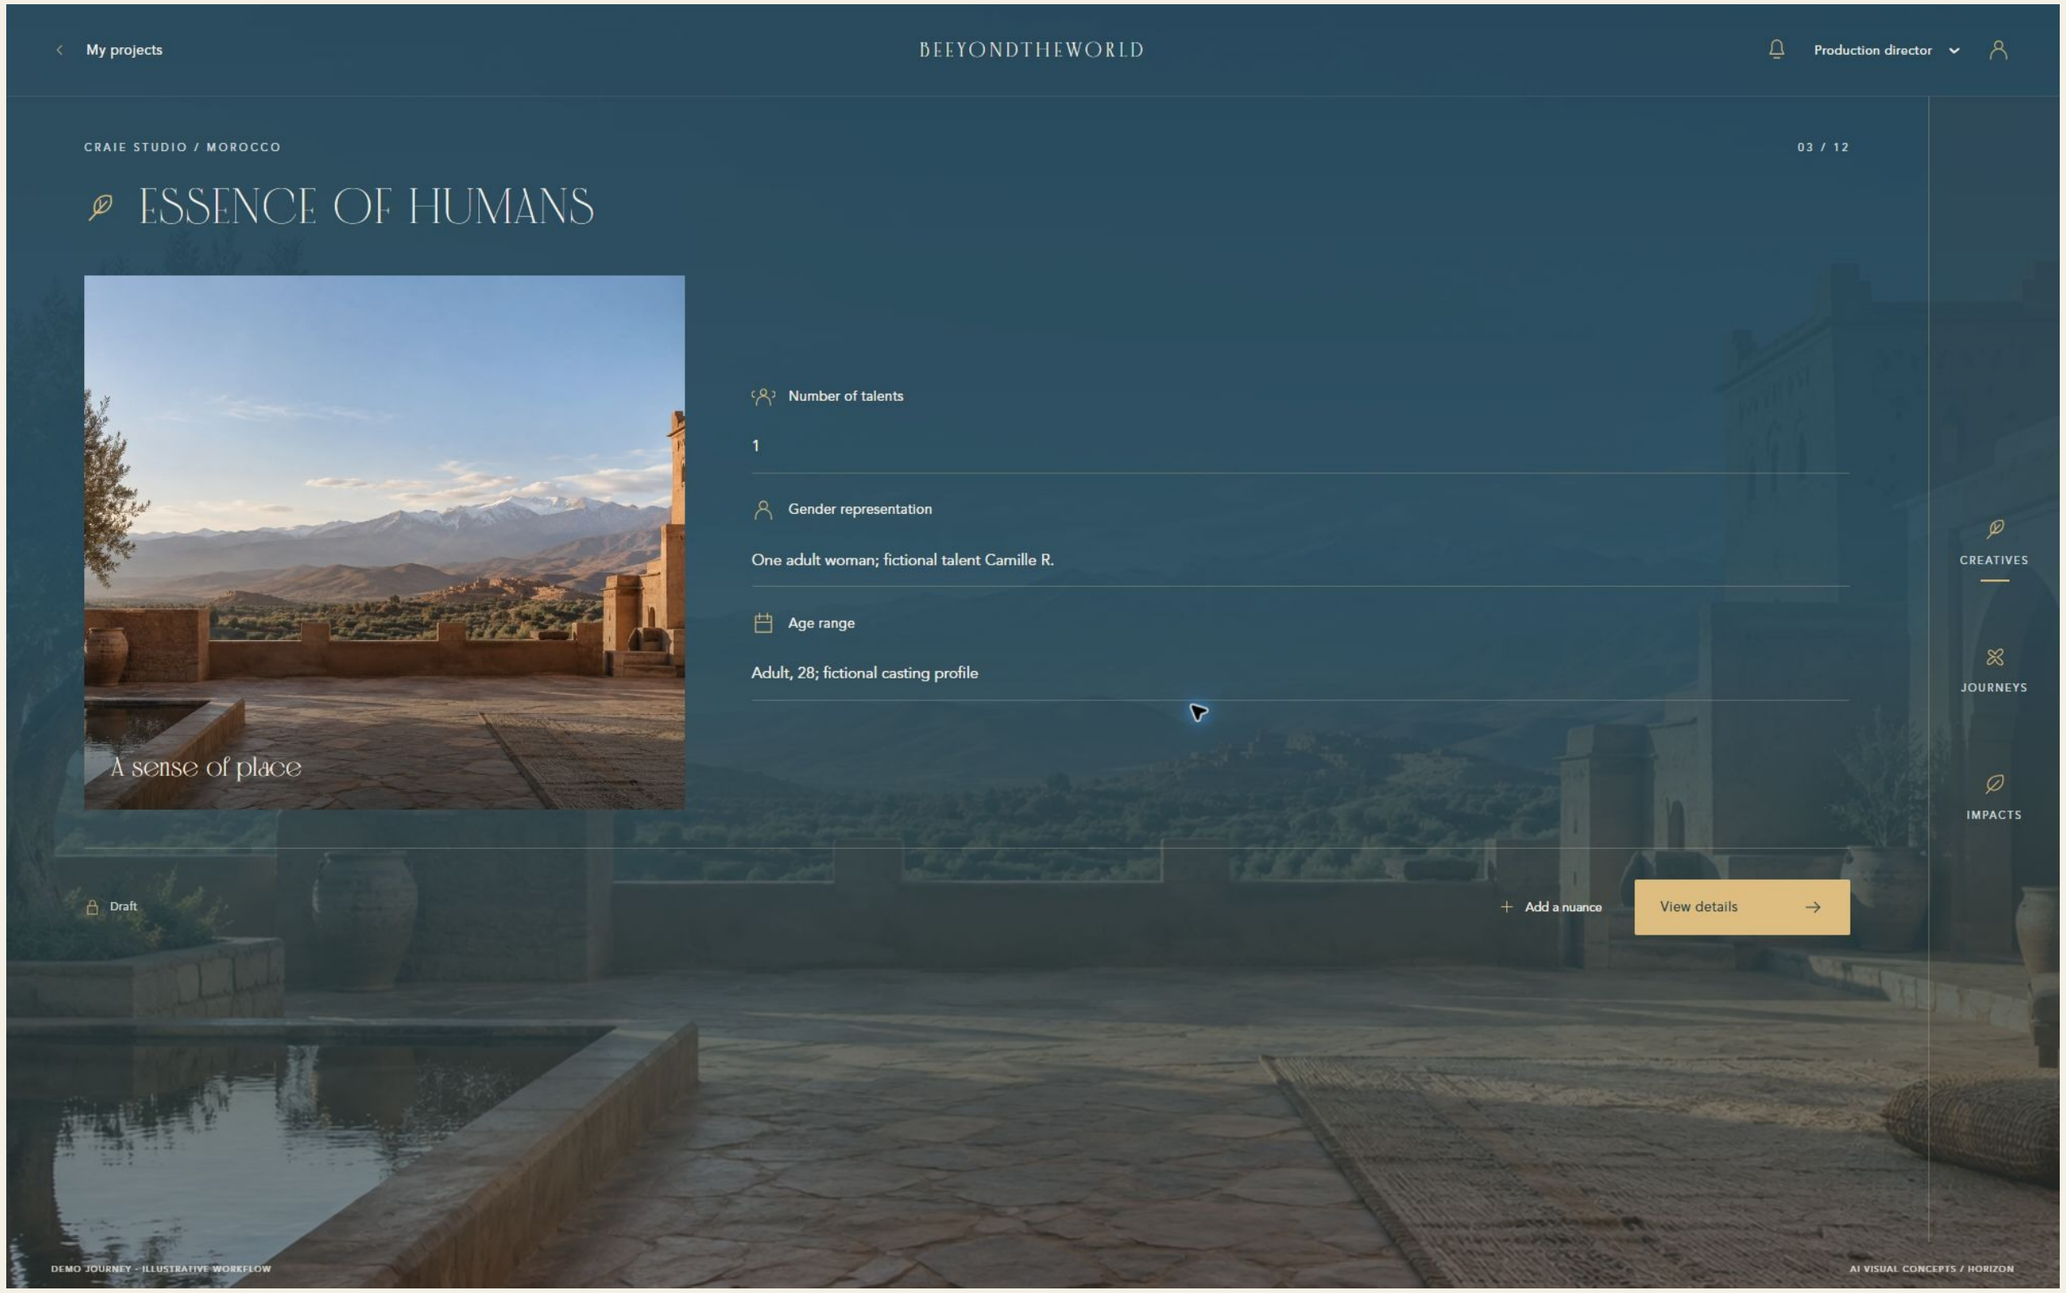

À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Lire cette partie du brief pour préparer sa contribution. Faire remonter une ambiguïté à Bee avant de la traduire en production.

CE QUI PASSE À LA SUITE

Bee vérifie le périmètre avant de lancer la proposition. Marque vers Bee et direction artistique.

01 / BRIEF DE LA MARQUE • 19-23 OCTOBRE

04 · Références de casting

Consulter

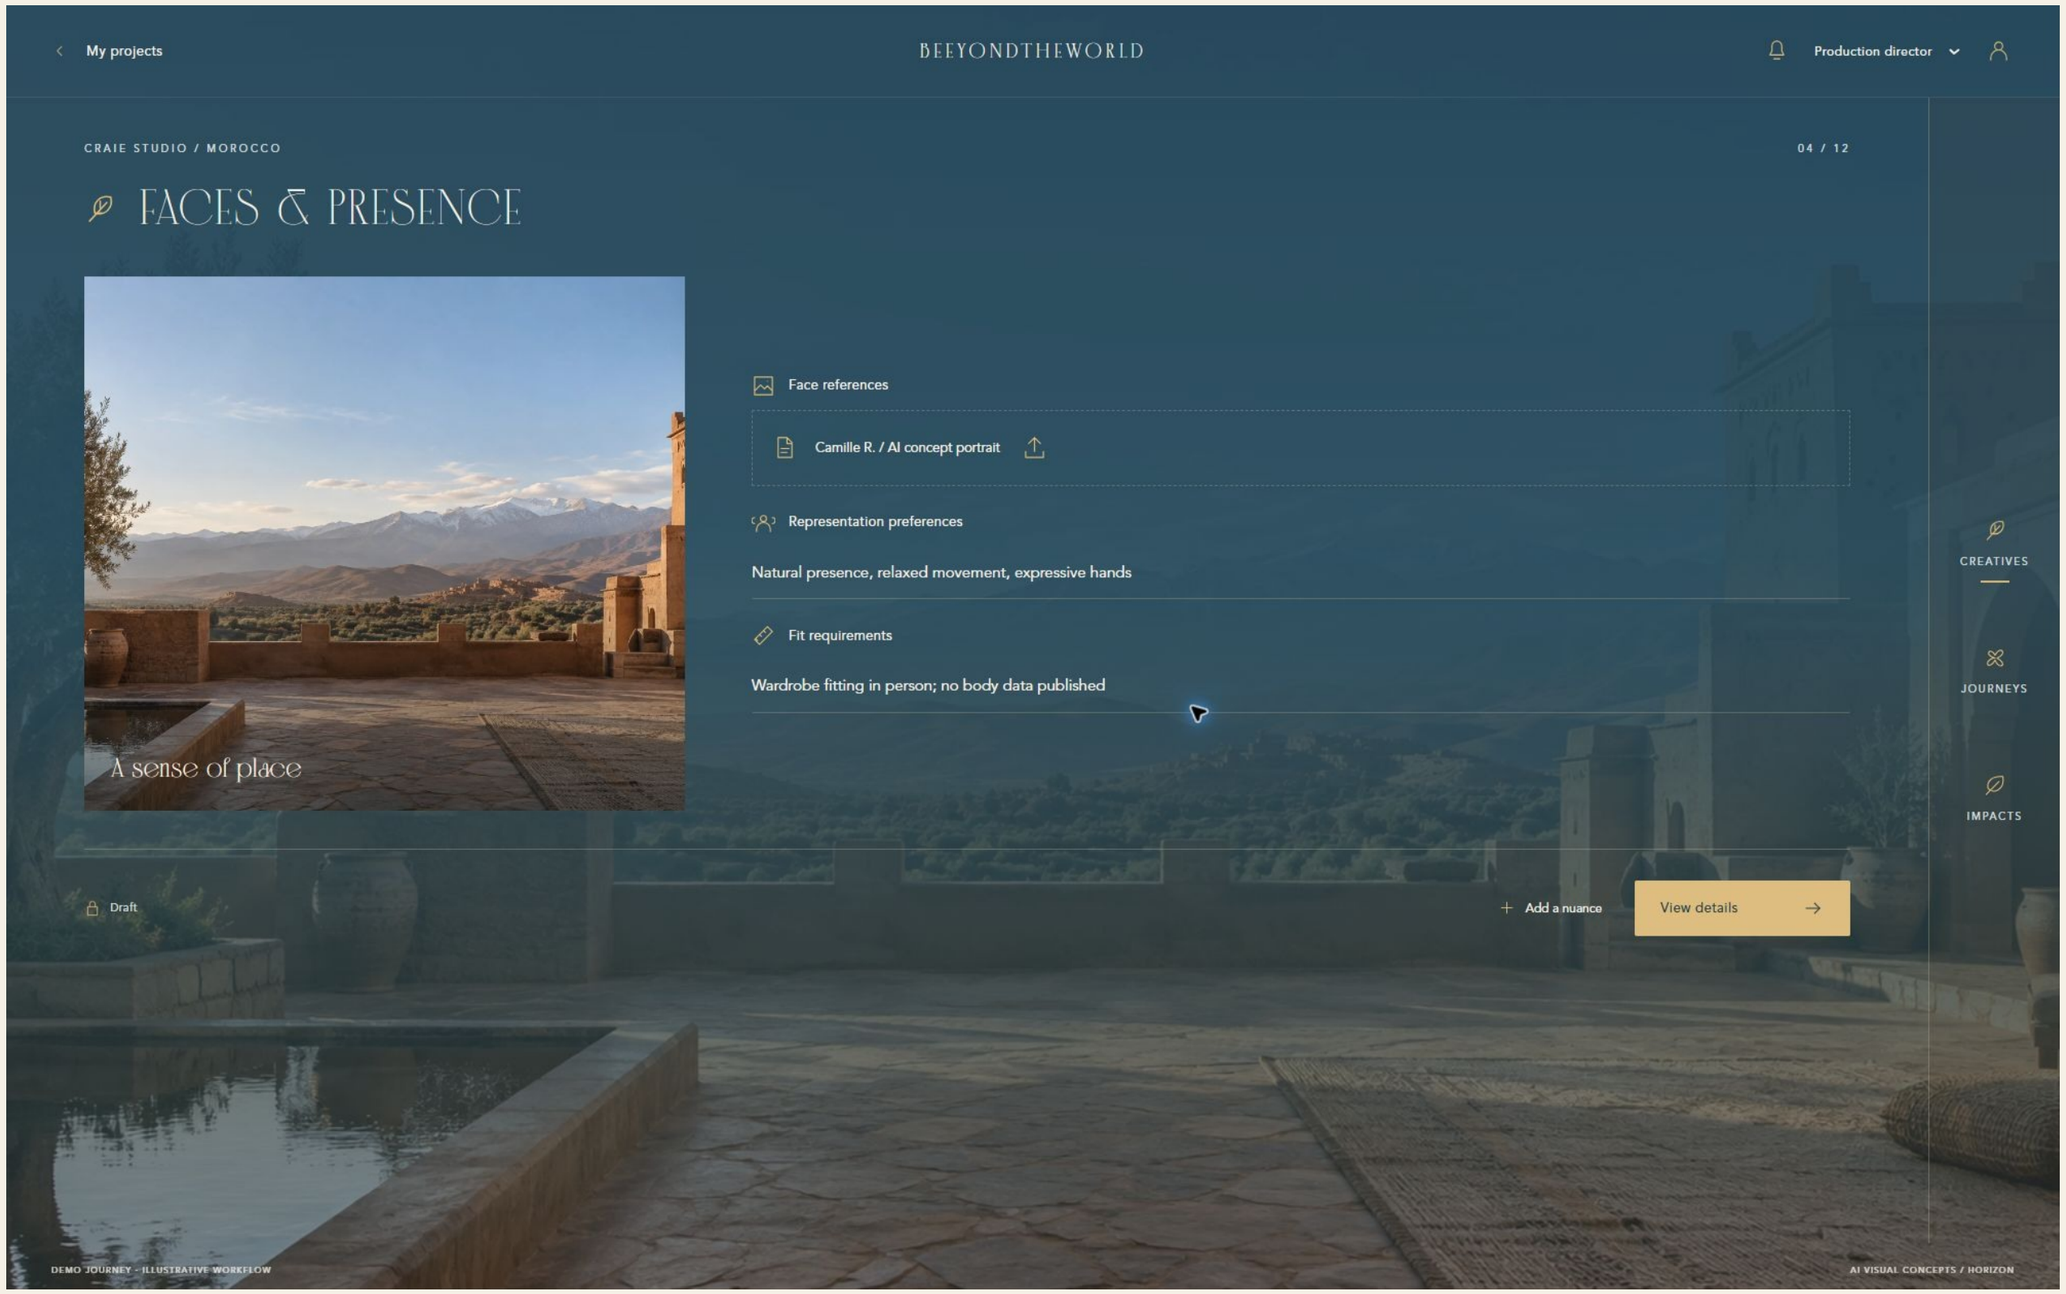

À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Lire cette partie du brief pour préparer sa contribution. Faire remonter une ambiguïté à Bee avant de la traduire en production.

CE QUI PASSE À LA SUITE

Bee vérifie le périmètre avant de lancer la proposition. Marque vers Bee et direction artistique.

01 / BRIEF DE LA MARQUE • 19-23 OCTOBRE

05 · Références visuelles

Consulter

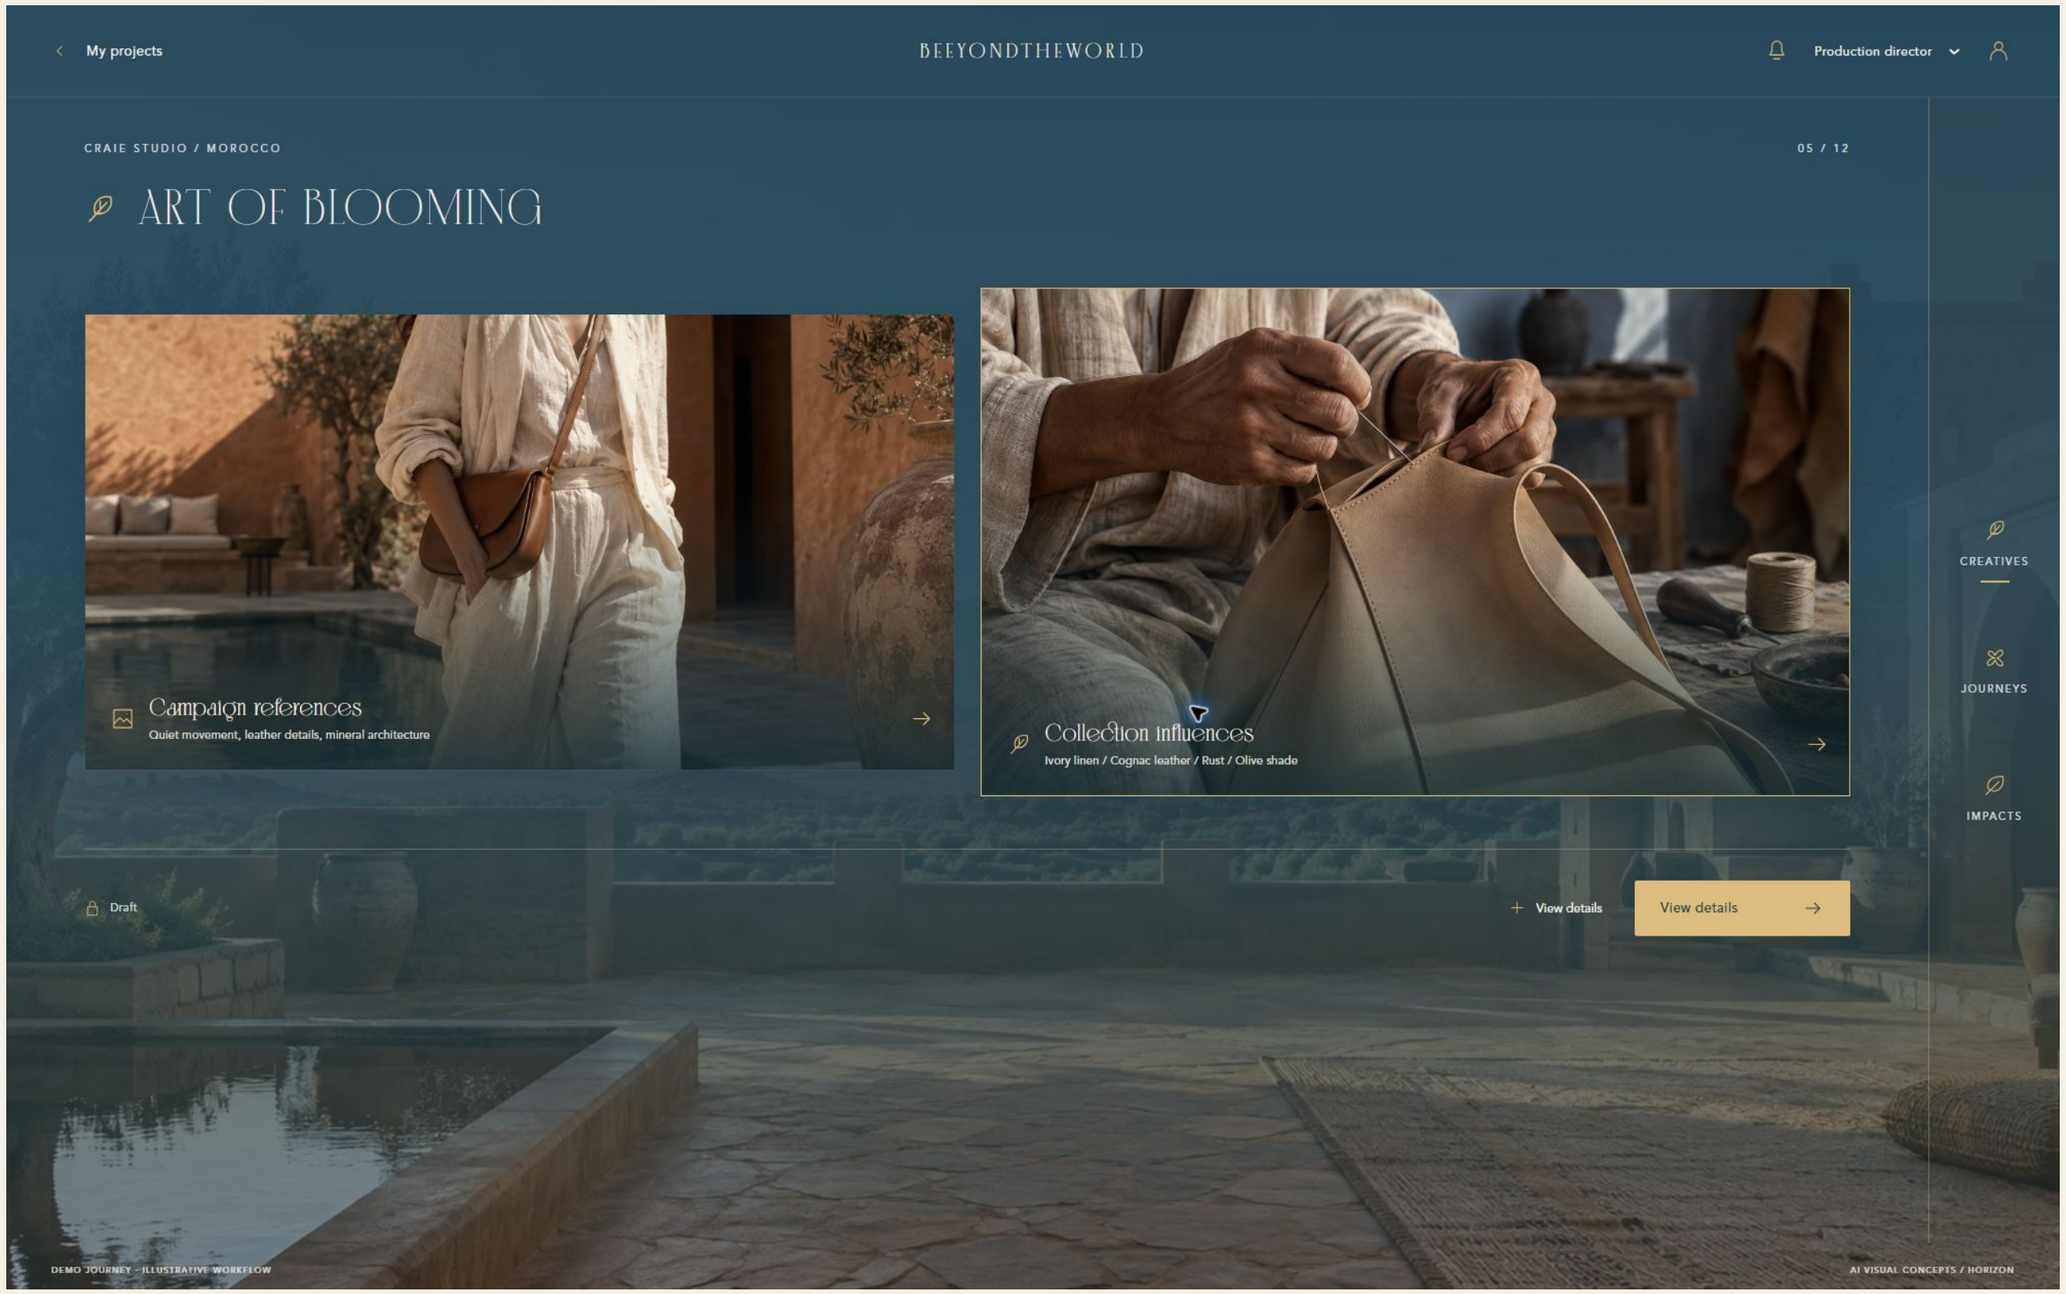

À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Lire cette partie du brief pour préparer sa contribution. Faire remonter une ambiguïté à Bee avant de la traduire en production.

CE QUI PASSE À LA SUITE

Bee vérifie le périmètre avant de lancer la proposition. Marque vers Bee et direction artistique.

01 / BRIEF DE LA MARQUE • 19-23 OCTOBRE

06 · Produits et looks

Consulter

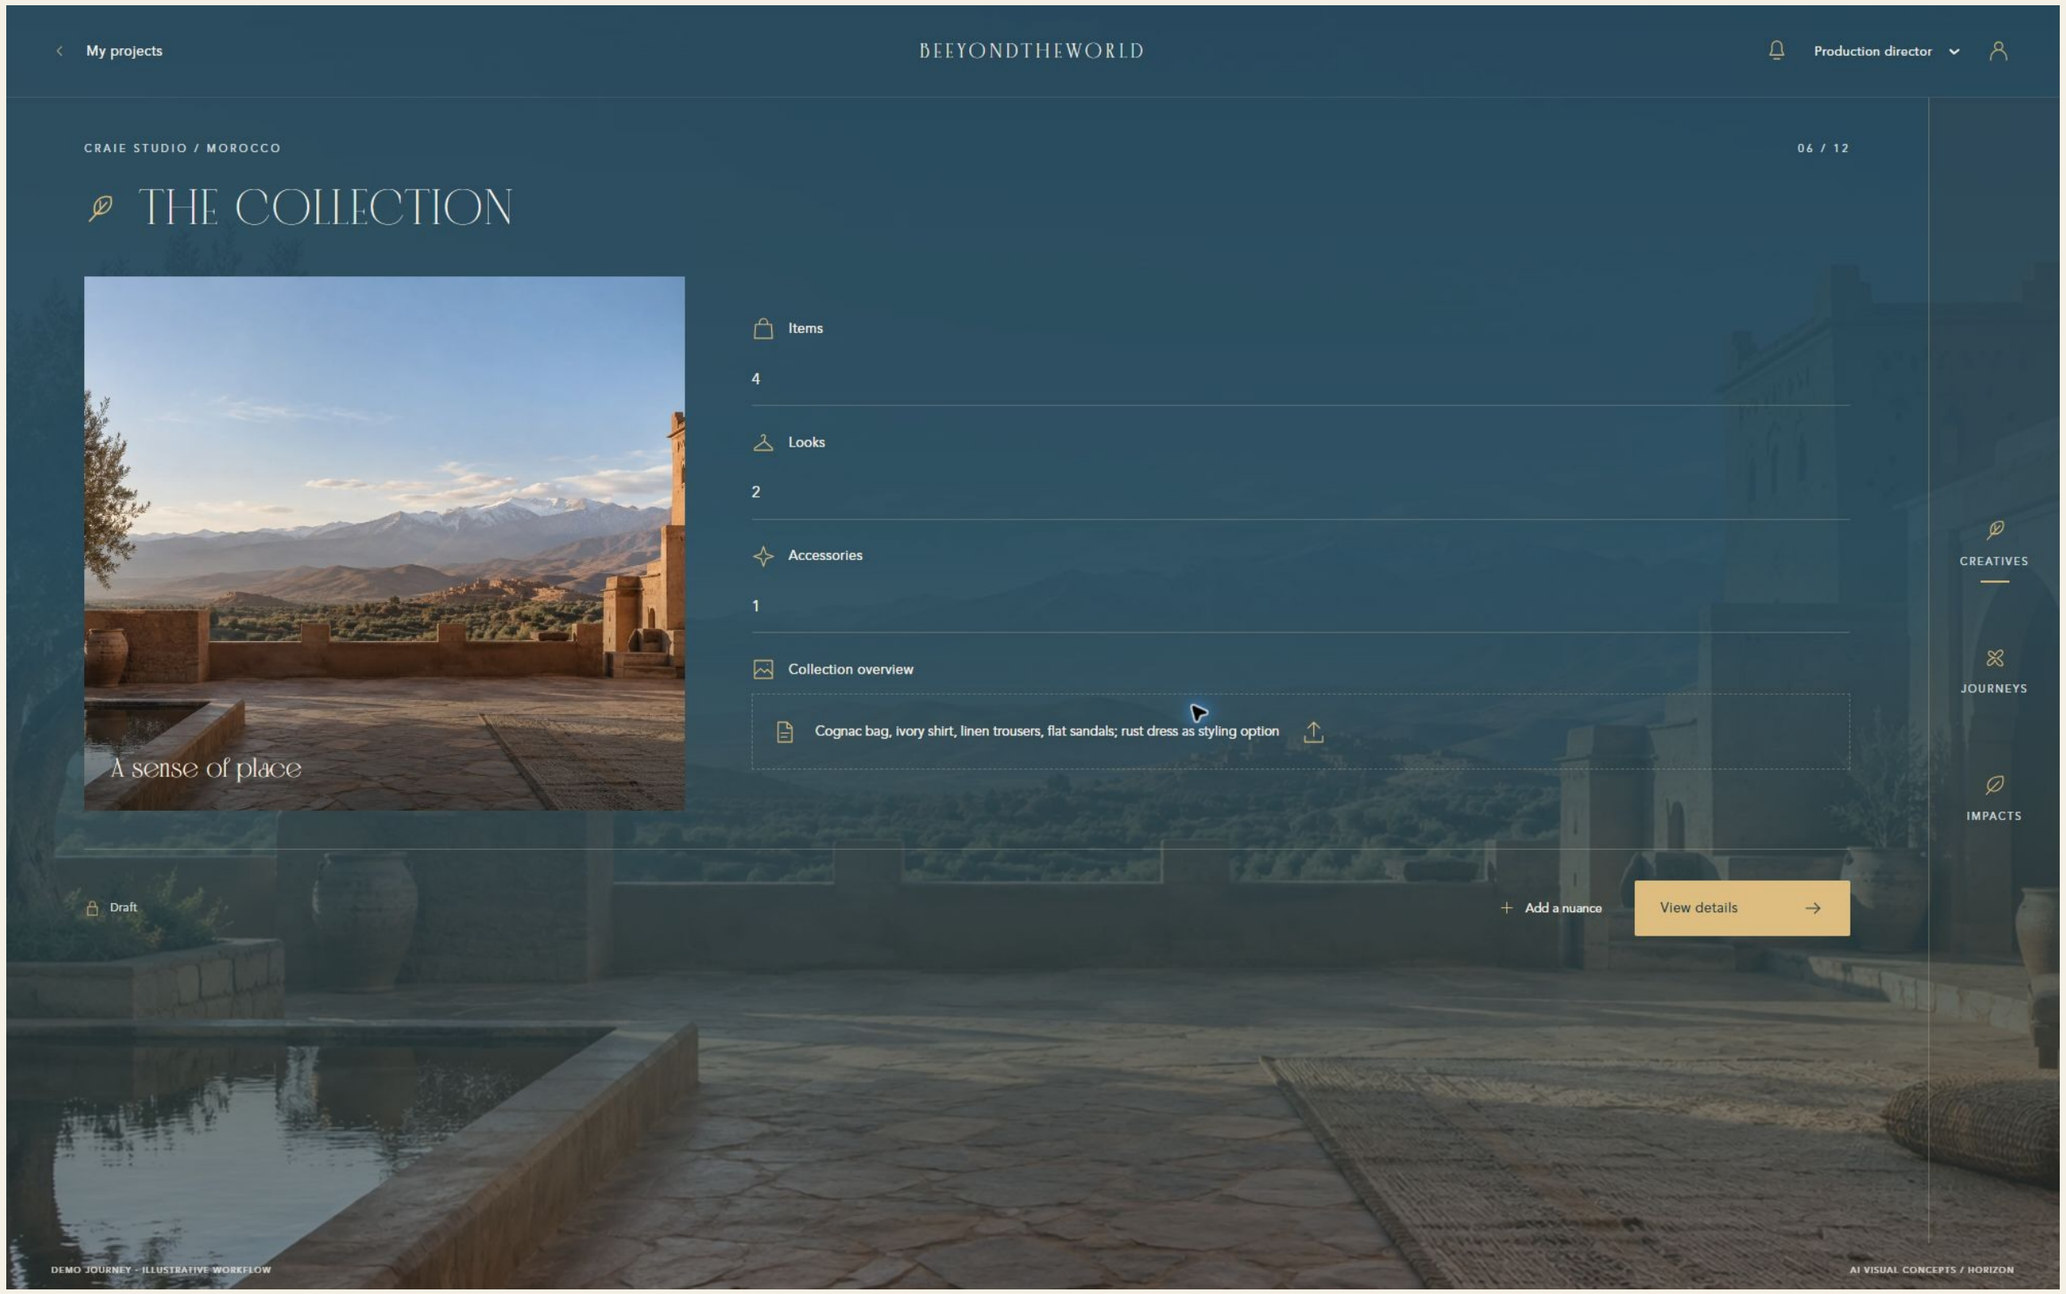

À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Lire cette partie du brief pour préparer sa contribution. Faire remonter une ambiguïté à Bee avant de la traduire en production.

CE QUI PASSE À LA SUITE

Bee vérifie le périmètre avant de lancer la proposition. Marque vers Bee et direction artistique.

01 / BRIEF DE LA MARQUE • 19-23 OCTOBRE

07 · Disponibilités

Consulter

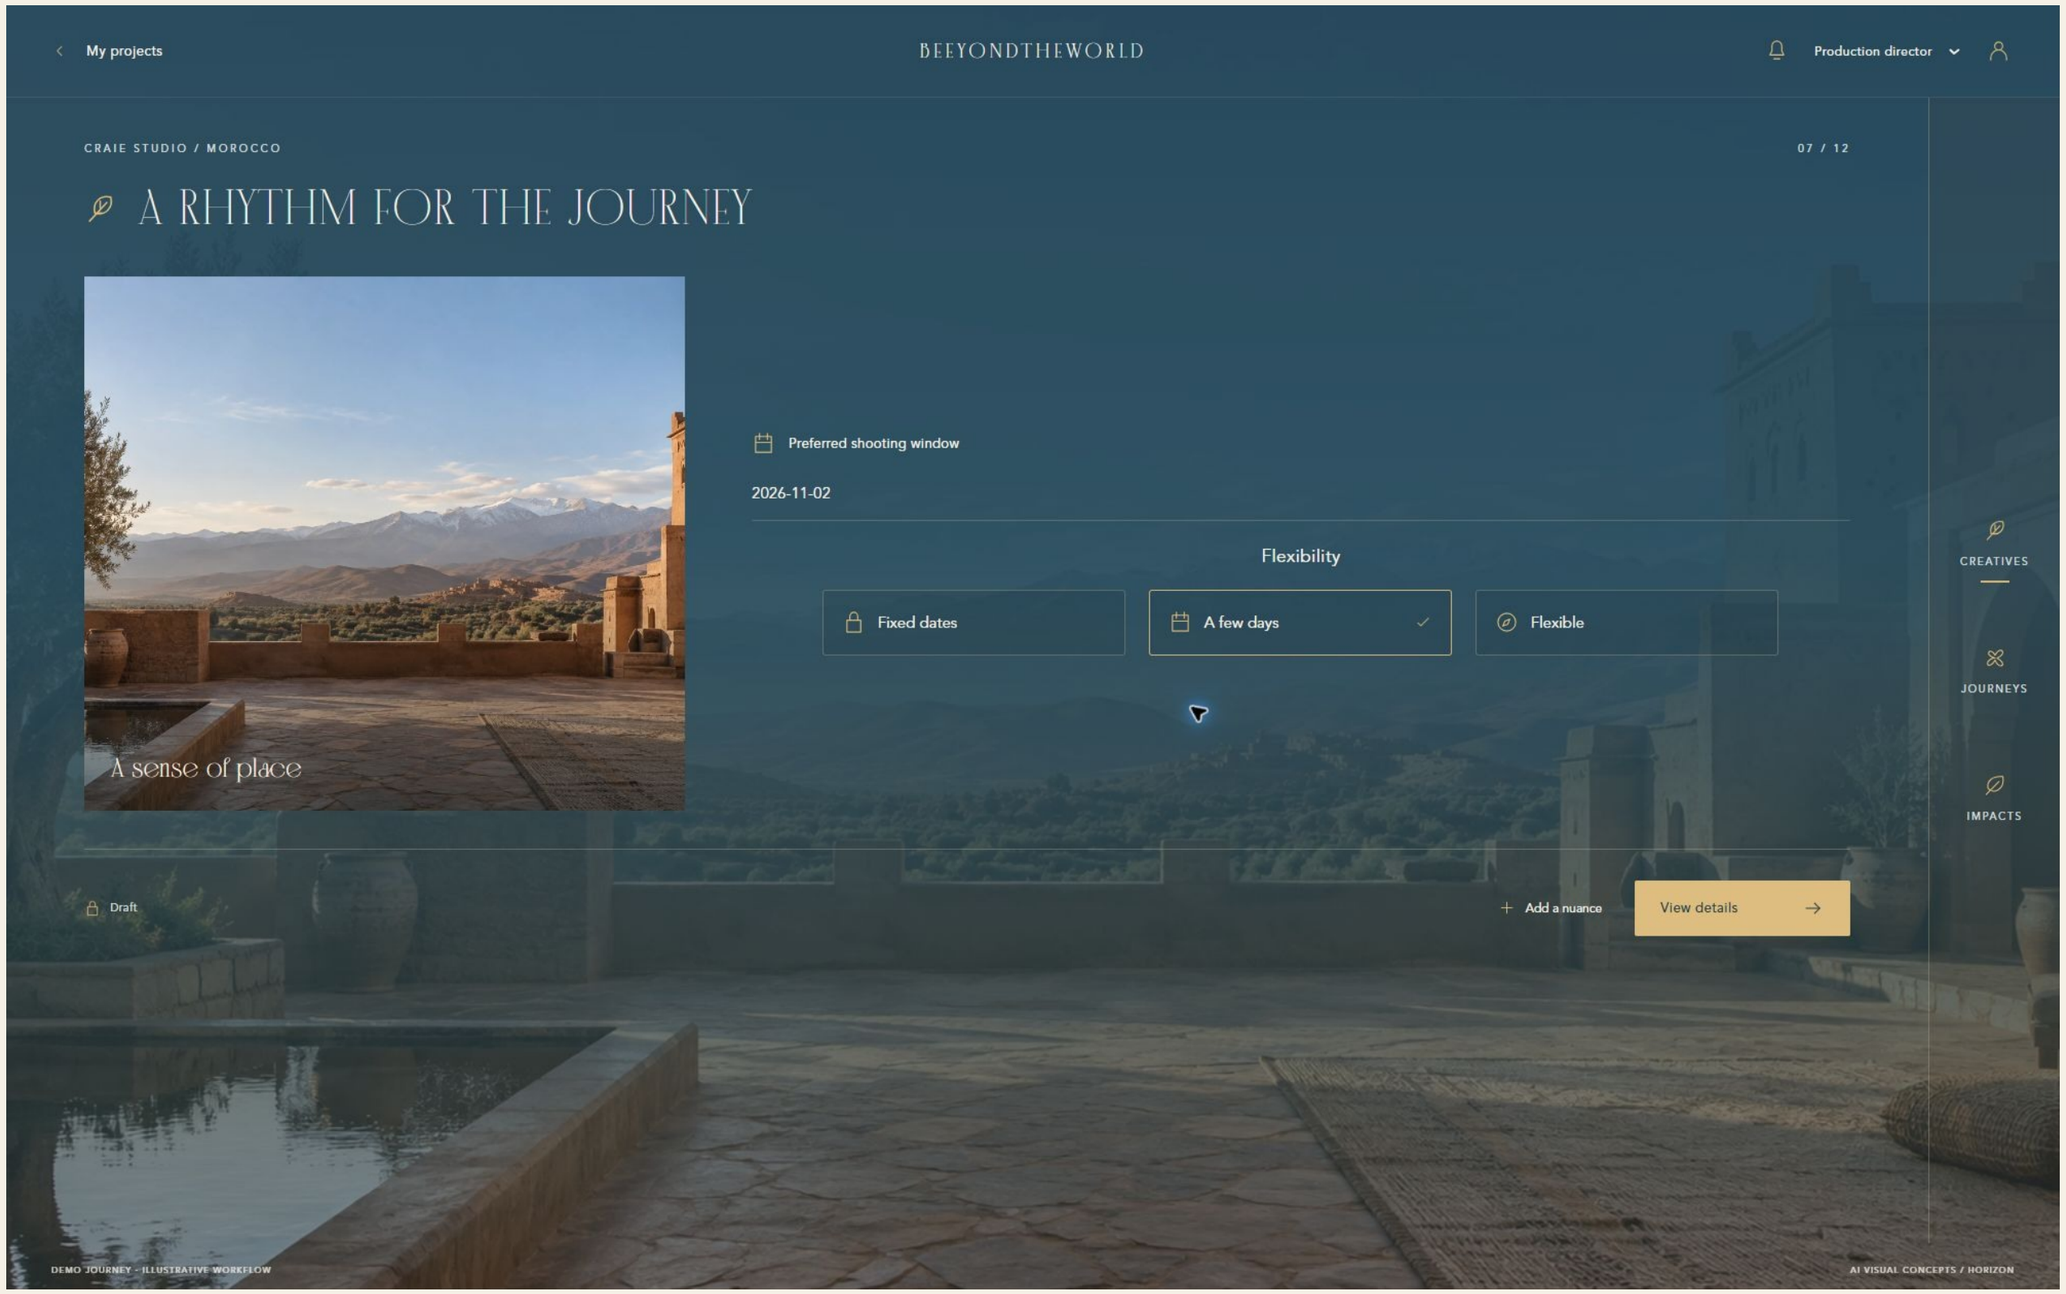

À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Lire cette partie du brief pour préparer sa contribution. Faire remonter une ambiguïté à Bee avant de la traduire en production.

CE QUI PASSE À LA SUITE

Bee vérifie le périmètre avant de lancer la proposition. Marque vers Bee et direction artistique.

01 / BRIEF DE LA MARQUE • 19-23 OCTOBRE

08 · Destinations

Consulter

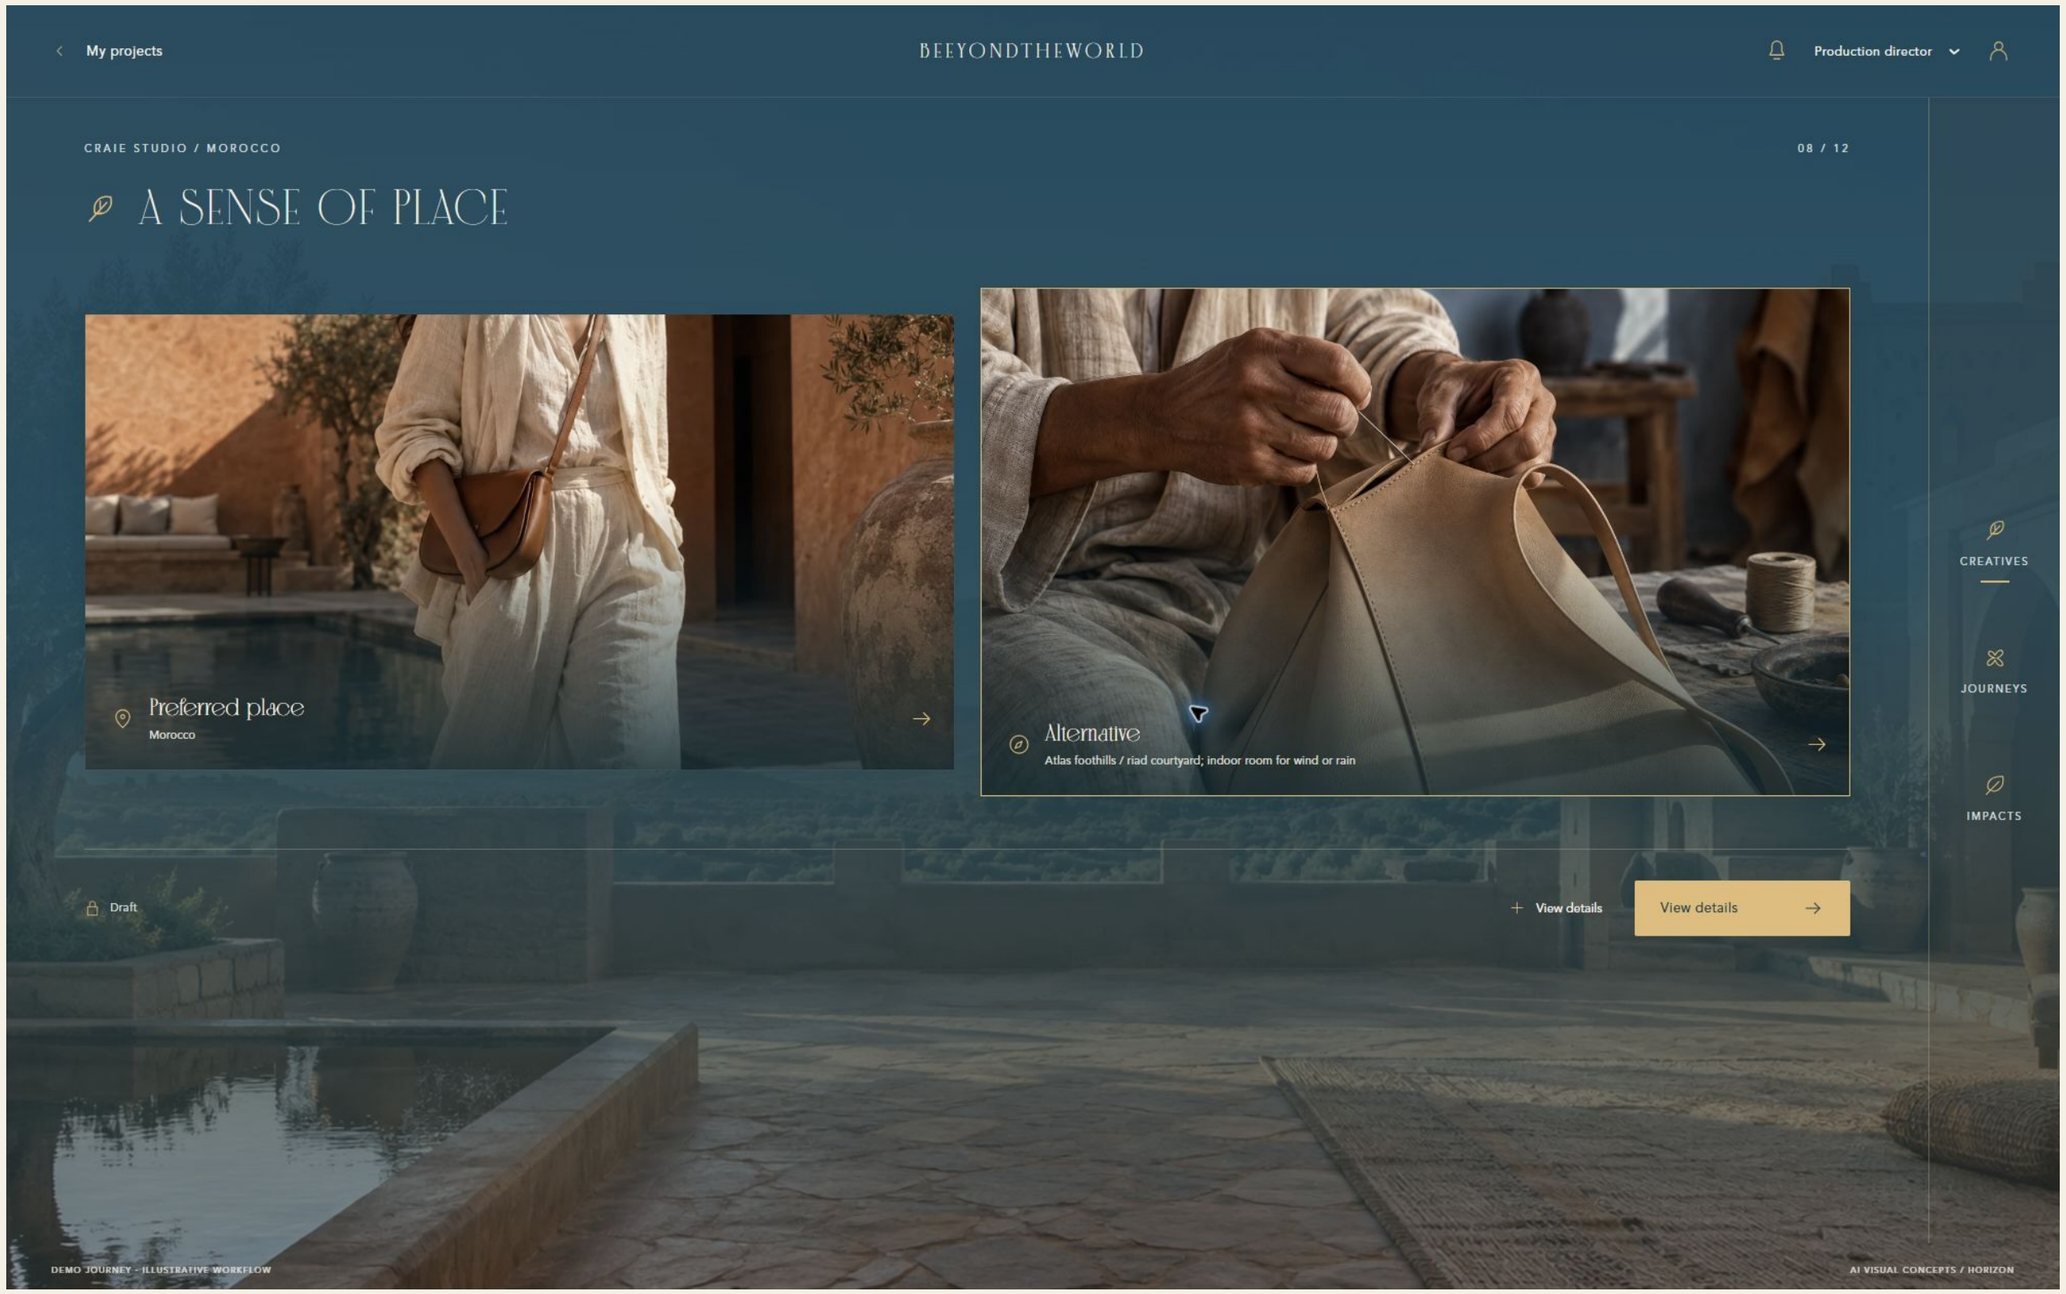

À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Lire cette partie du brief pour préparer sa contribution. Faire remonter une ambiguïté à Bee avant de la traduire en production.

CE QUI PASSE À LA SUITE

Bee vérifie le périmètre avant de lancer la proposition. Marque vers Bee et direction artistique.

01 / BRIEF DE LA MARQUE • 19-23 OCTOBRE

09 · Livrables photo

Consulter

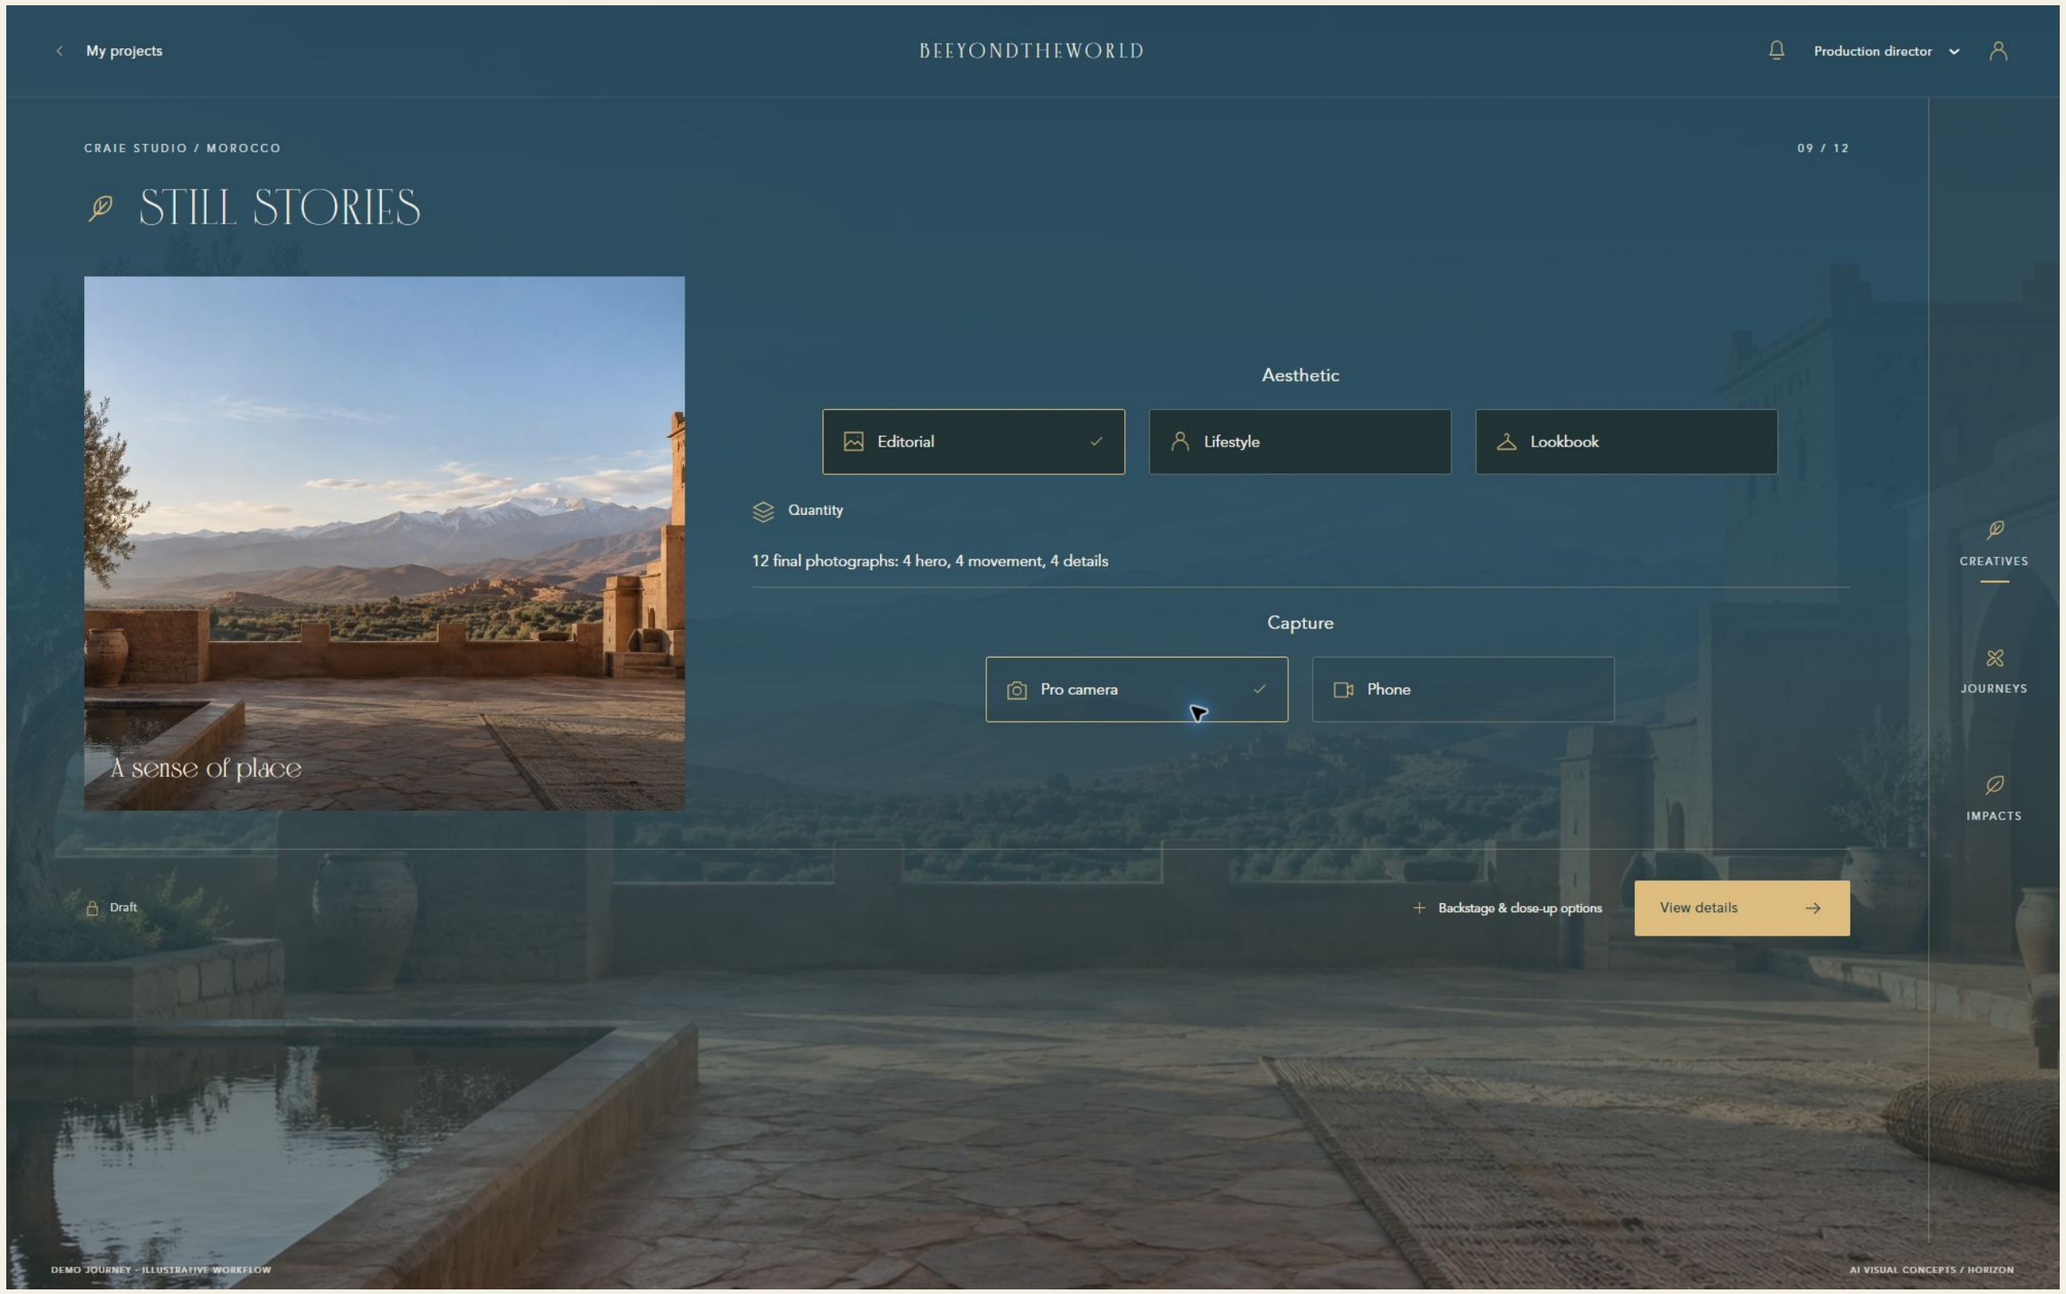

À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Lire cette partie du brief pour préparer sa contribution. Faire remonter une ambiguïté à Bee avant de la traduire en production.

CE QUI PASSE À LA SUITE

Bee vérifie le périmètre avant de lancer la proposition. Marque vers Bee et direction artistique.

01 / BRIEF DE LA MARQUE • 19-23 OCTOBRE

10 · Livrables vidéo

Consulter

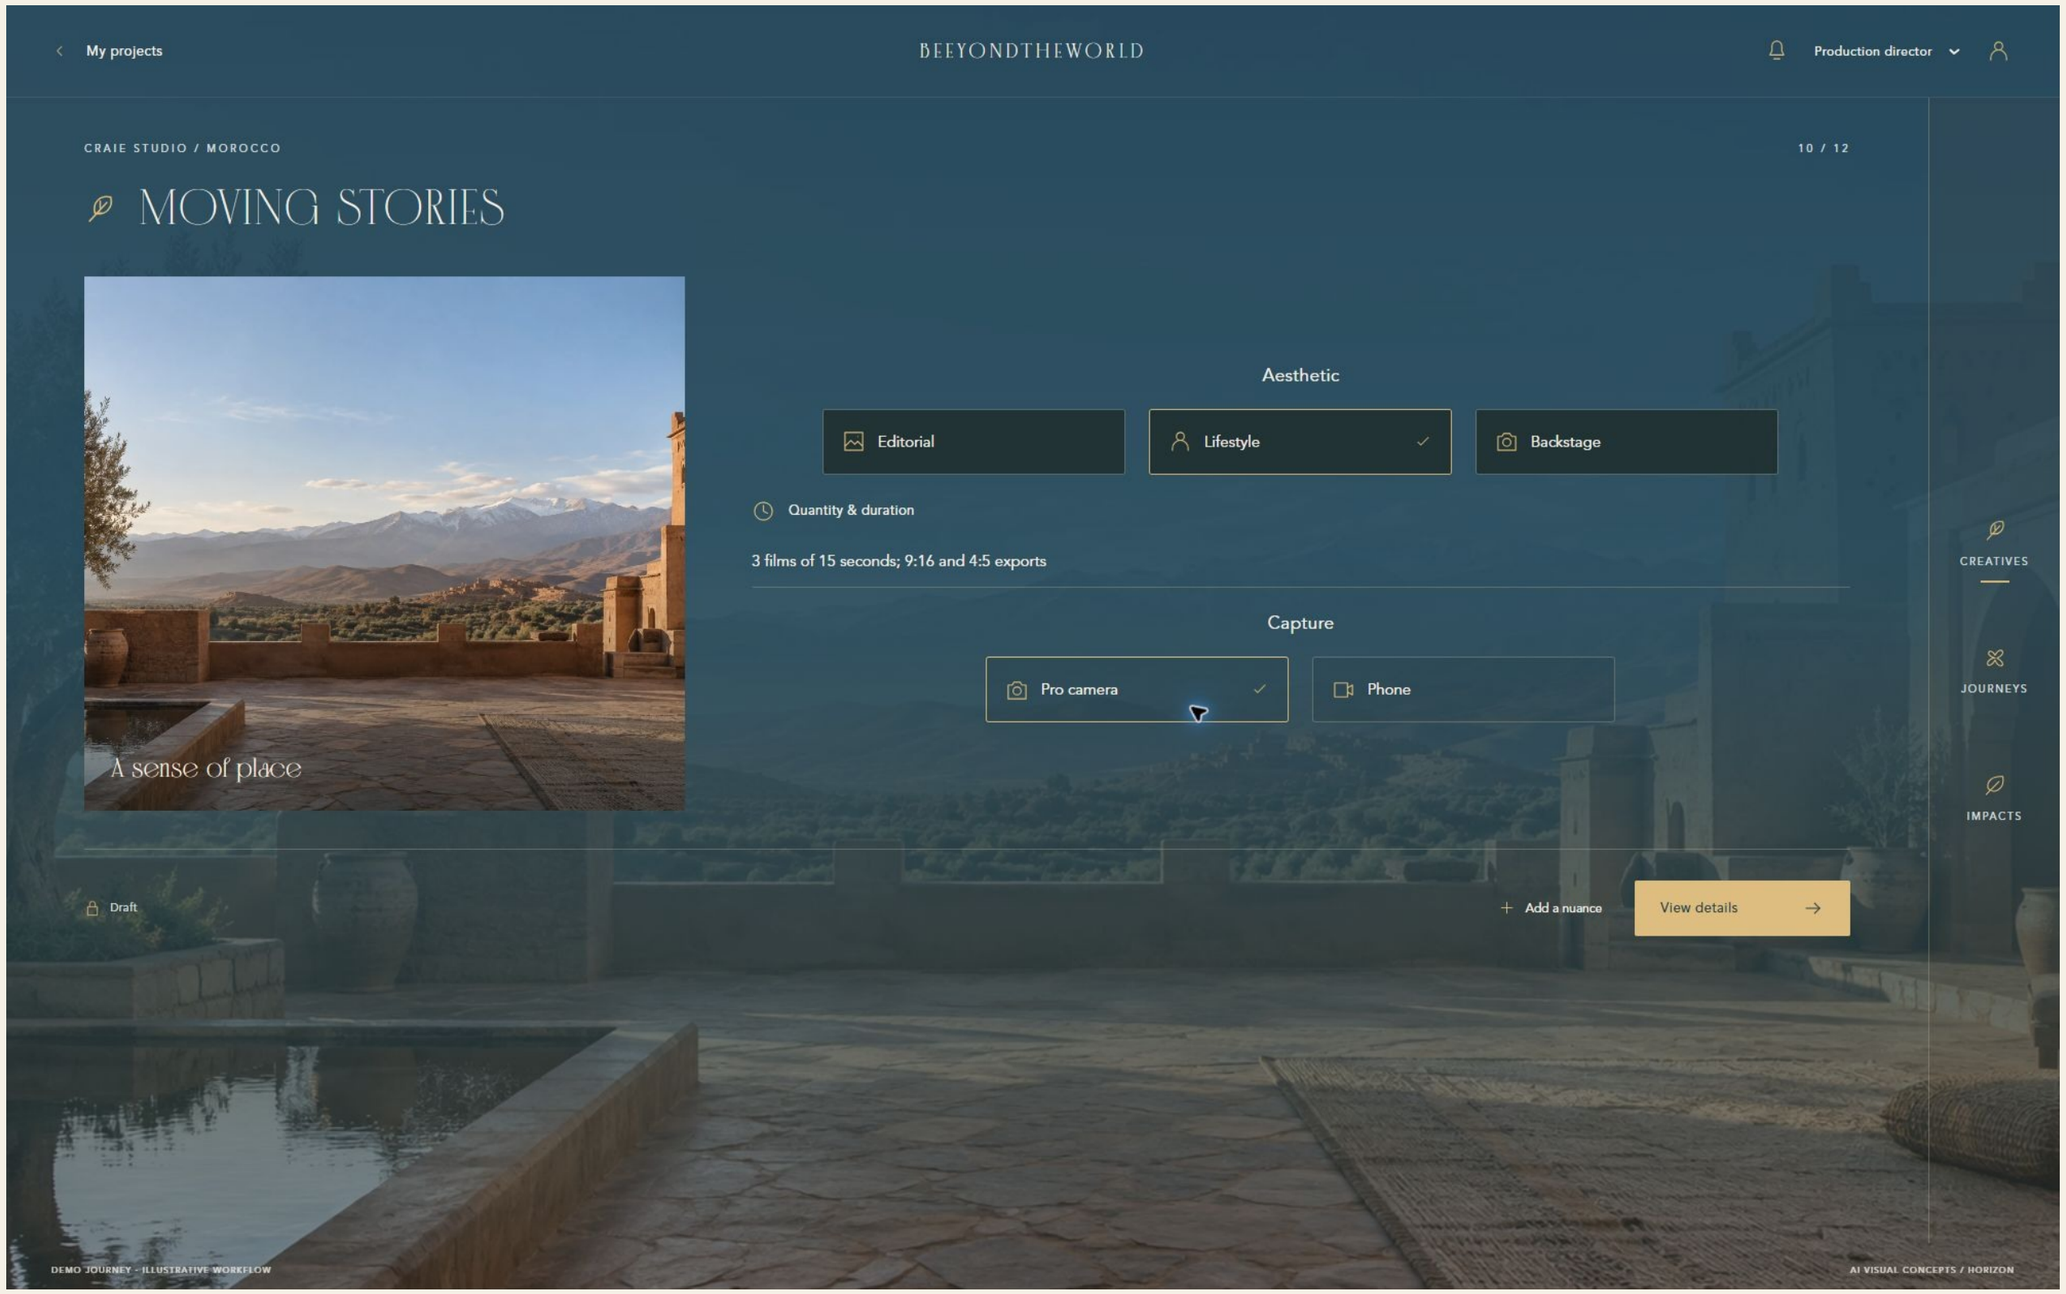

À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Lire cette partie du brief pour préparer sa contribution. Faire remonter une ambiguïté à Bee avant de la traduire en production.

CE QUI PASSE À LA SUITE

Bee vérifie le périmètre avant de lancer la proposition. Marque vers Bee et direction artistique.

01 / BRIEF DE LA MARQUE • 19-23 OCTOBRE

11 · Diffusion et droits

Consulter

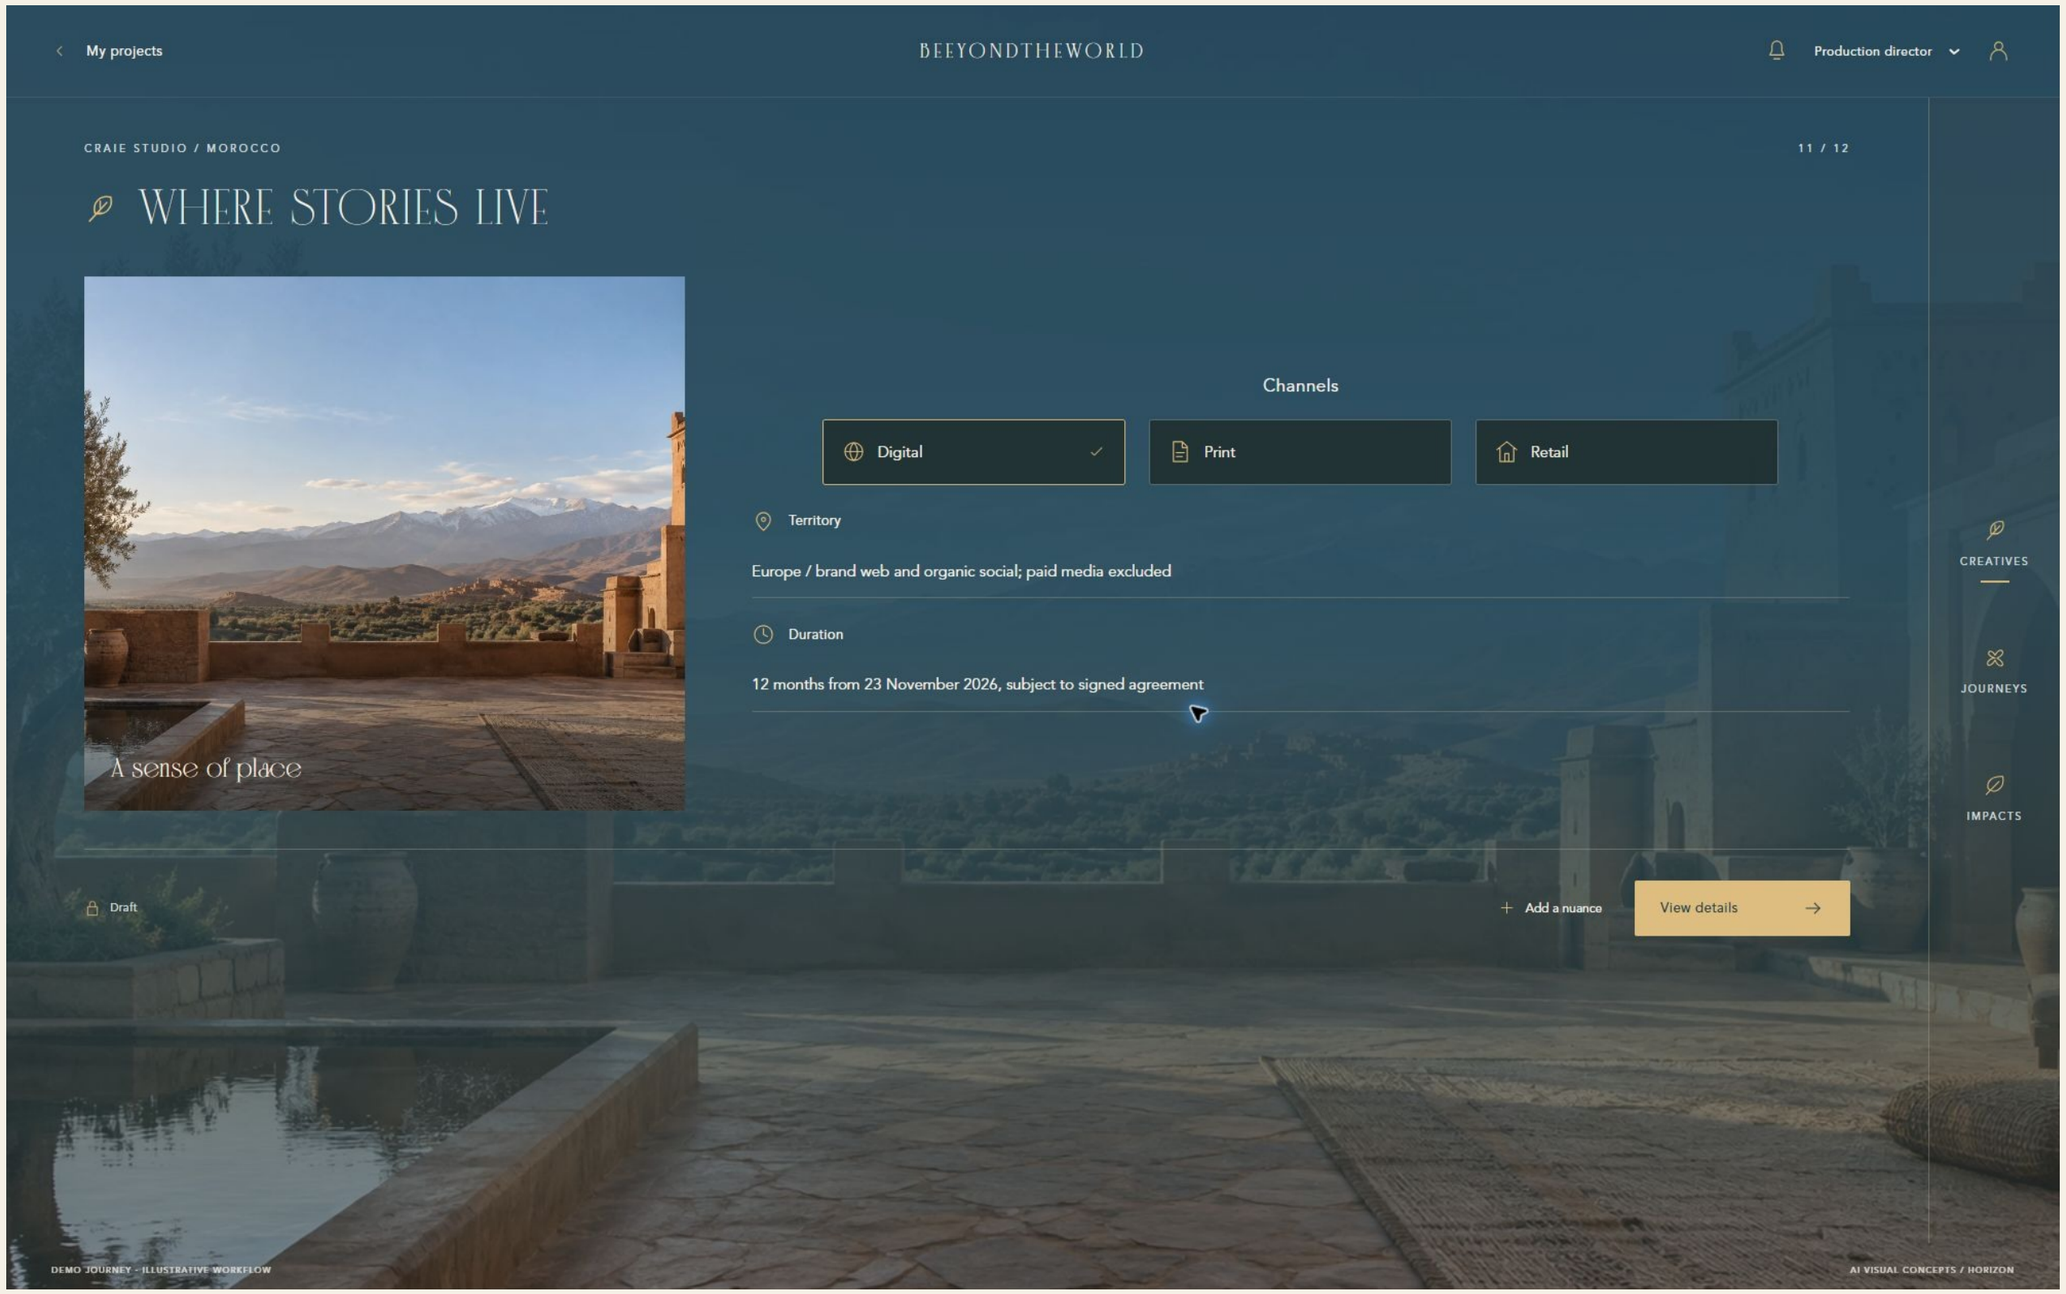

À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Lire cette partie du brief pour préparer sa contribution. Faire remonter une ambiguïté à Bee avant de la traduire en production.

CE QUI PASSE À LA SUITE

Bee vérifie le périmètre avant de lancer la proposition. Marque vers Bee et direction artistique.

01 / BRIEF DE LA MARQUE • 19-23 OCTOBRE

12 · Livraison attendue

Consulter

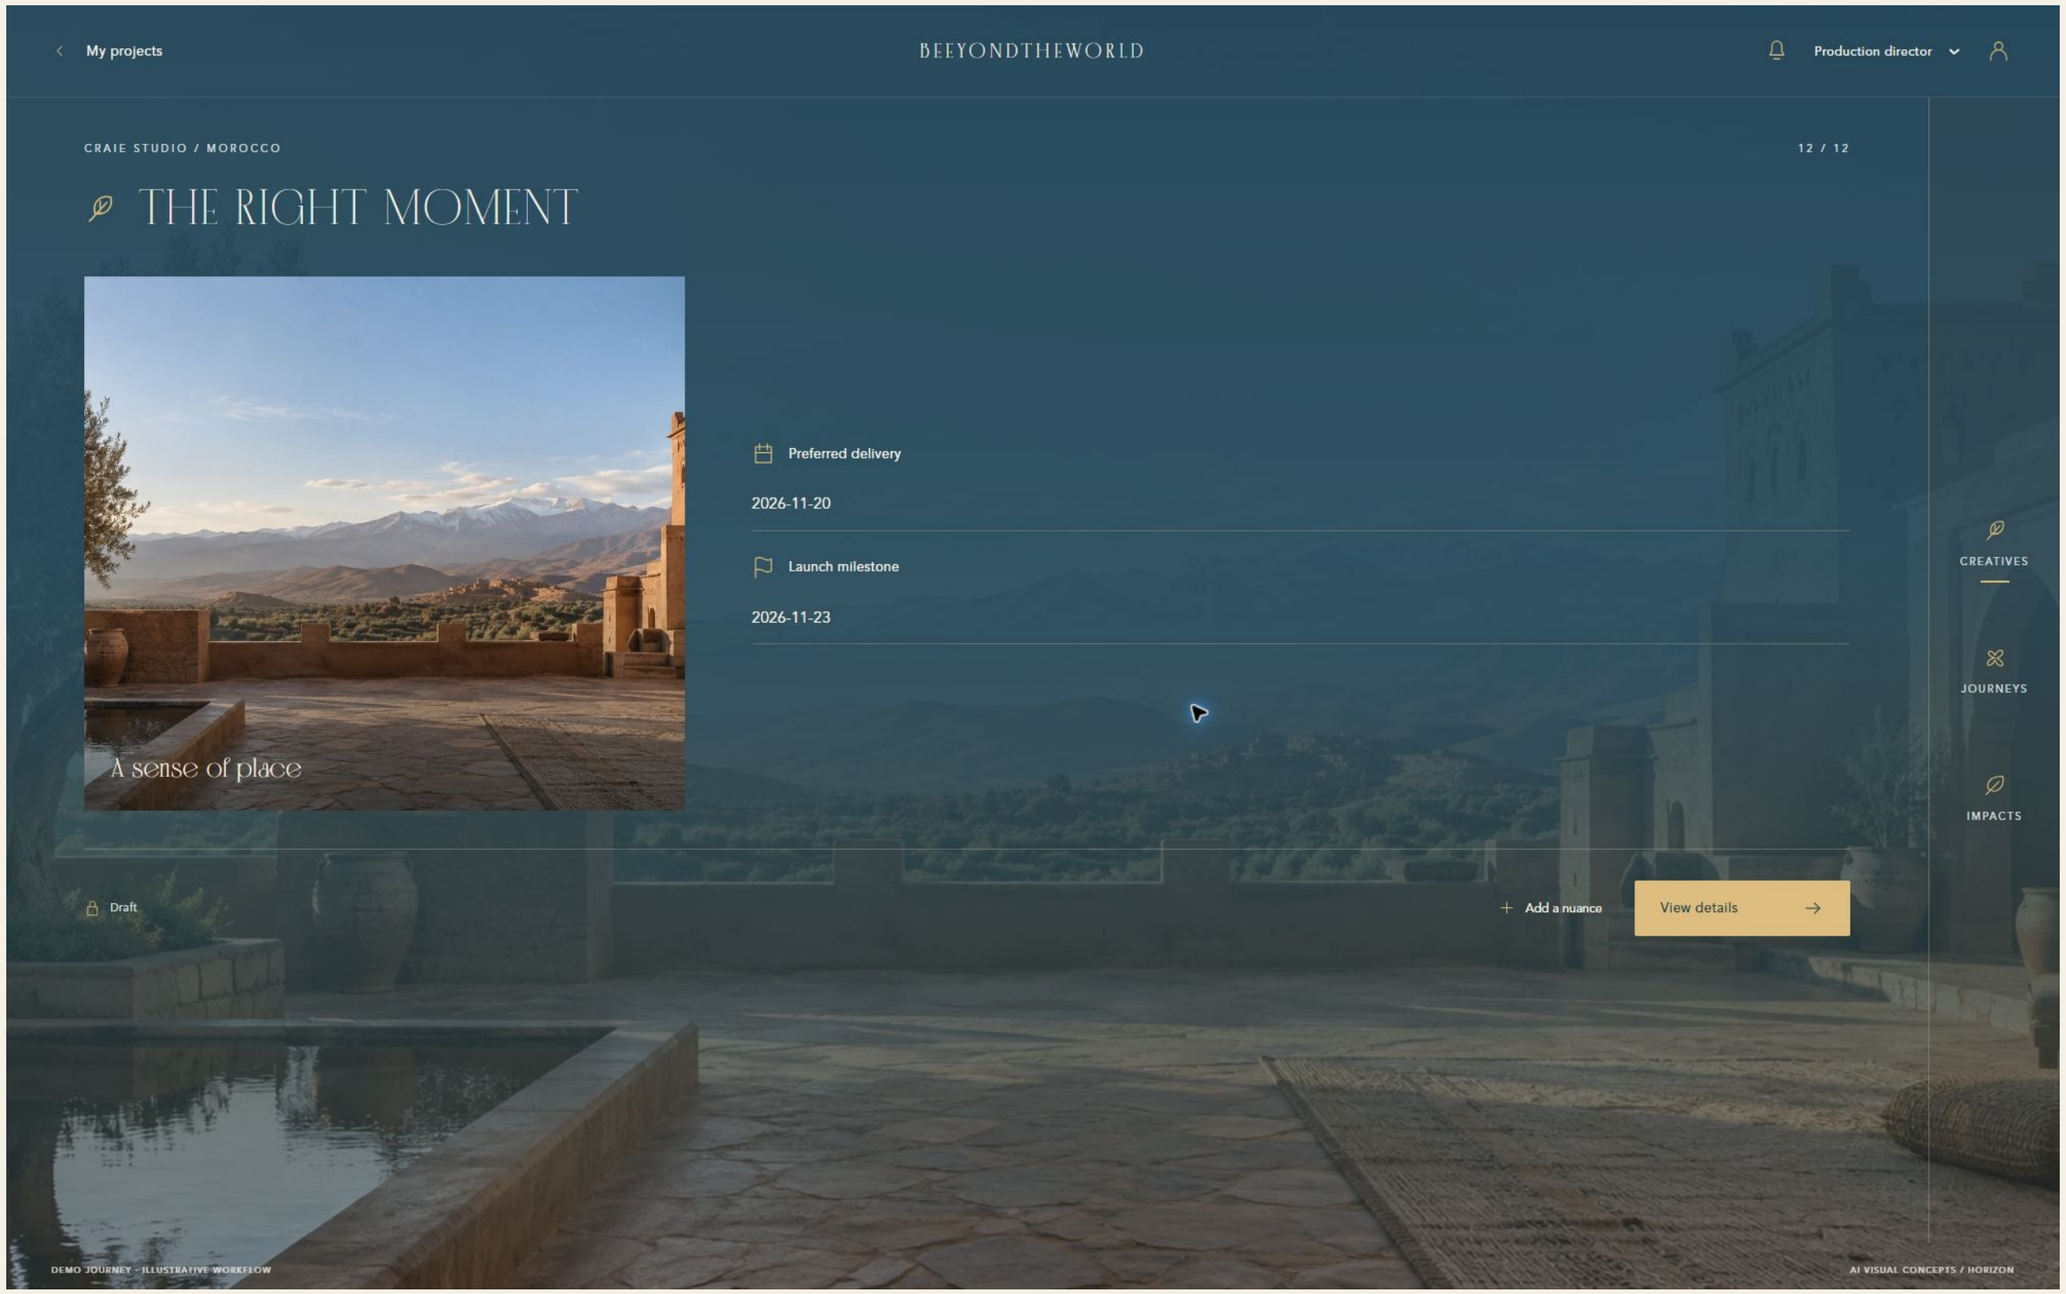

À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Lire cette partie du brief pour préparer sa contribution. Faire remonter une ambiguïté à Bee avant de la traduire en production.

CE QUI PASSE À LA SUITE

Bee vérifie le périmètre avant de lancer la proposition. Marque vers Bee et direction artistique.

01 / BRIEF DE LA MARQUE • 19-23 OCTOBRE

Relire et transmettre

Consulter

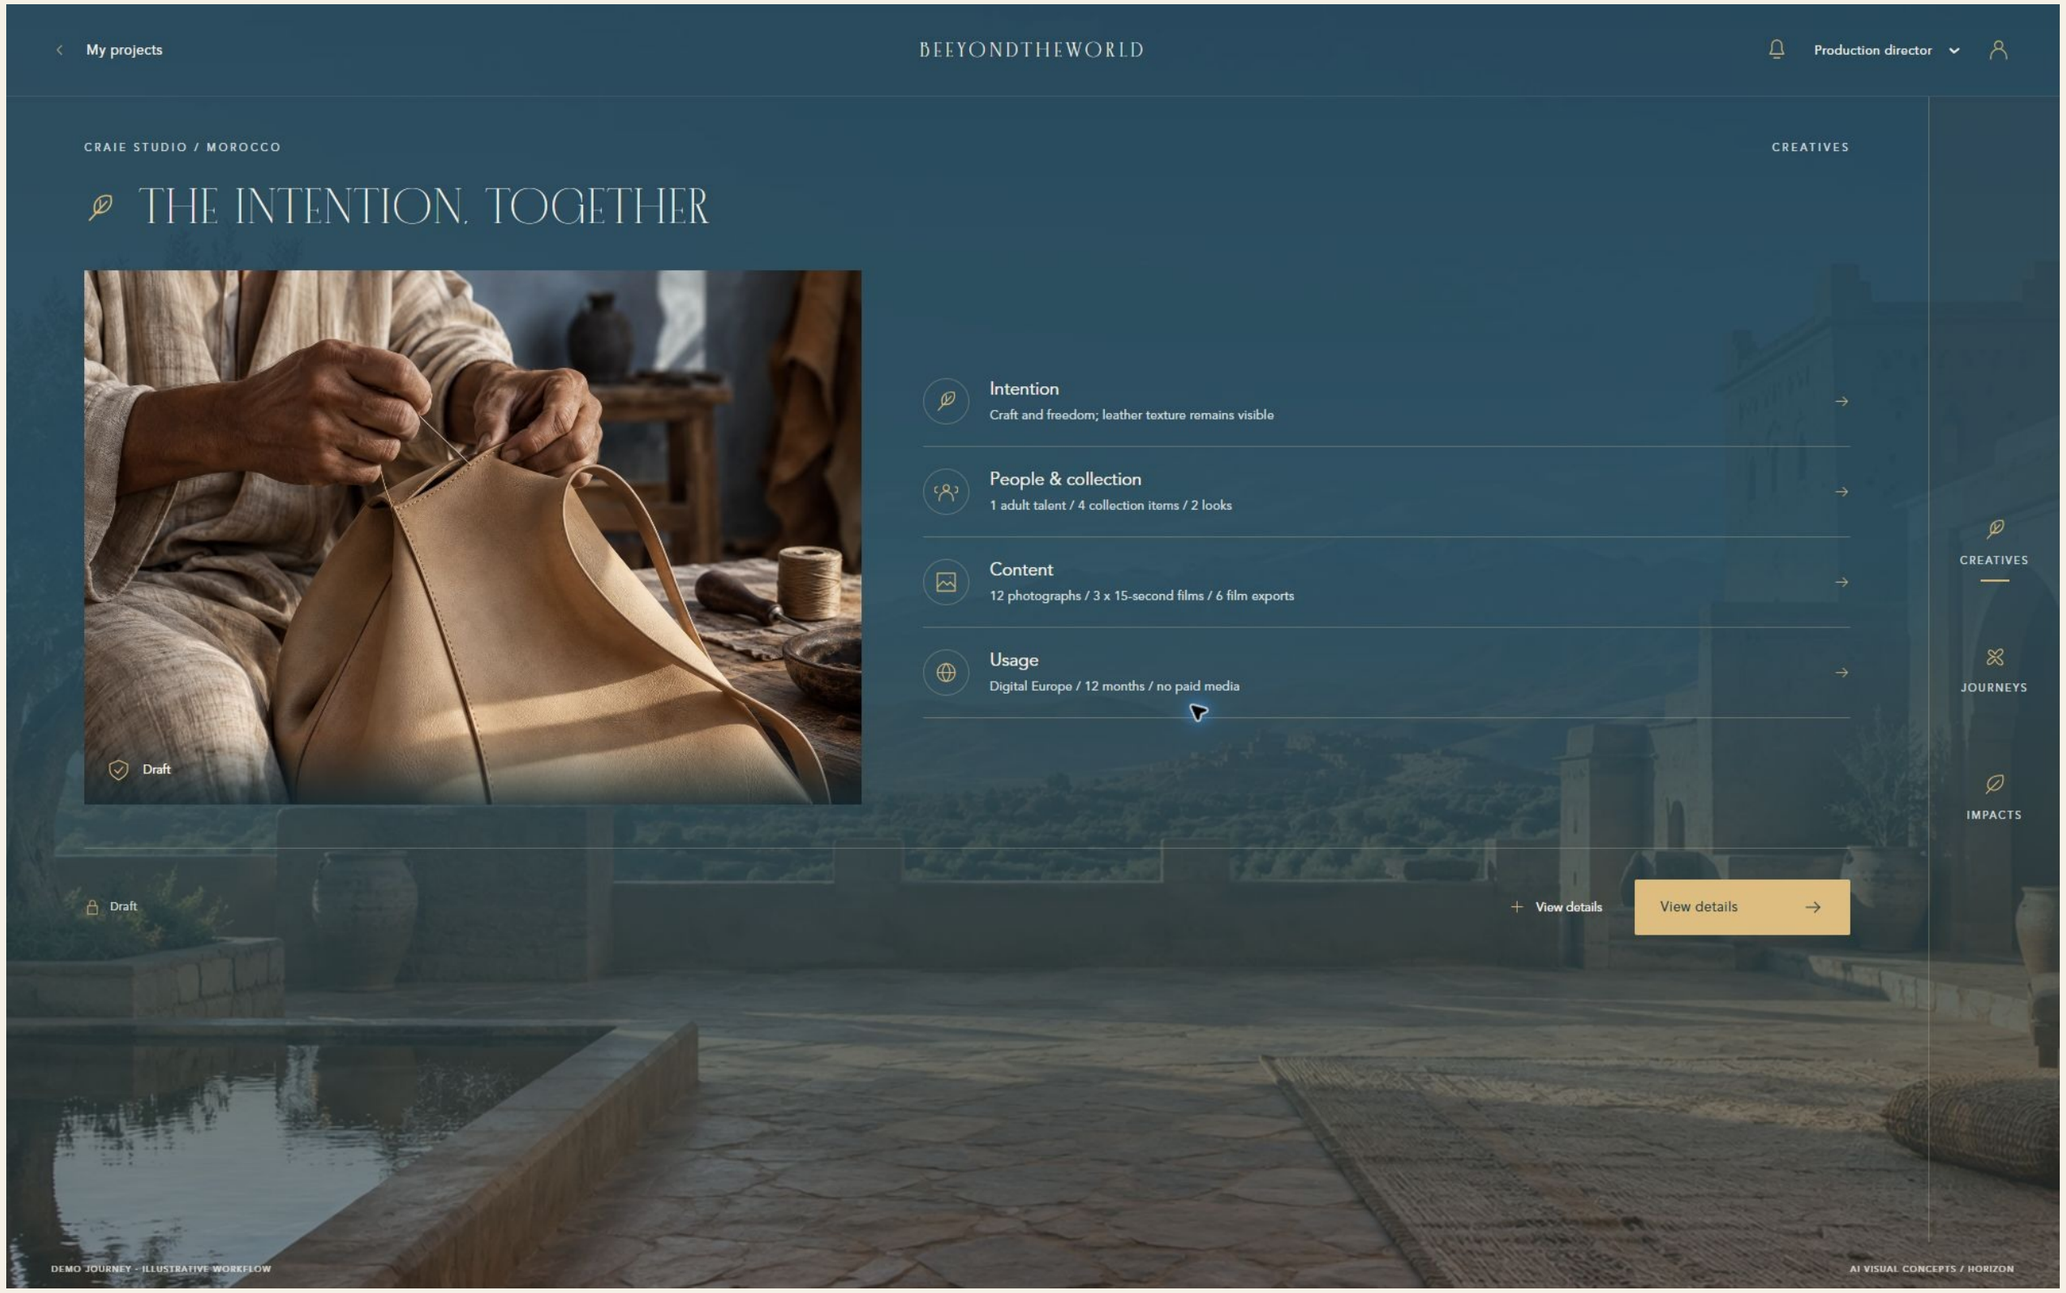

À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Lire cette partie du brief pour préparer sa contribution. Faire remonter une ambiguïté à Bee avant de la traduire en production.

CE QUI PASSE À LA SUITE

Bee vérifie le périmètre avant de lancer la proposition. Marque vers Bee et direction artistique.

03 / CRÉATION ET CONSTITUTION DE L'ÉQUIPE • 24-30 OCTOBRE

Proposition créative

Consulter

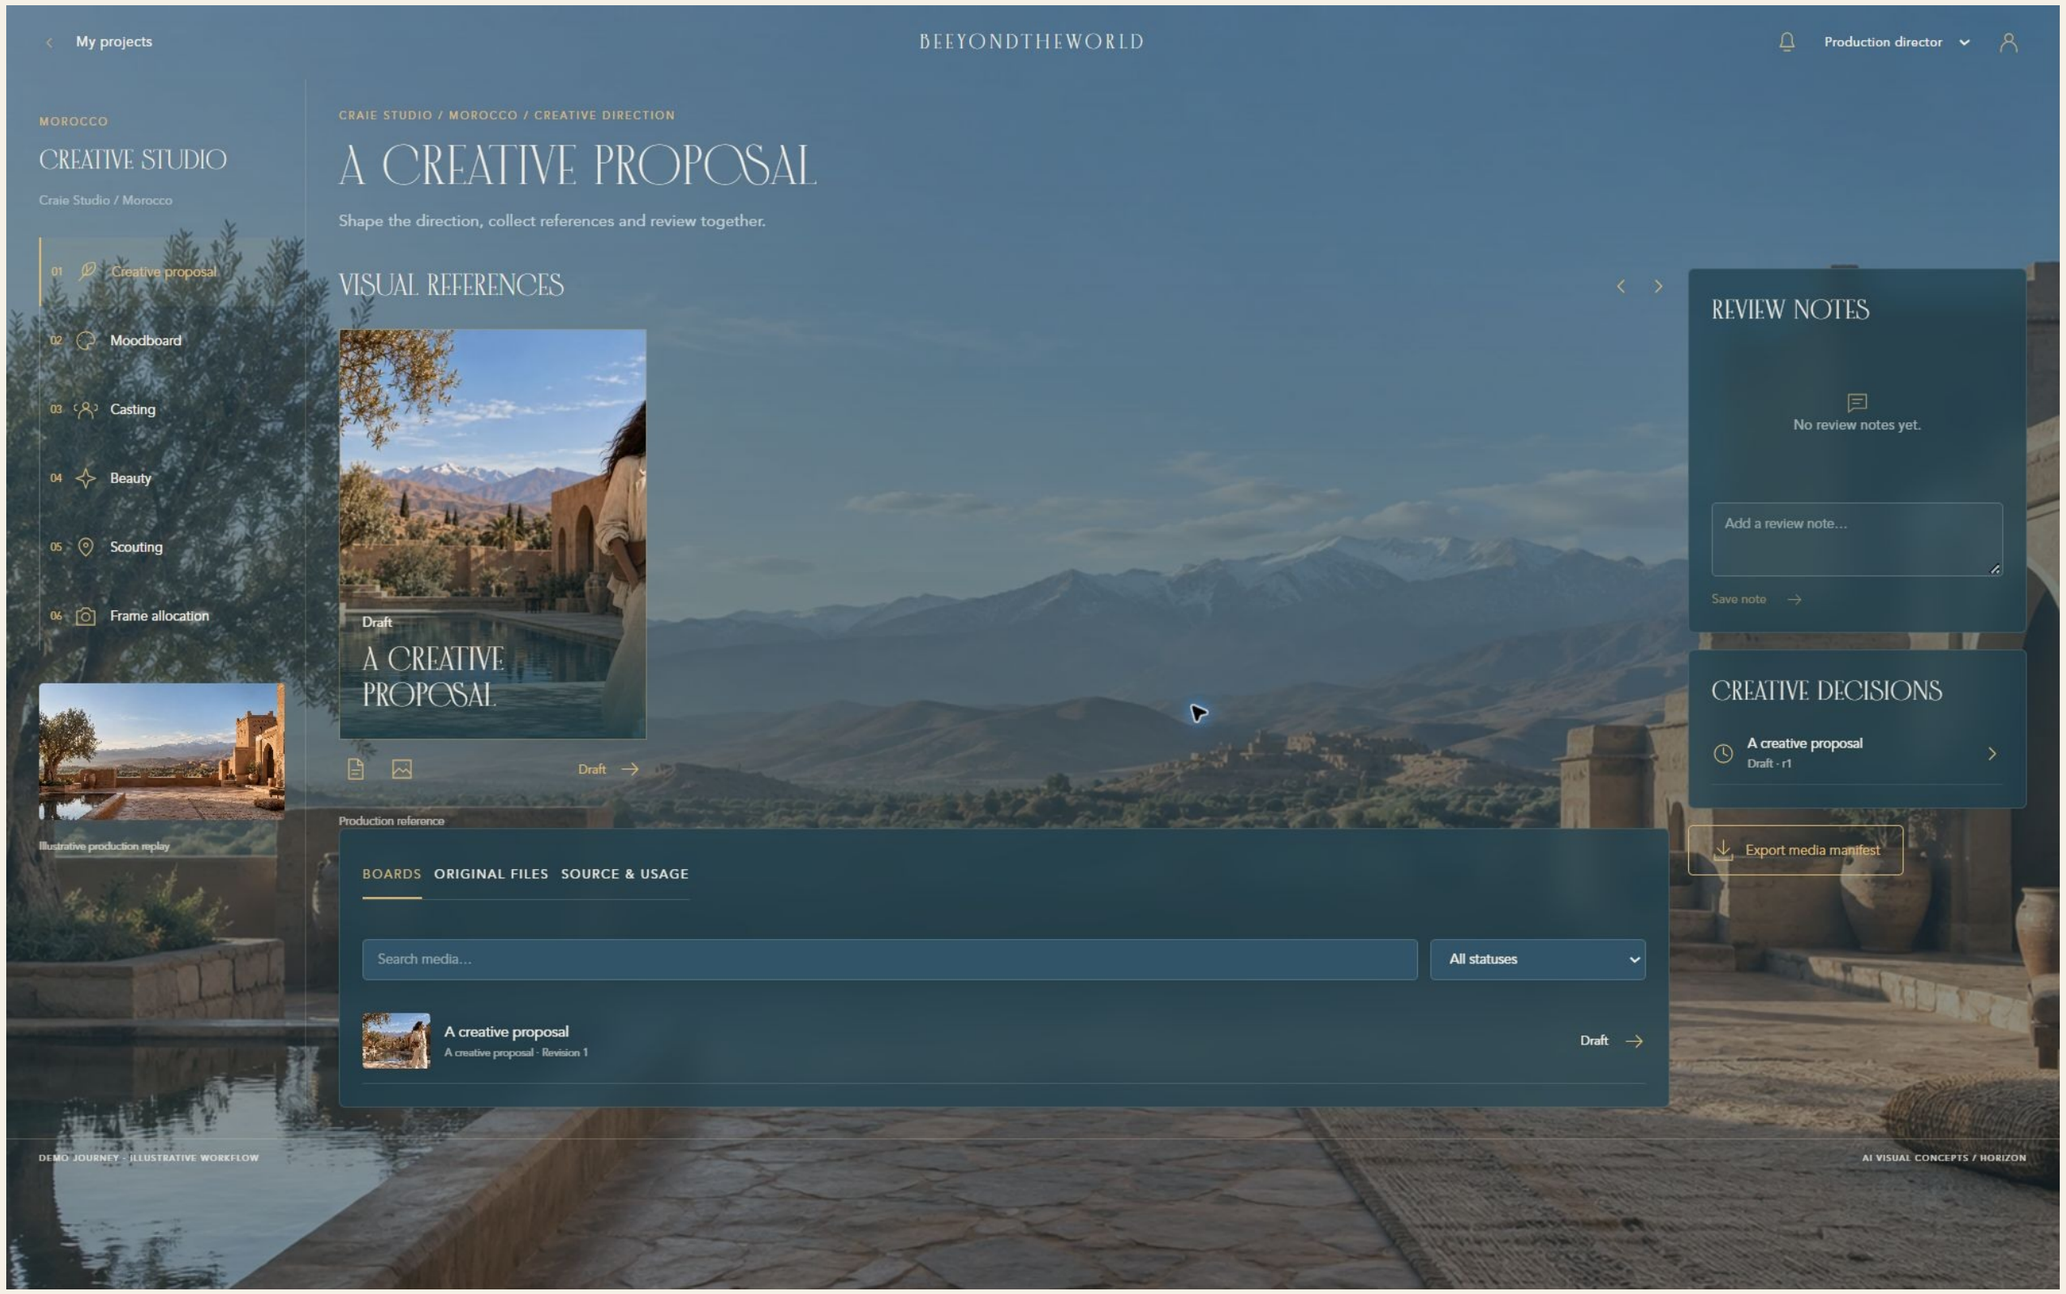

À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Lire les informations utiles à sa mission et vérifier la version. Transmettre une question au responsable de cette étape si un élément manque.

CE QUI PASSE À LA SUITE

Bee examine la création avant la marque ; Bee décide du budget. Direction artistique et production vers Bee.

03 / CRÉATION ET CONSTITUTION DE L'ÉQUIPE • 24-30 OCTOBRE

Moodboard

Consulter

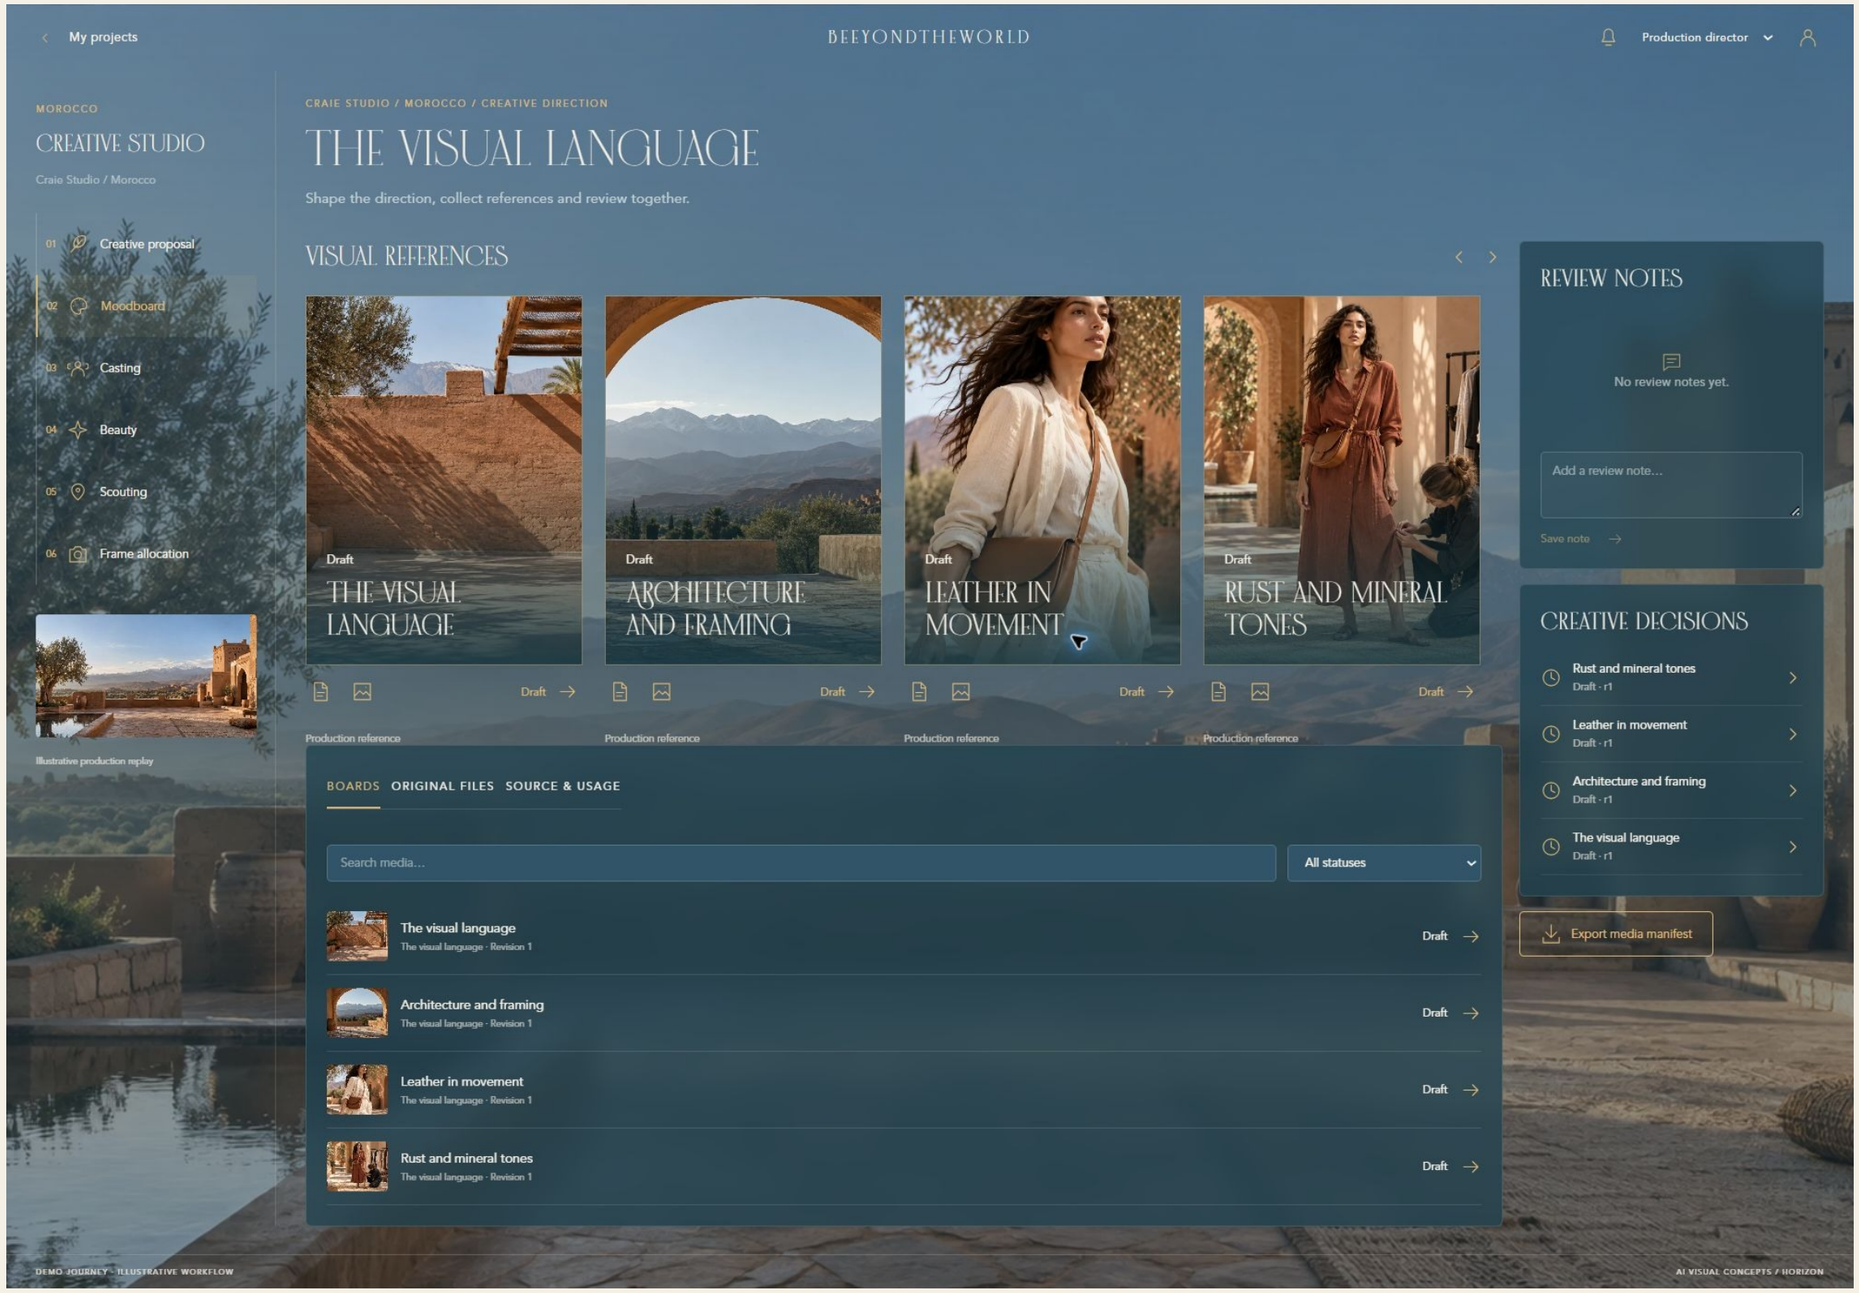

À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Lire les informations utiles à sa mission et vérifier la version. Transmettre une question au responsable de cette étape si un élément manque.

CE QUI PASSE À LA SUITE

Bee examine la création avant la marque ; Bee décide du budget. Direction artistique et production vers Bee.

03 / CRÉATION ET CONSTITUTION DE L'ÉQUIPE • 24-30 OCTOBRE

Sélection du casting

Préparer / compléter

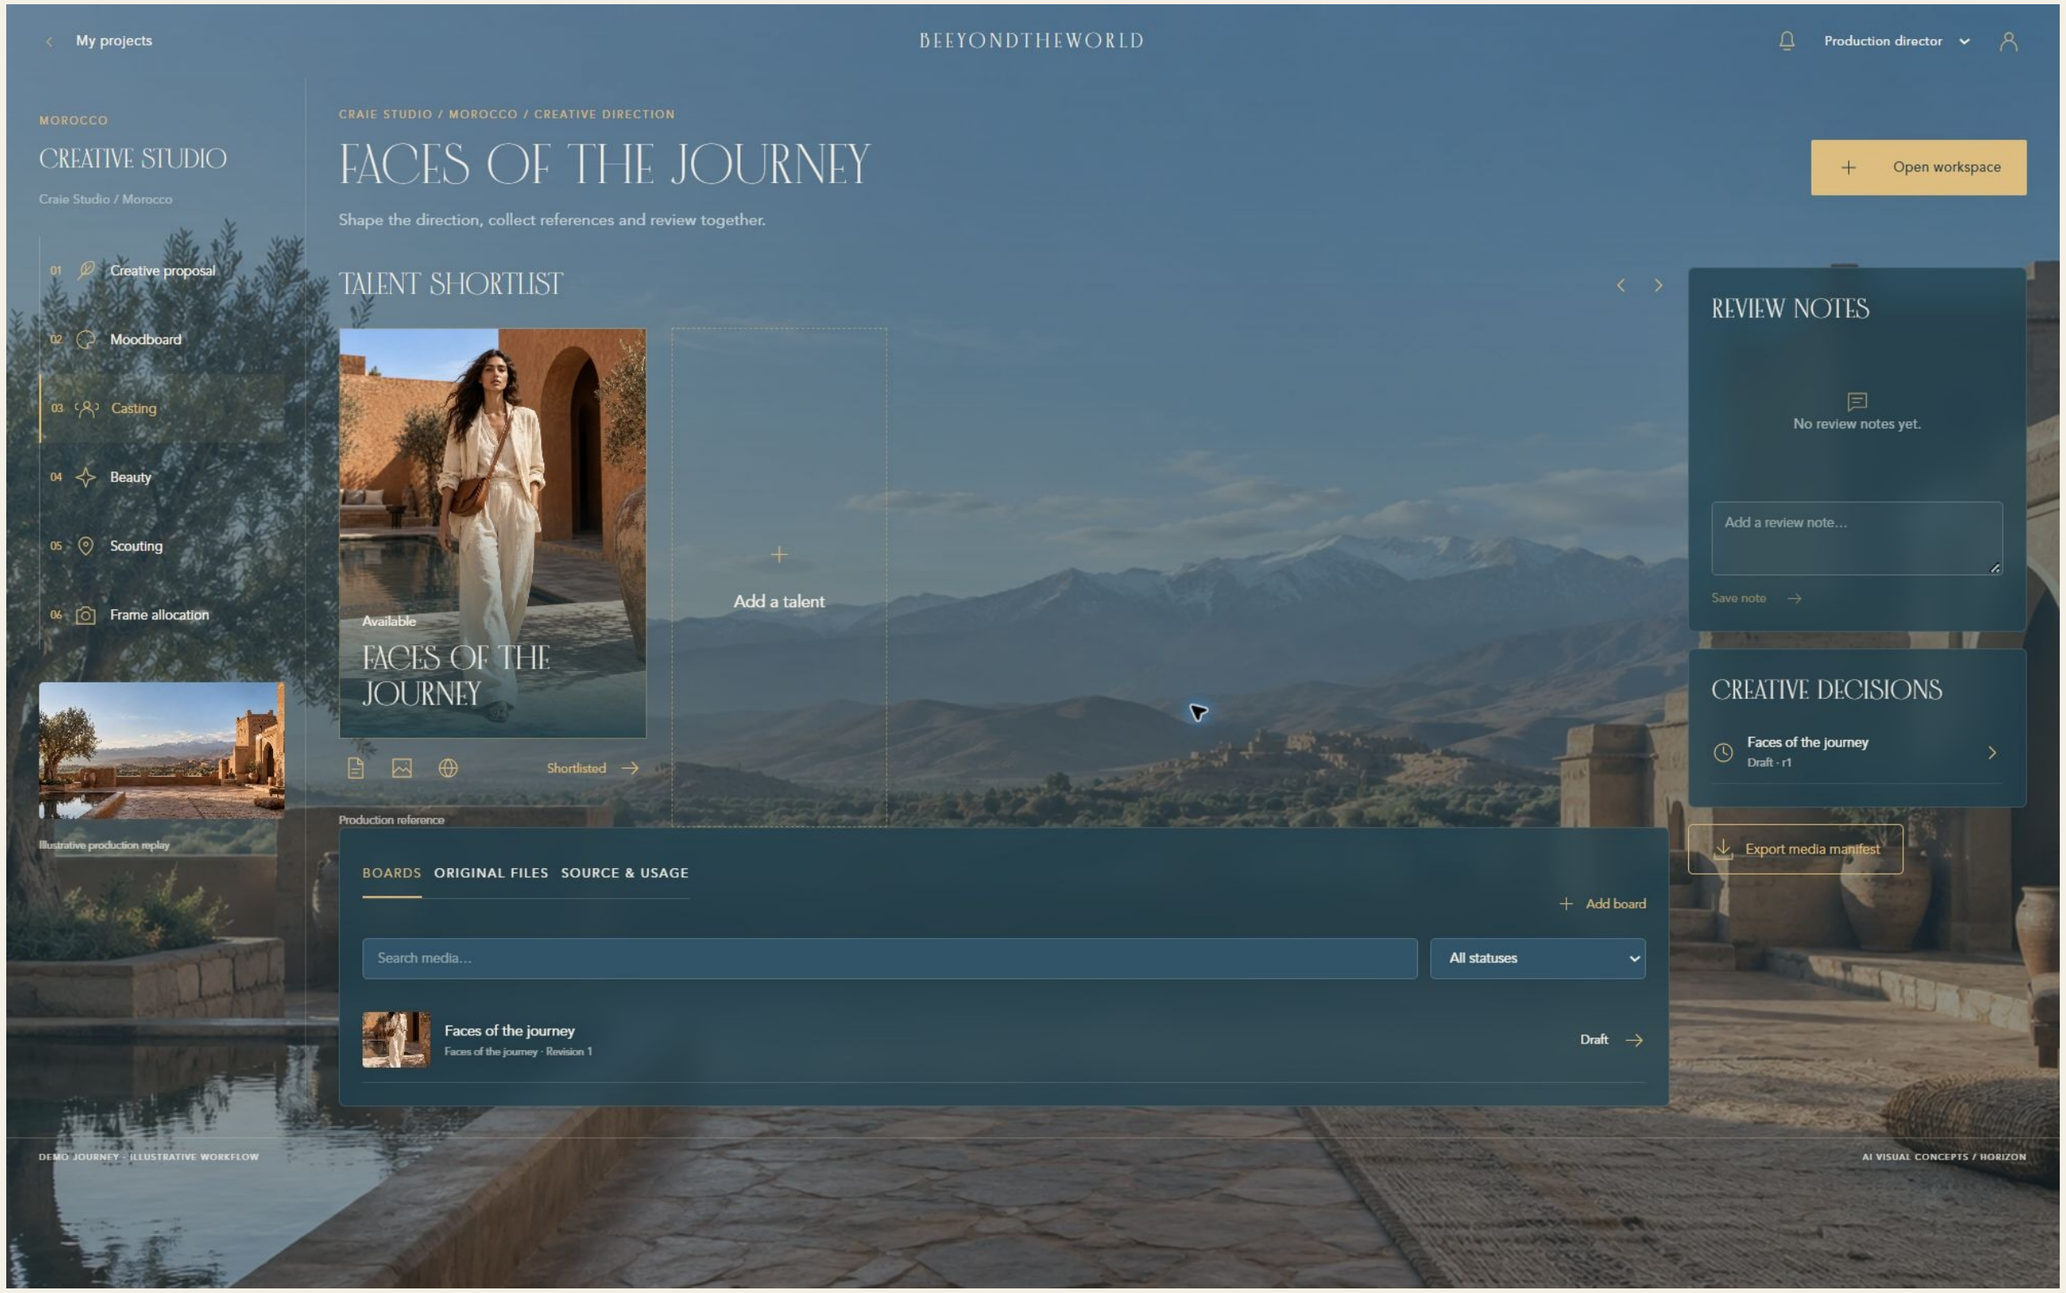

À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Préparer les informations et références affichées, vérifier leur cohérence avec le brief puis transmettre au responsable de l'étape.

CE QUI PASSE À LA SUITE

Bee examine la création avant la marque ; Bee décide du budget. Direction artistique et production vers Bee.

03 / CRÉATION ET CONSTITUTION DE L'ÉQUIPE • 24-30 OCTOBRE

Catalogue des produits

Consulter

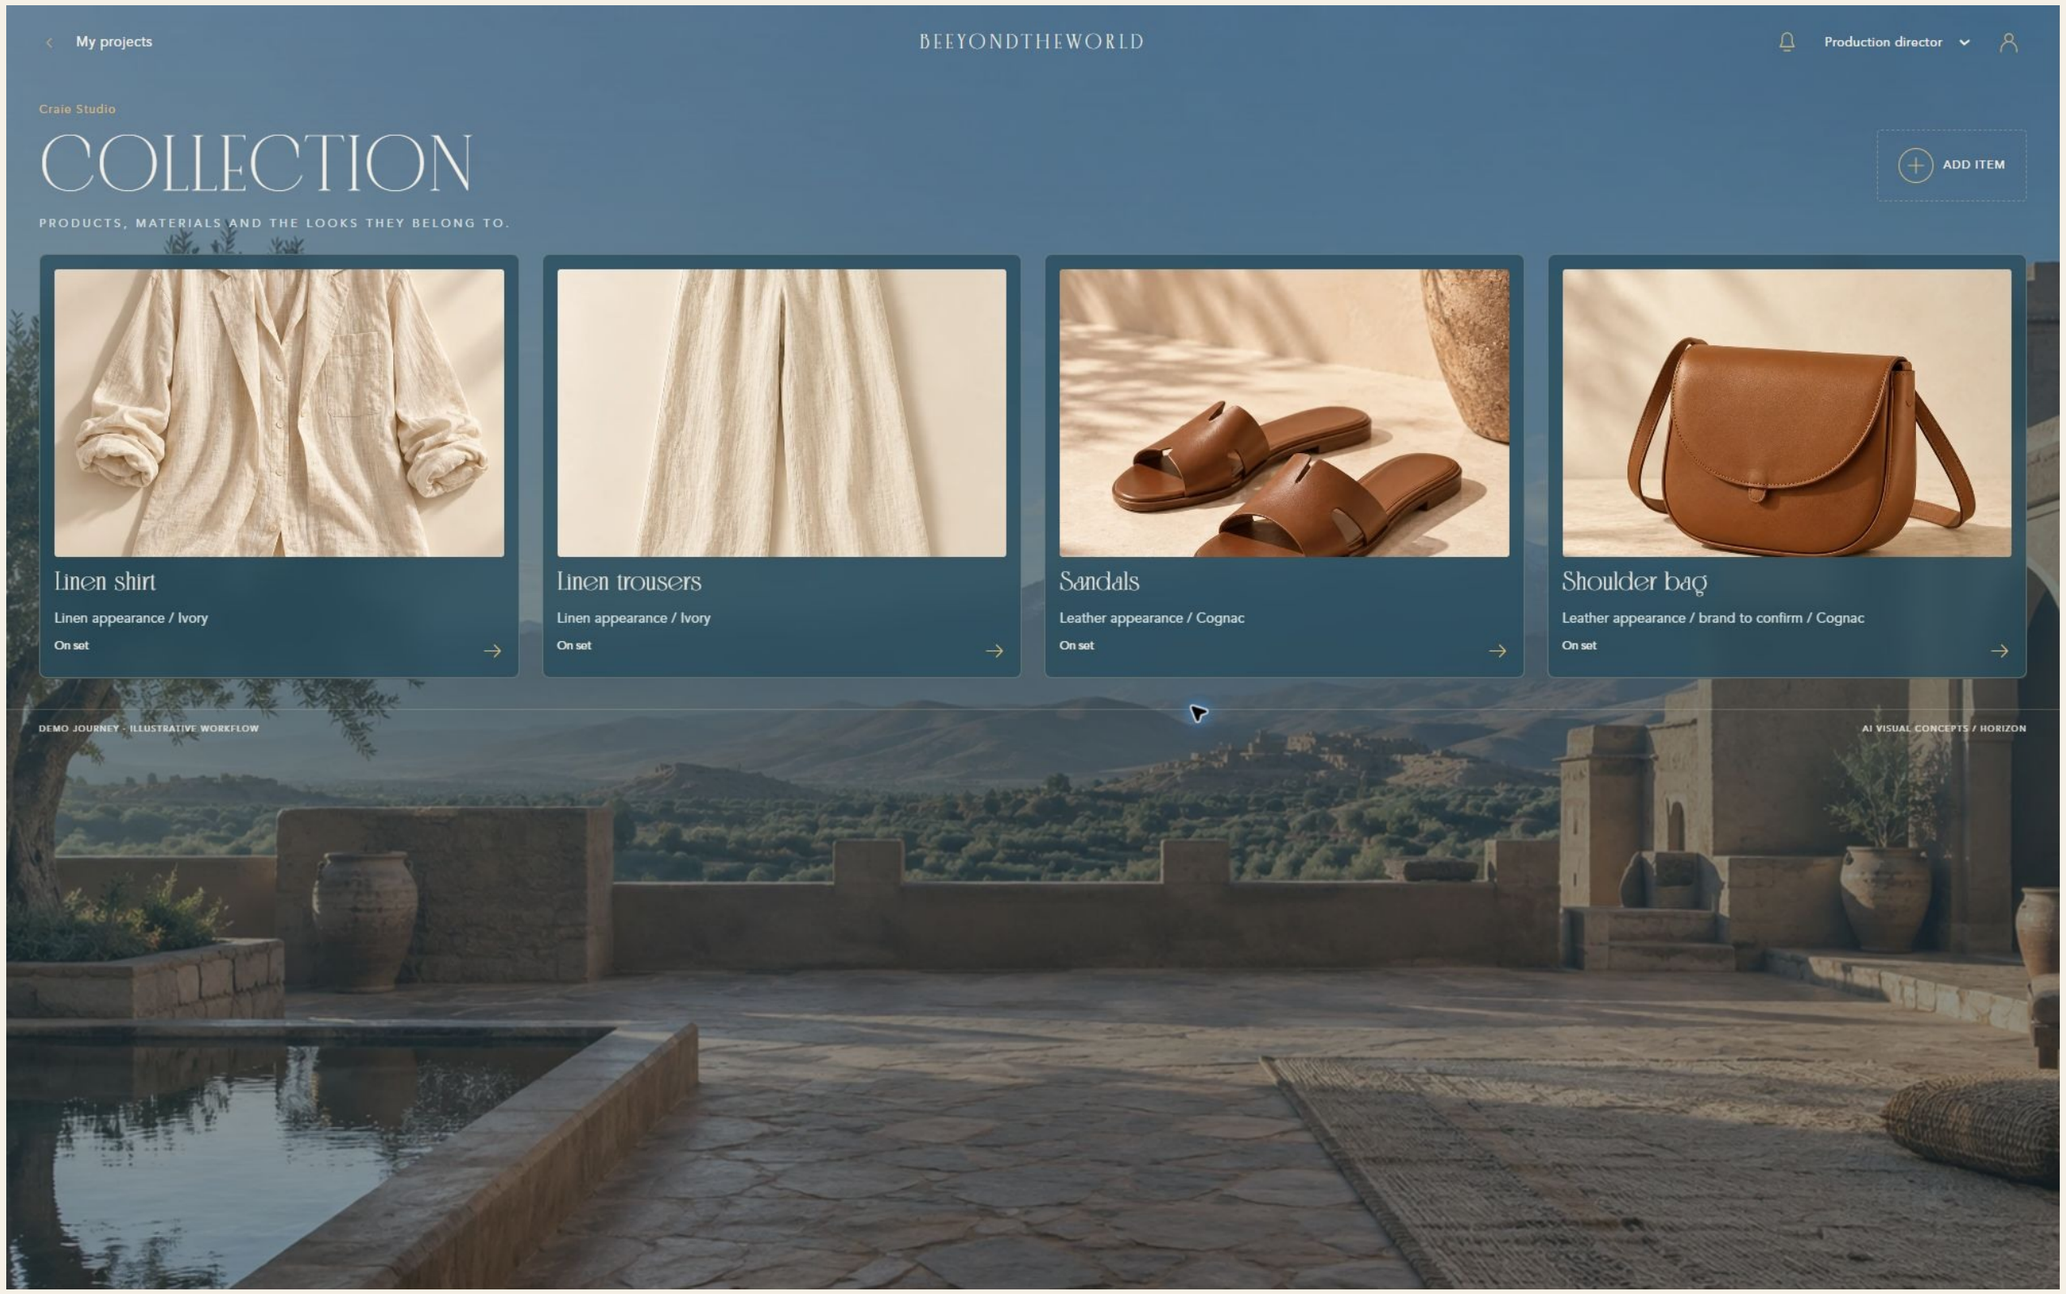

À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Lire les informations utiles à sa mission et vérifier la version. Transmettre une question au responsable de cette étape si un élément manque.

CE QUI PASSE À LA SUITE

Bee examine la création avant la marque ; Bee décide du budget. Direction artistique et production vers Bee.

03 / CRÉATION ET CONSTITUTION DE L'ÉQUIPE • 24-30 OCTOBRE

Fiche produit

Consulter

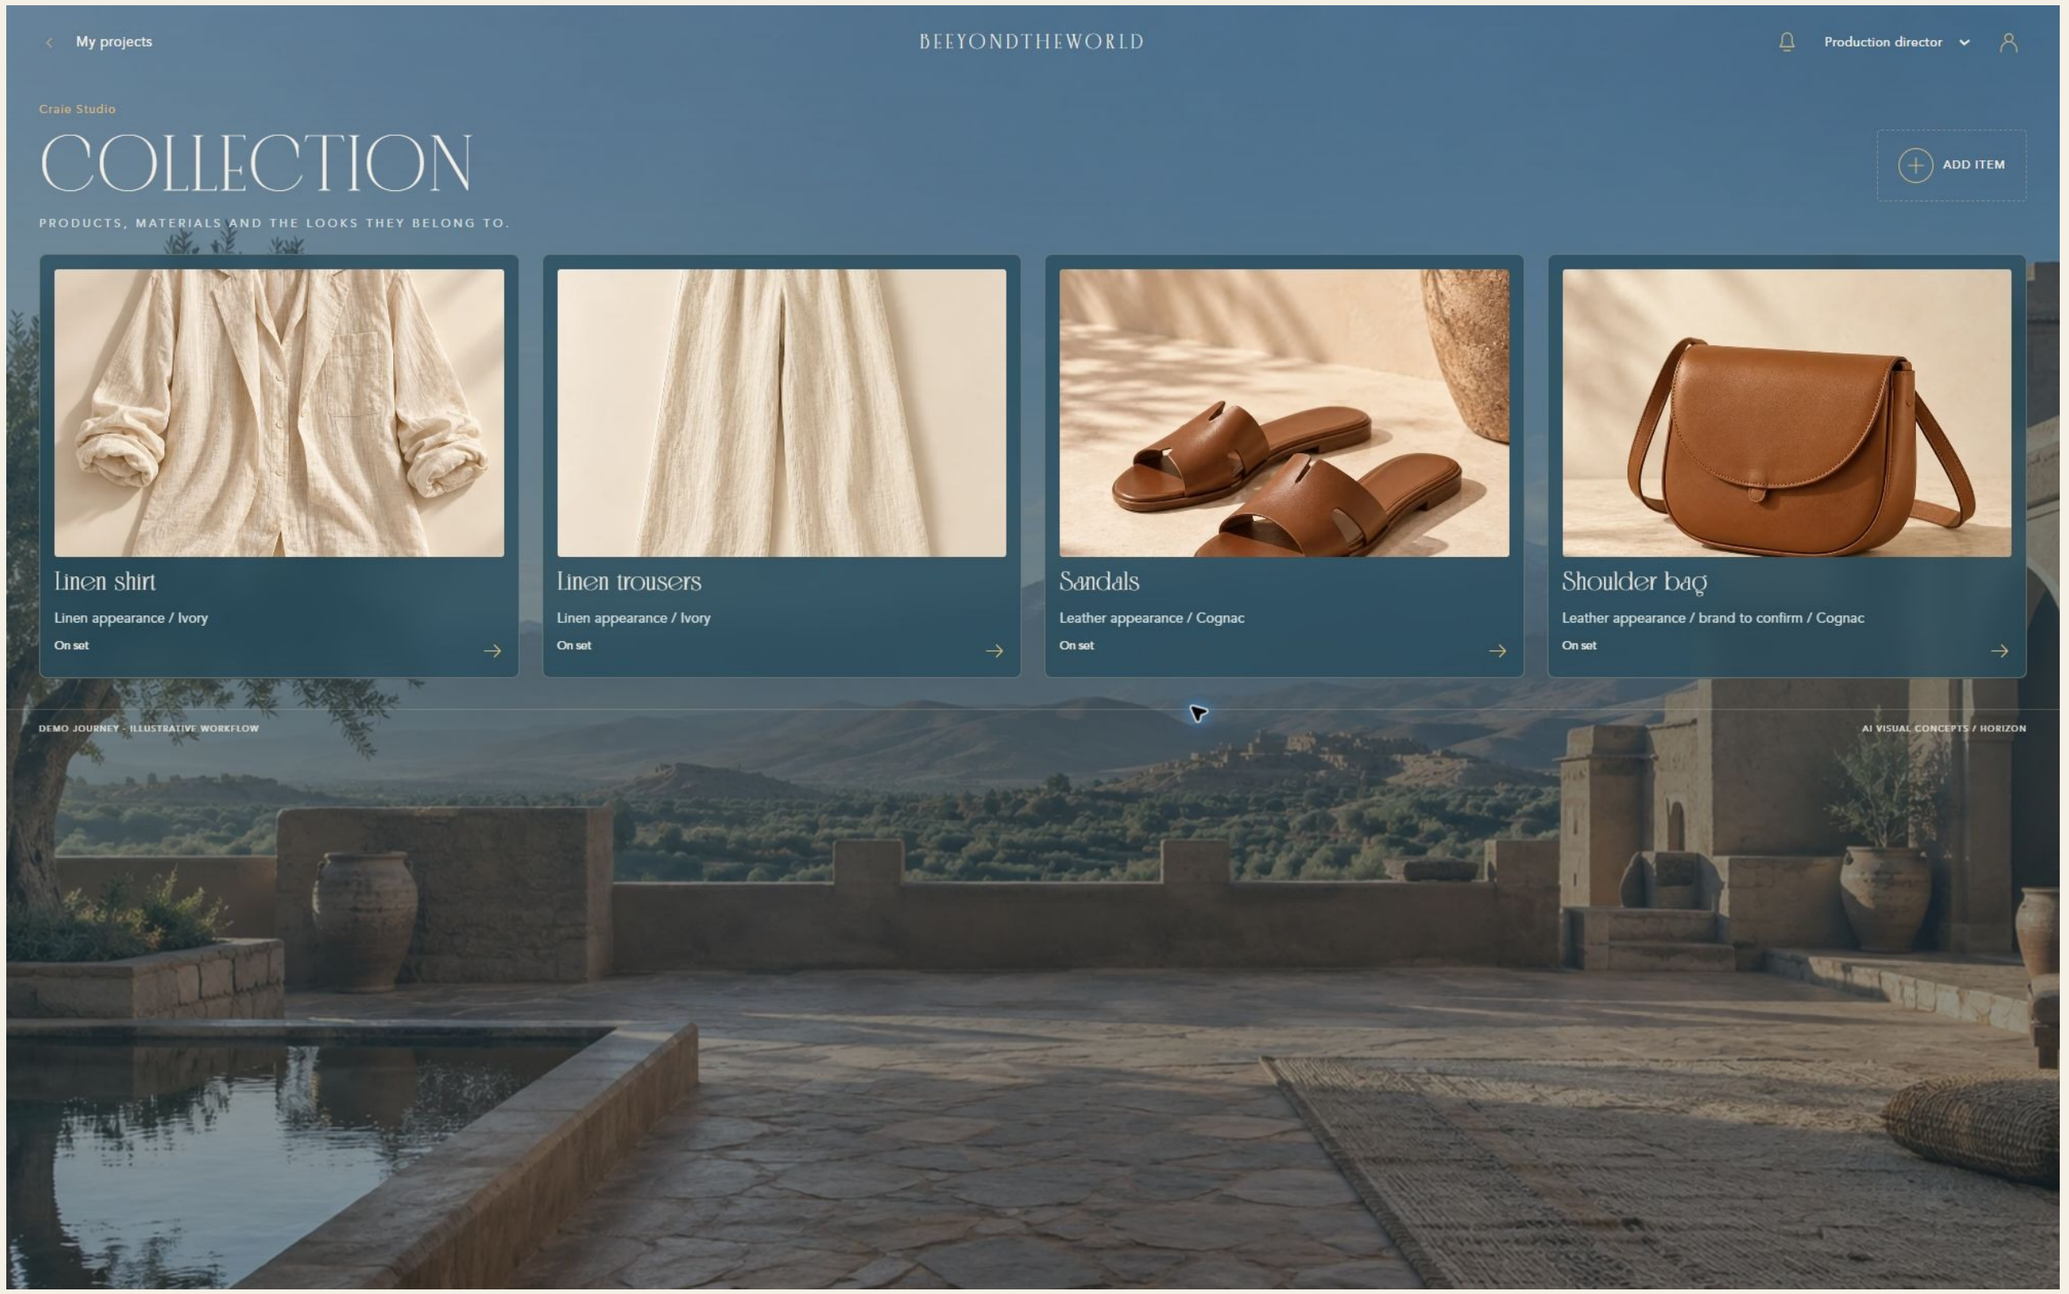

À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Lire les informations utiles à sa mission et vérifier la version. Transmettre une question au responsable de cette étape si un élément manque.

CE QUI PASSE À LA SUITE

Bee examine la création avant la marque ; Bee décide du budget. Direction artistique et production vers Bee.

03 / CRÉATION ET CONSTITUTION DE L'ÉQUIPE • 24-30 OCTOBRE

Envois et retours produits

Préparer / compléter

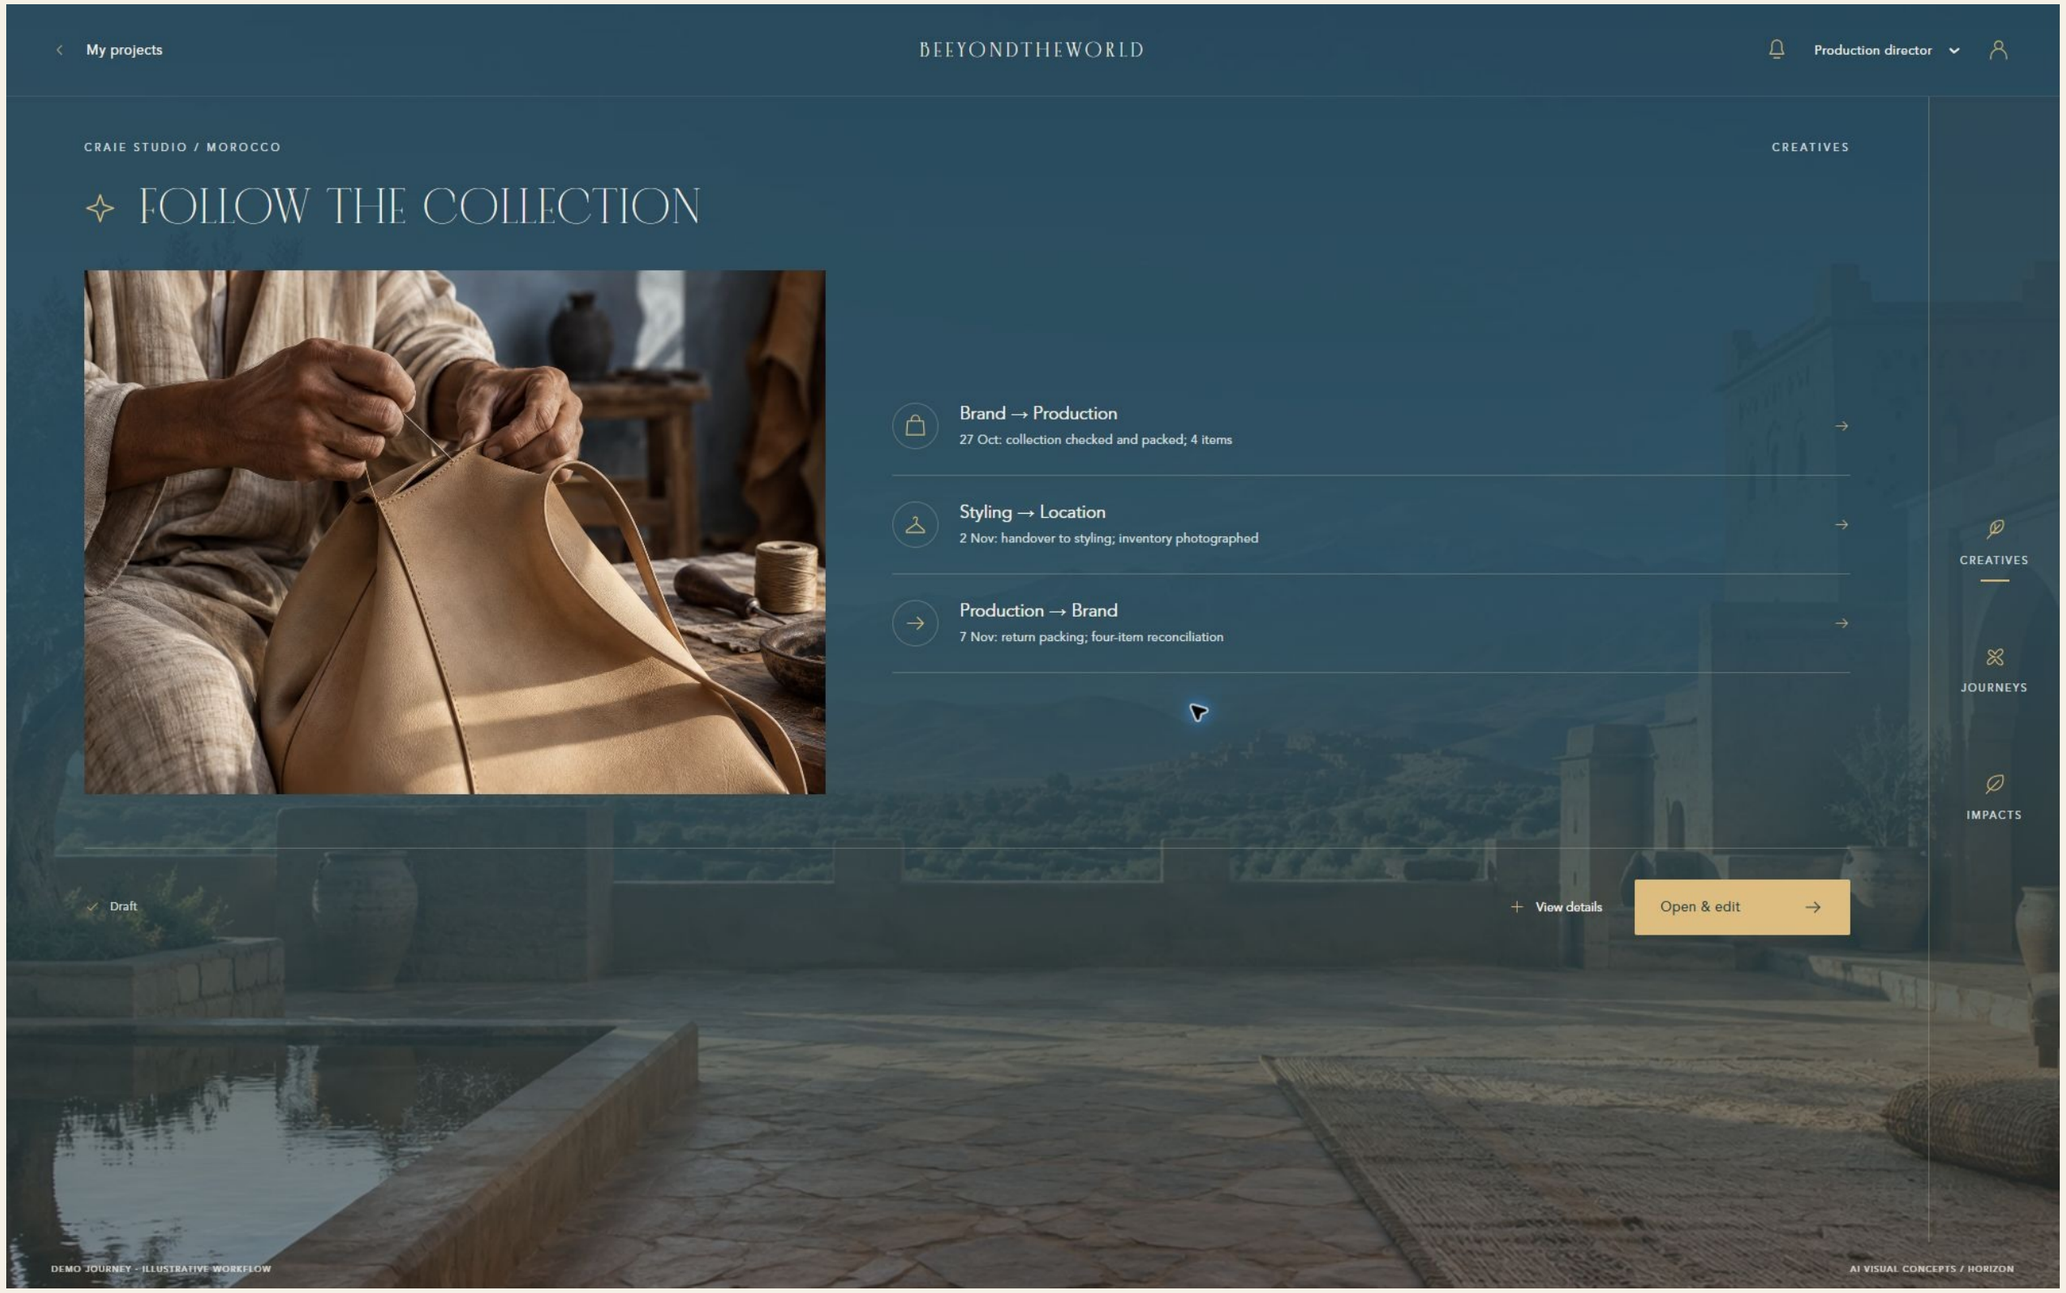

À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Préparer les informations et références affichées, vérifier leur cohérence avec le brief puis transmettre au responsable de l'étape.

CE QUI PASSE À LA SUITE

Bee examine la création avant la marque ; Bee décide du budget. Direction artistique et production vers Bee.

03 / CRÉATION ET CONSTITUTION DE L'ÉQUIPE • 24-30 OCTOBRE

Équipe et affectations

Préparer / compléter

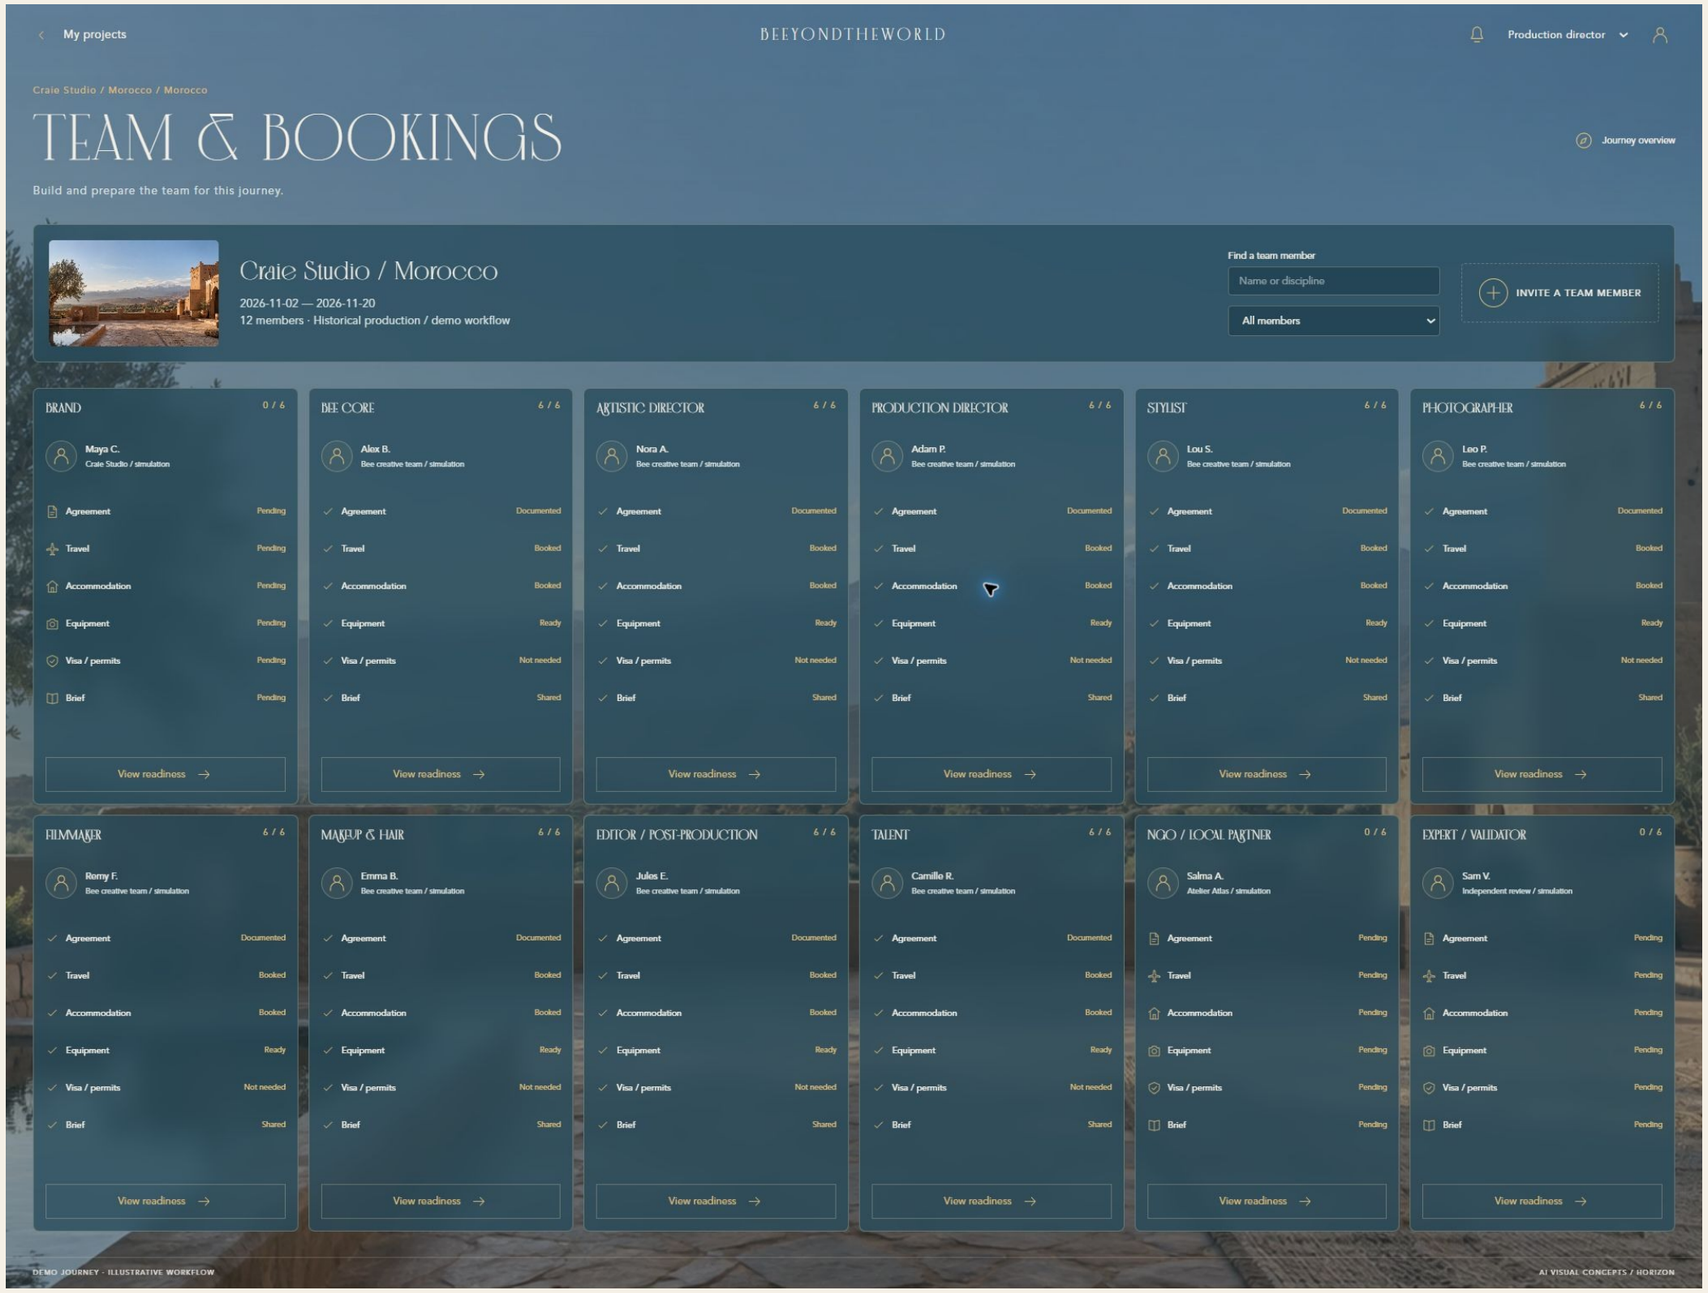

À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Préparer les informations et références affichées, vérifier leur cohérence avec le brief puis transmettre au responsable de l'étape.

CE QUI PASSE À LA SUITE

Bee examine la création avant la marque ; Bee décide du budget. Direction artistique et production vers Bee.

03 / CRÉATION ET CONSTITUTION DE L'ÉQUIPE • 24-30 OCTOBRE

Ajouter un membre

Préparer / compléter

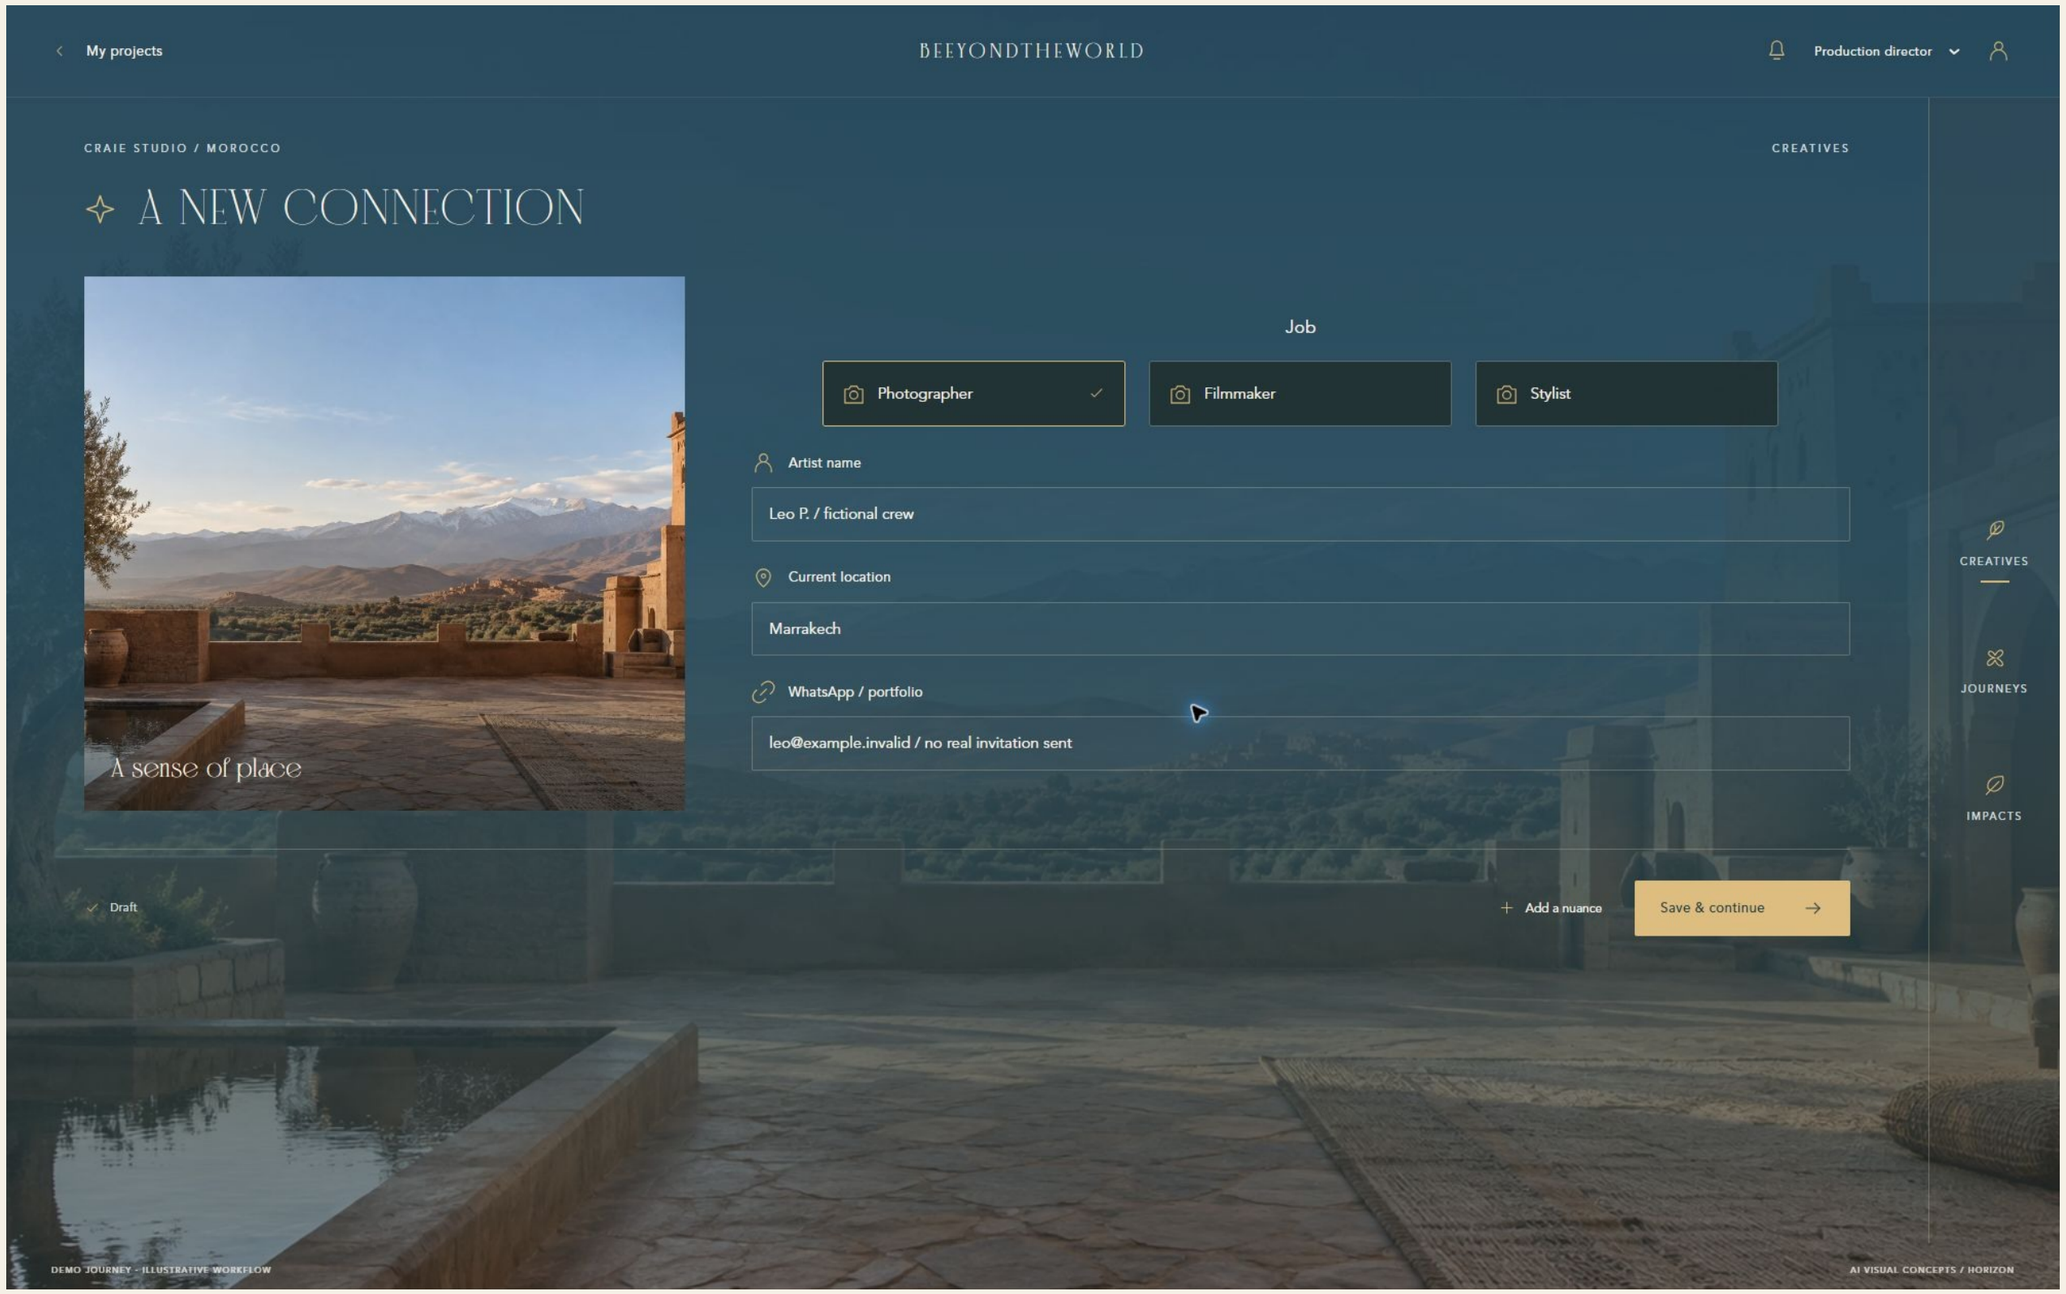

À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Préparer les informations et références affichées, vérifier leur cohérence avec le brief puis transmettre au responsable de l'étape.

CE QUI PASSE À LA SUITE

Bee examine la création avant la marque ; Bee décide du budget. Direction artistique et production vers Bee.

03 / CRÉATION ET CONSTITUTION DE L'ÉQUIPE • 24-30 OCTOBRE

Contrats et charte

Préparer / compléter

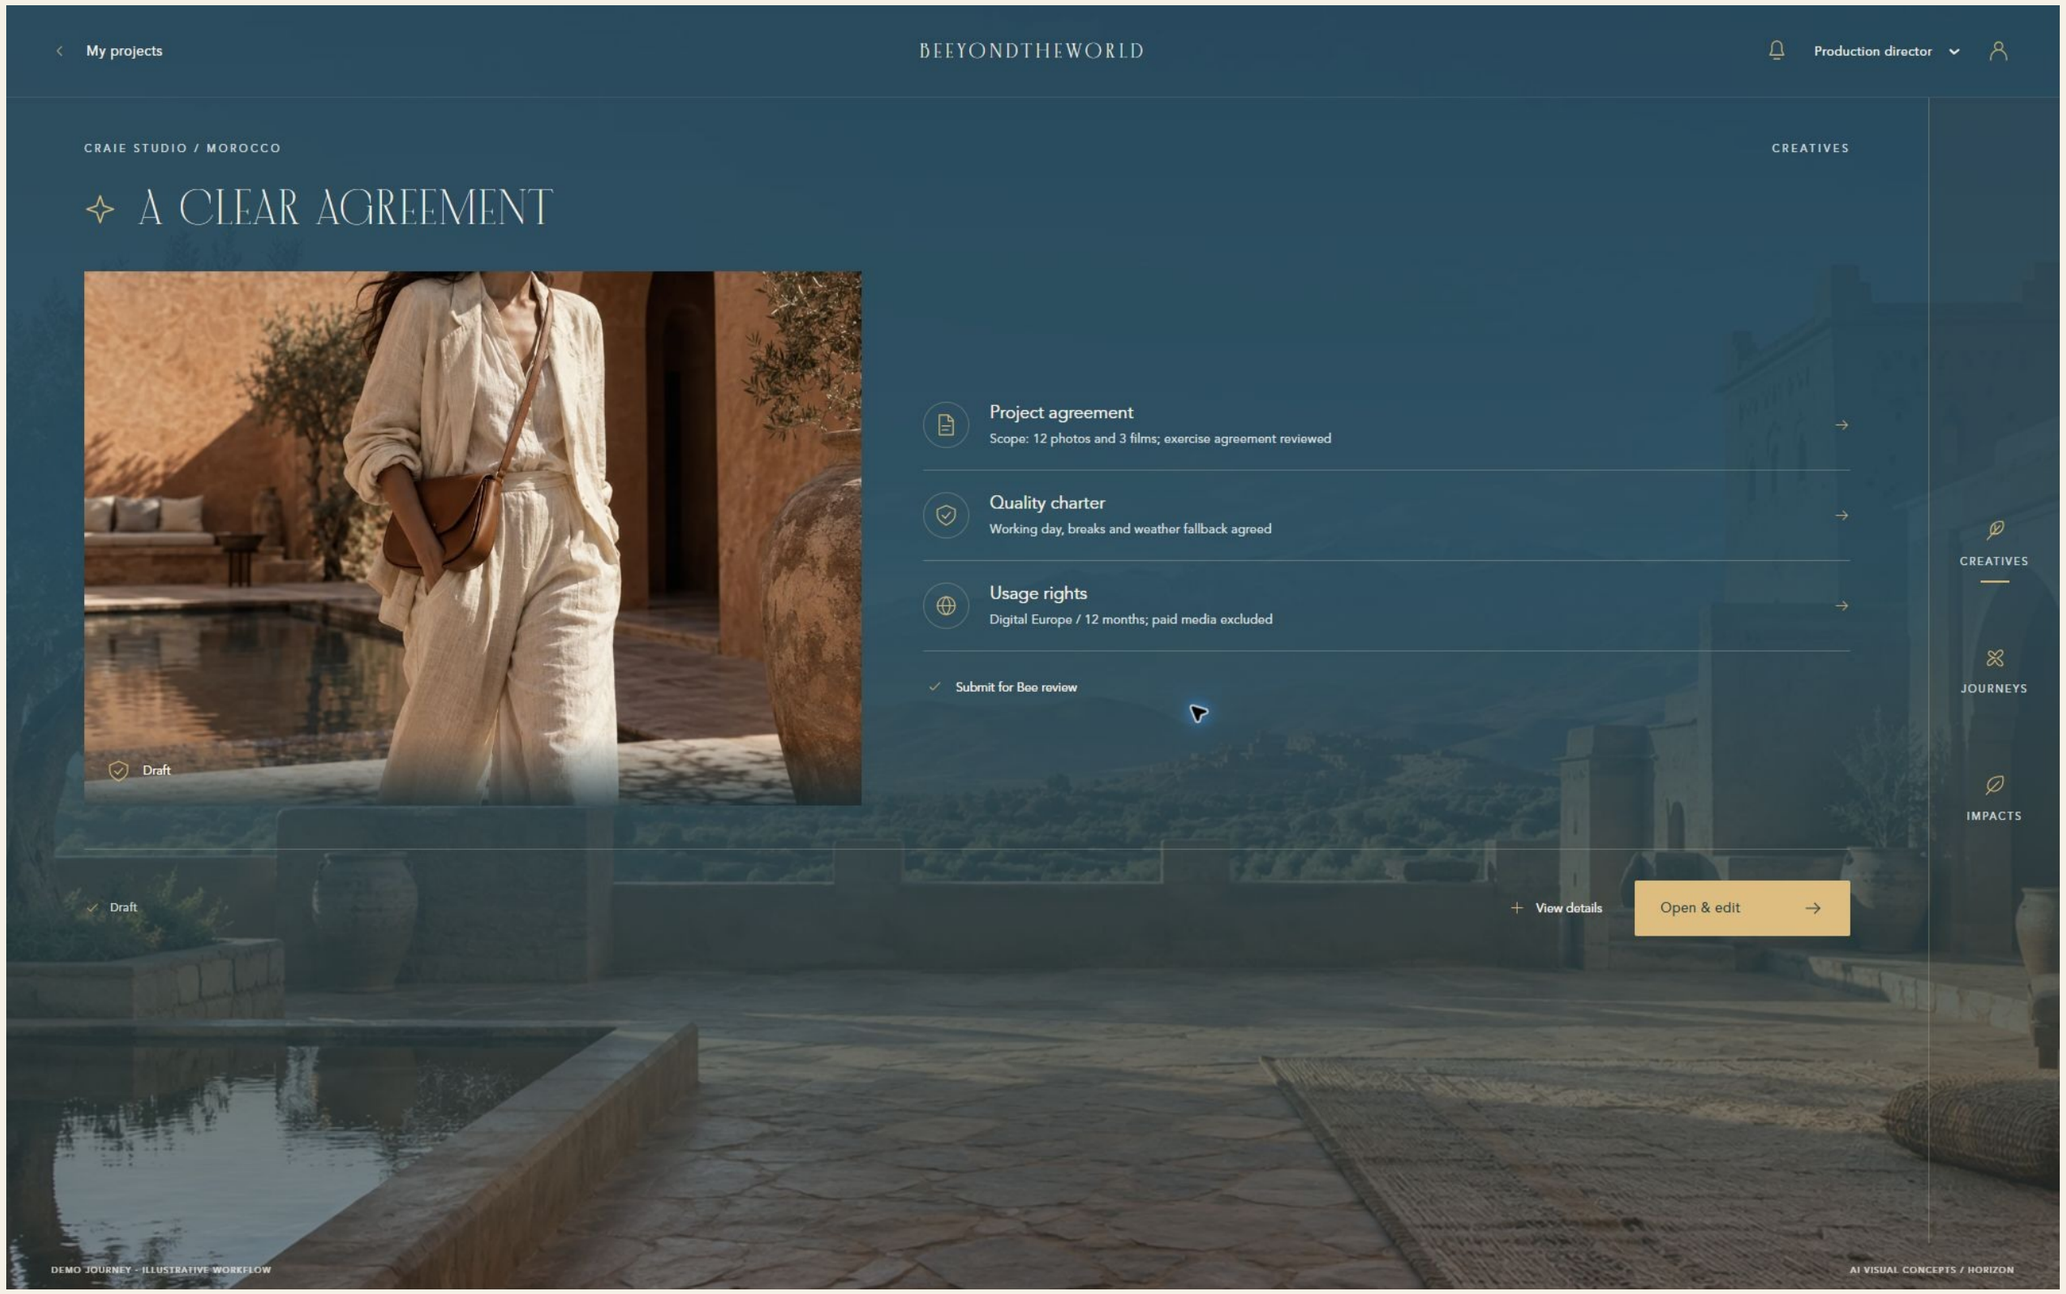

À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Préparer les informations et références affichées, vérifier leur cohérence avec le brief puis transmettre au responsable de l'étape.

CE QUI PASSE À LA SUITE

Bee examine la création avant la marque ; Bee décide du budget. Direction artistique et production vers Bee.

03 / CRÉATION ET CONSTITUTION DE L'ÉQUIPE • 24-30 OCTOBRE

Budget et répartition

Préparer / compléter

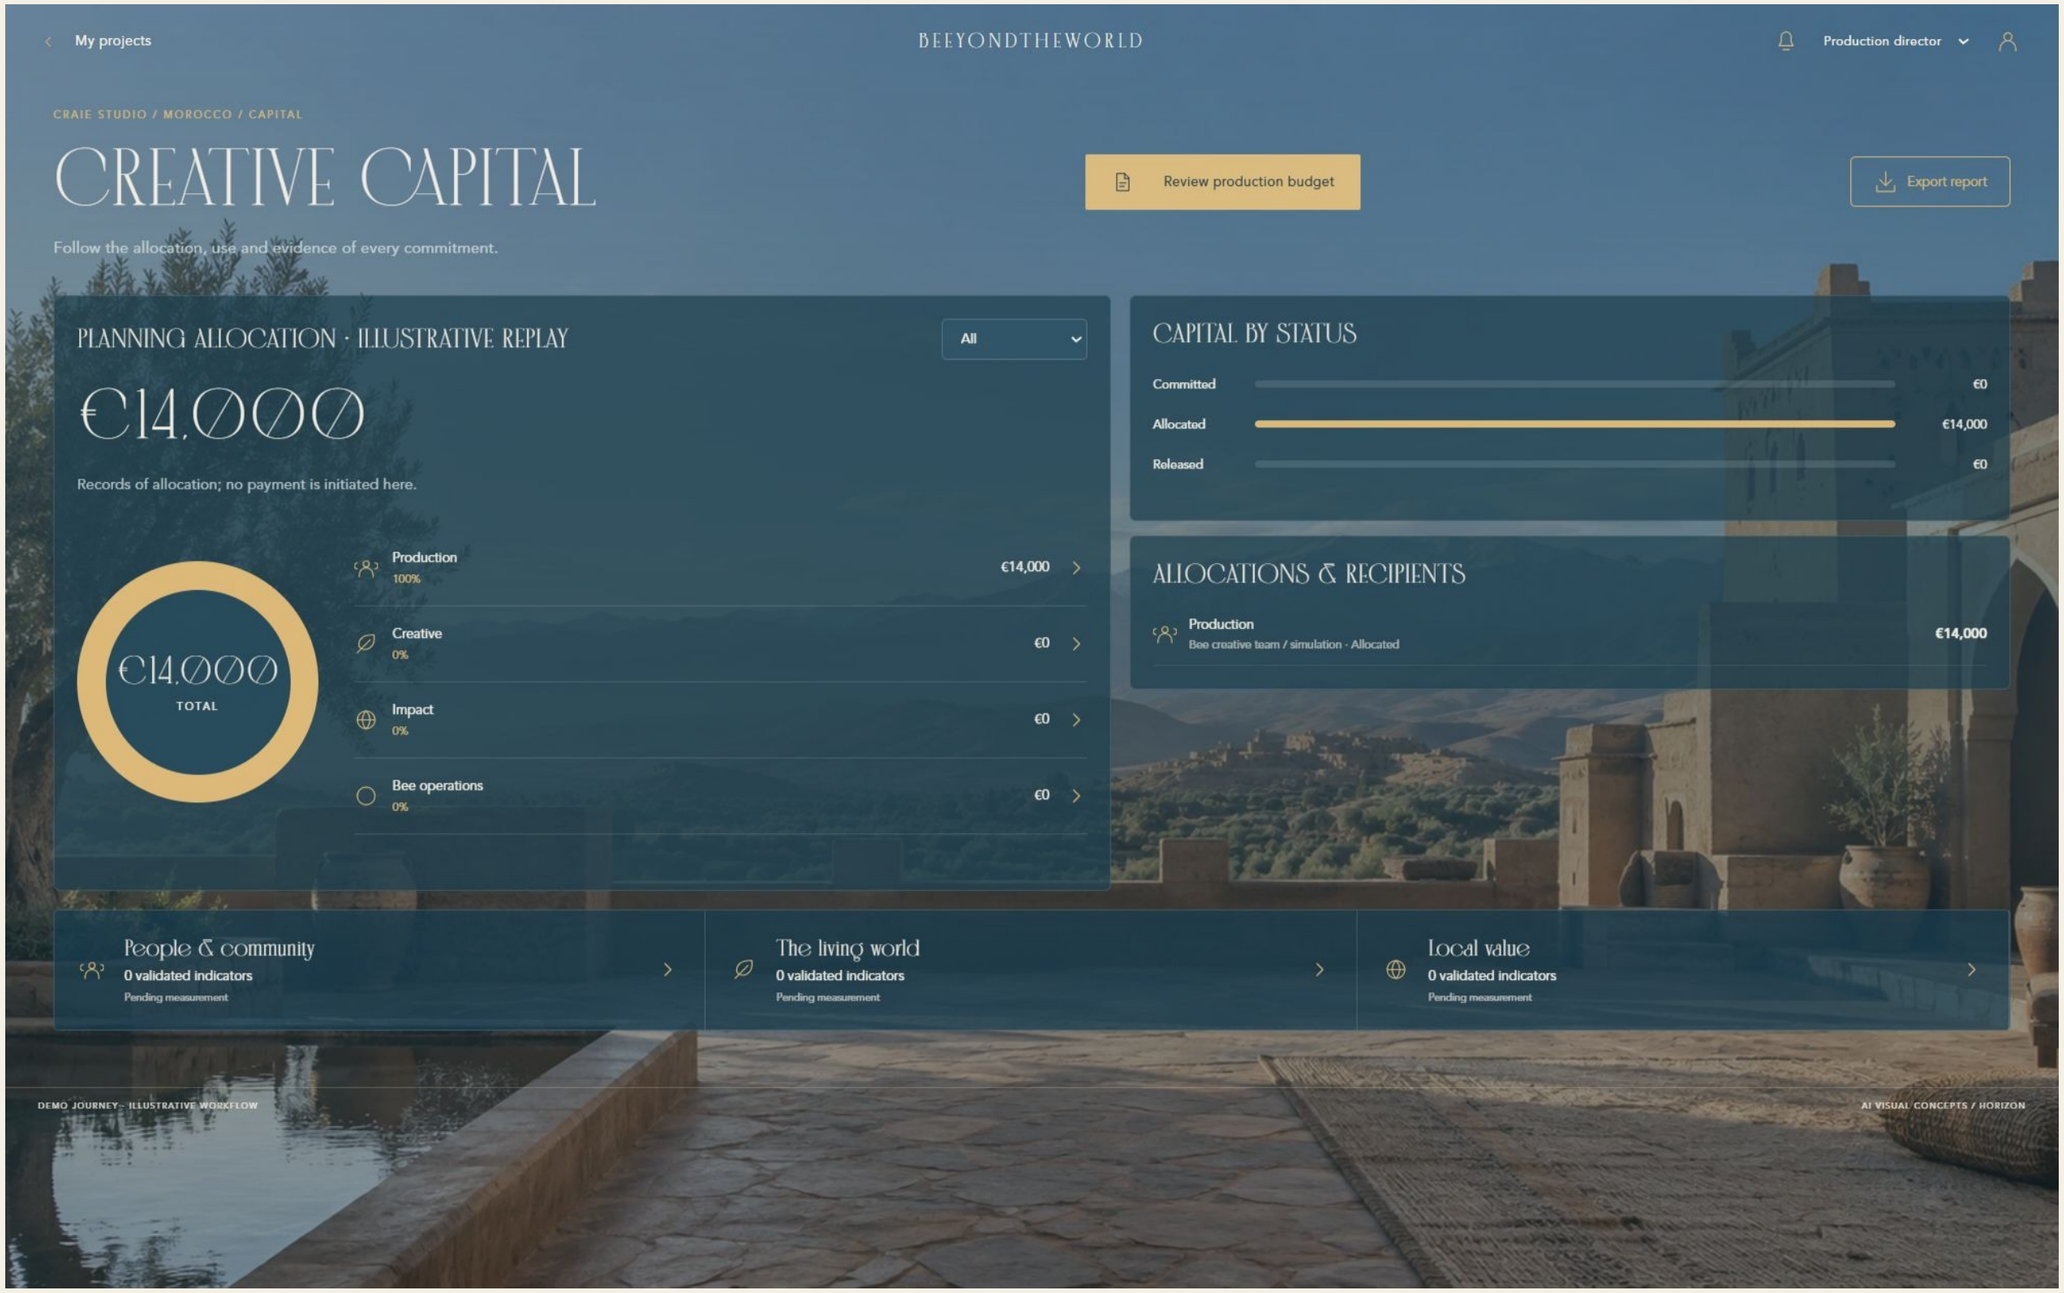

À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Comparer les enveloppes : création 12 000 EUR, production 14 000 EUR, Bee 6 000 EUR et action locale 2 500 EUR. Bee garde l'arbitrage budgétaire.

CE QUI PASSE À LA SUITE

Bee examine la création avant la marque ; Bee décide du budget. Direction artistique et production vers Bee.

04 / SCOUTING : DE BEE À FLOWER • 2 NOVEMBRE

Repérages : vue d’ensemble

Préparer / compléter

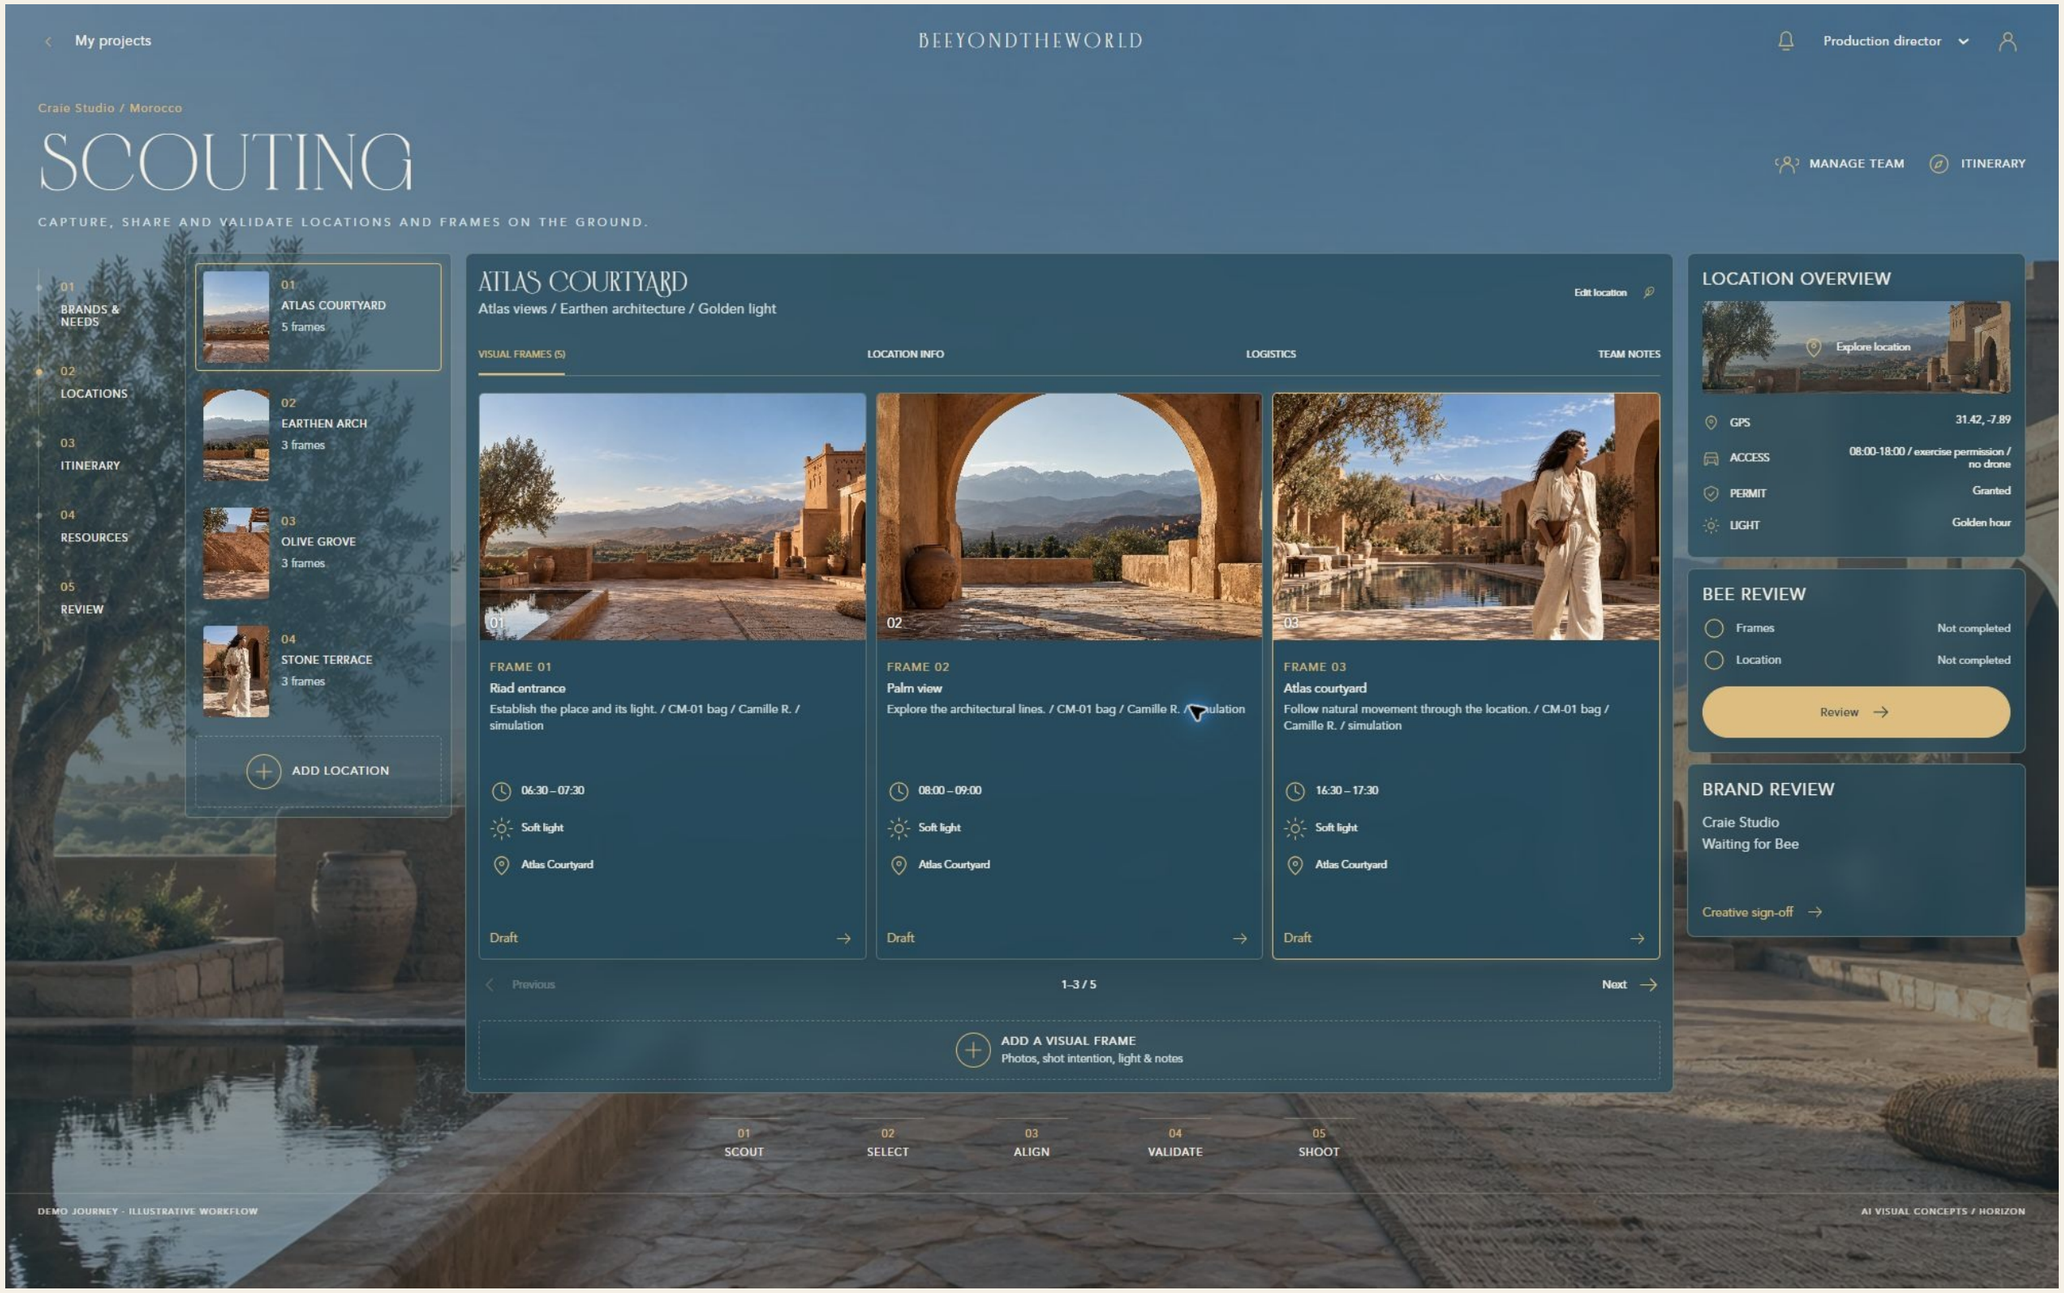

À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Comparer les quatre lieux et préparer les cadres qui seront réellement exécutables. Le scouting relie la proposition Bee à la préparation Flower.

CE QUI PASSE À LA SUITE

Les cadres et looks retenus passent par Bee puis par la marque. Production, DA, photo et film.

04 / SCOUTING : DE BEE À FLOWER • 2 NOVEMBRE

Fiche lieu

Préparer / compléter

À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Lire la vue principale, parcourir les frames, puis consulter les notes et fichiers du lieu. Une sélection de lieu ne remplace pas son autorisation d'accès.

CE QUI PASSE À LA SUITE

Les cadres et looks retenus passent par Bee puis par la marque. Production, DA, photo et film.

04 / SCOUTING : DE BEE À FLOWER • 2 NOVEMBRE

Ajouter un lieu

Préparer / compléter

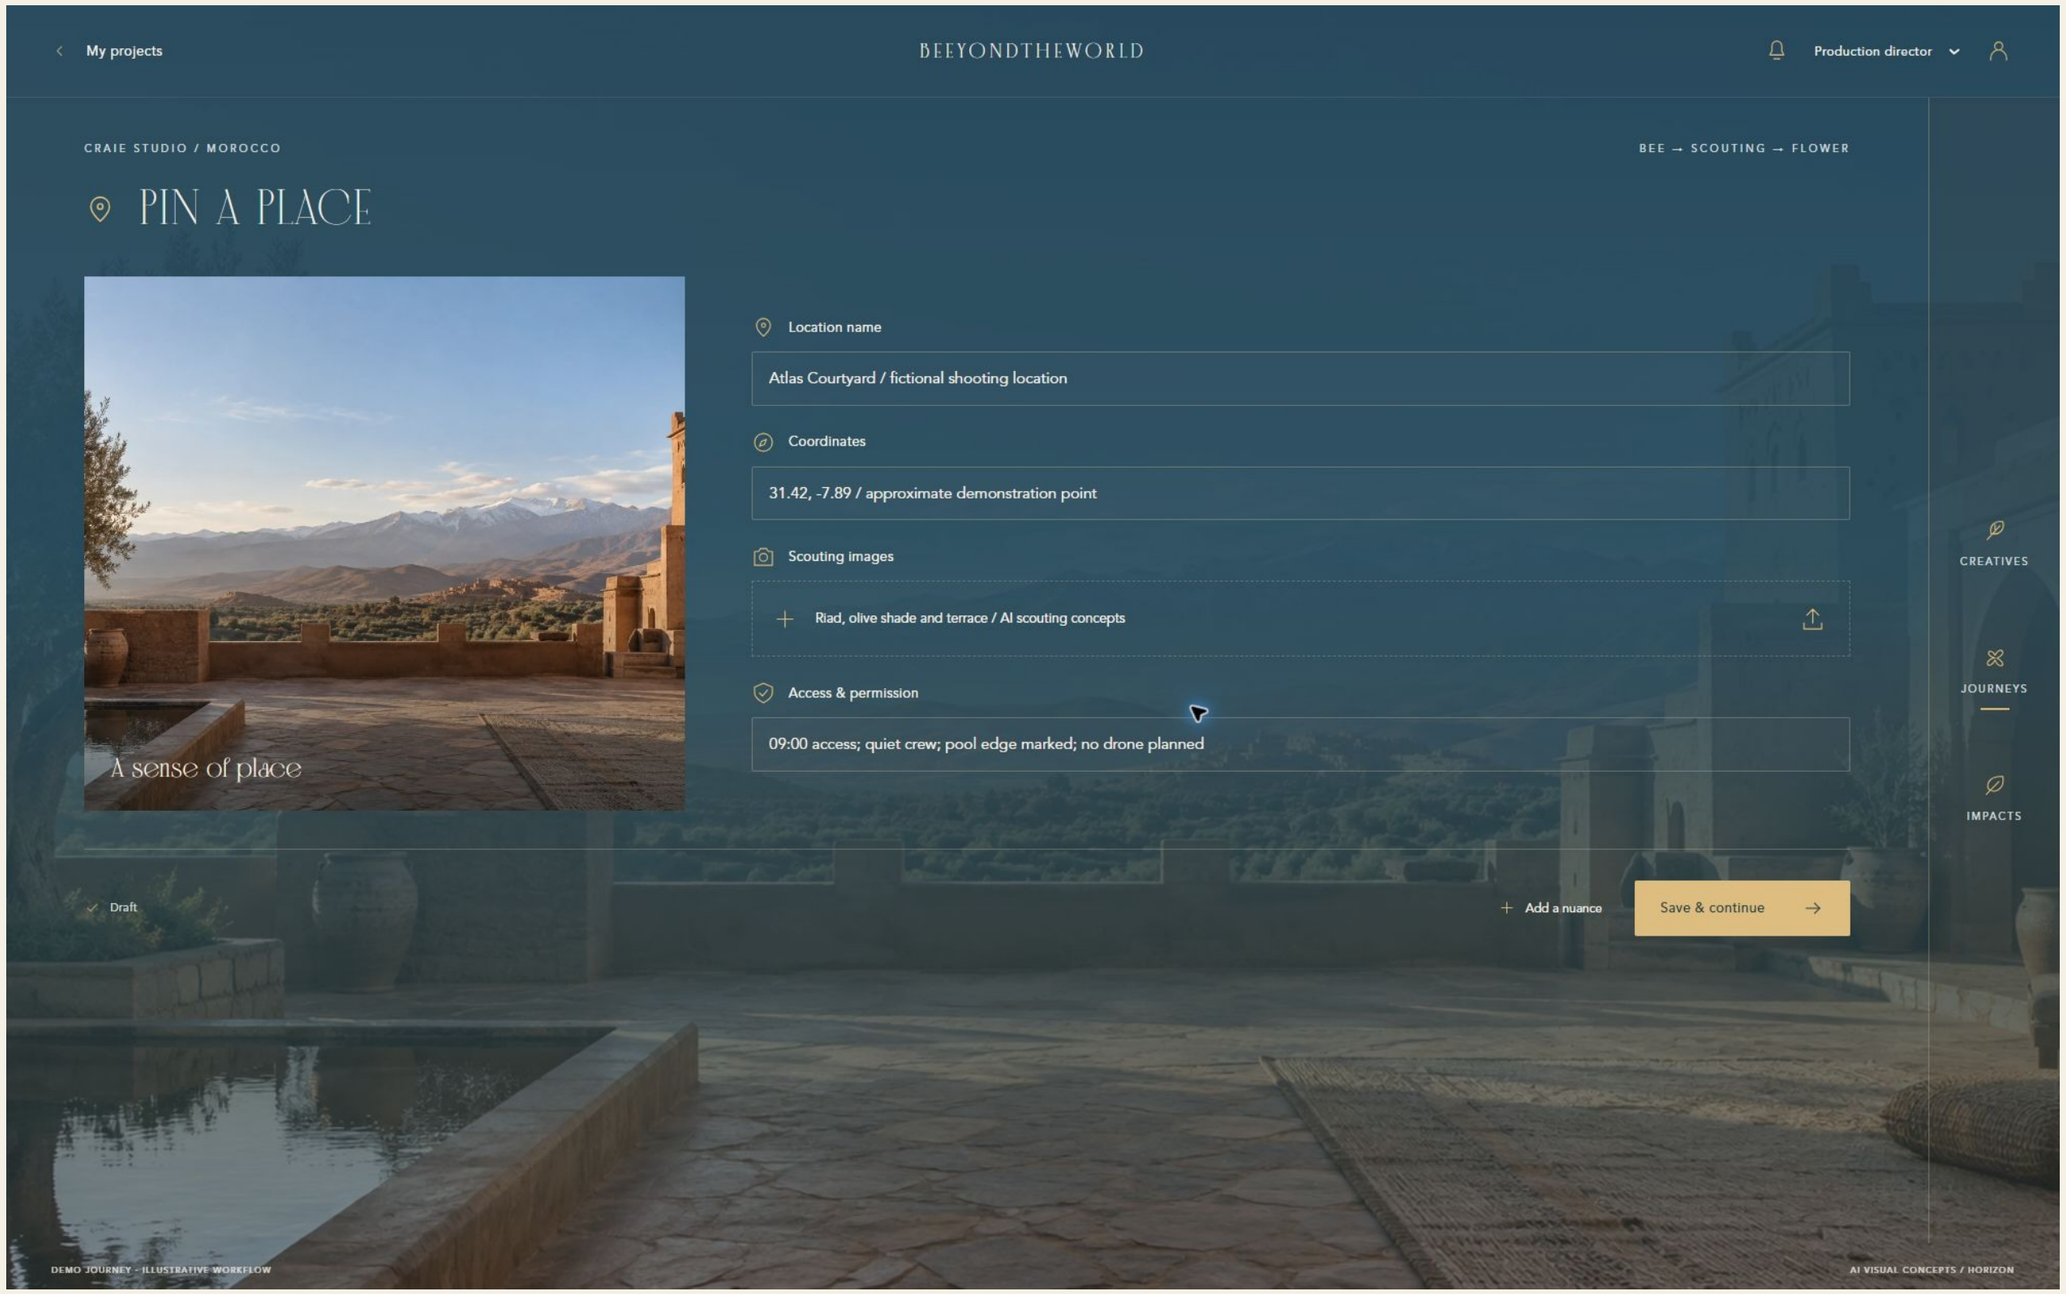

À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Préparer les informations et références affichées, vérifier leur cohérence avec le brief puis transmettre au responsable de l'étape.

CE QUI PASSE À LA SUITE

Les cadres et looks retenus passent par Bee puis par la marque. Production, DA, photo et film.

04 / SCOUTING : DE BEE À FLOWER • 2 NOVEMBRE

Frame : angle et lumière

Préparer / compléter

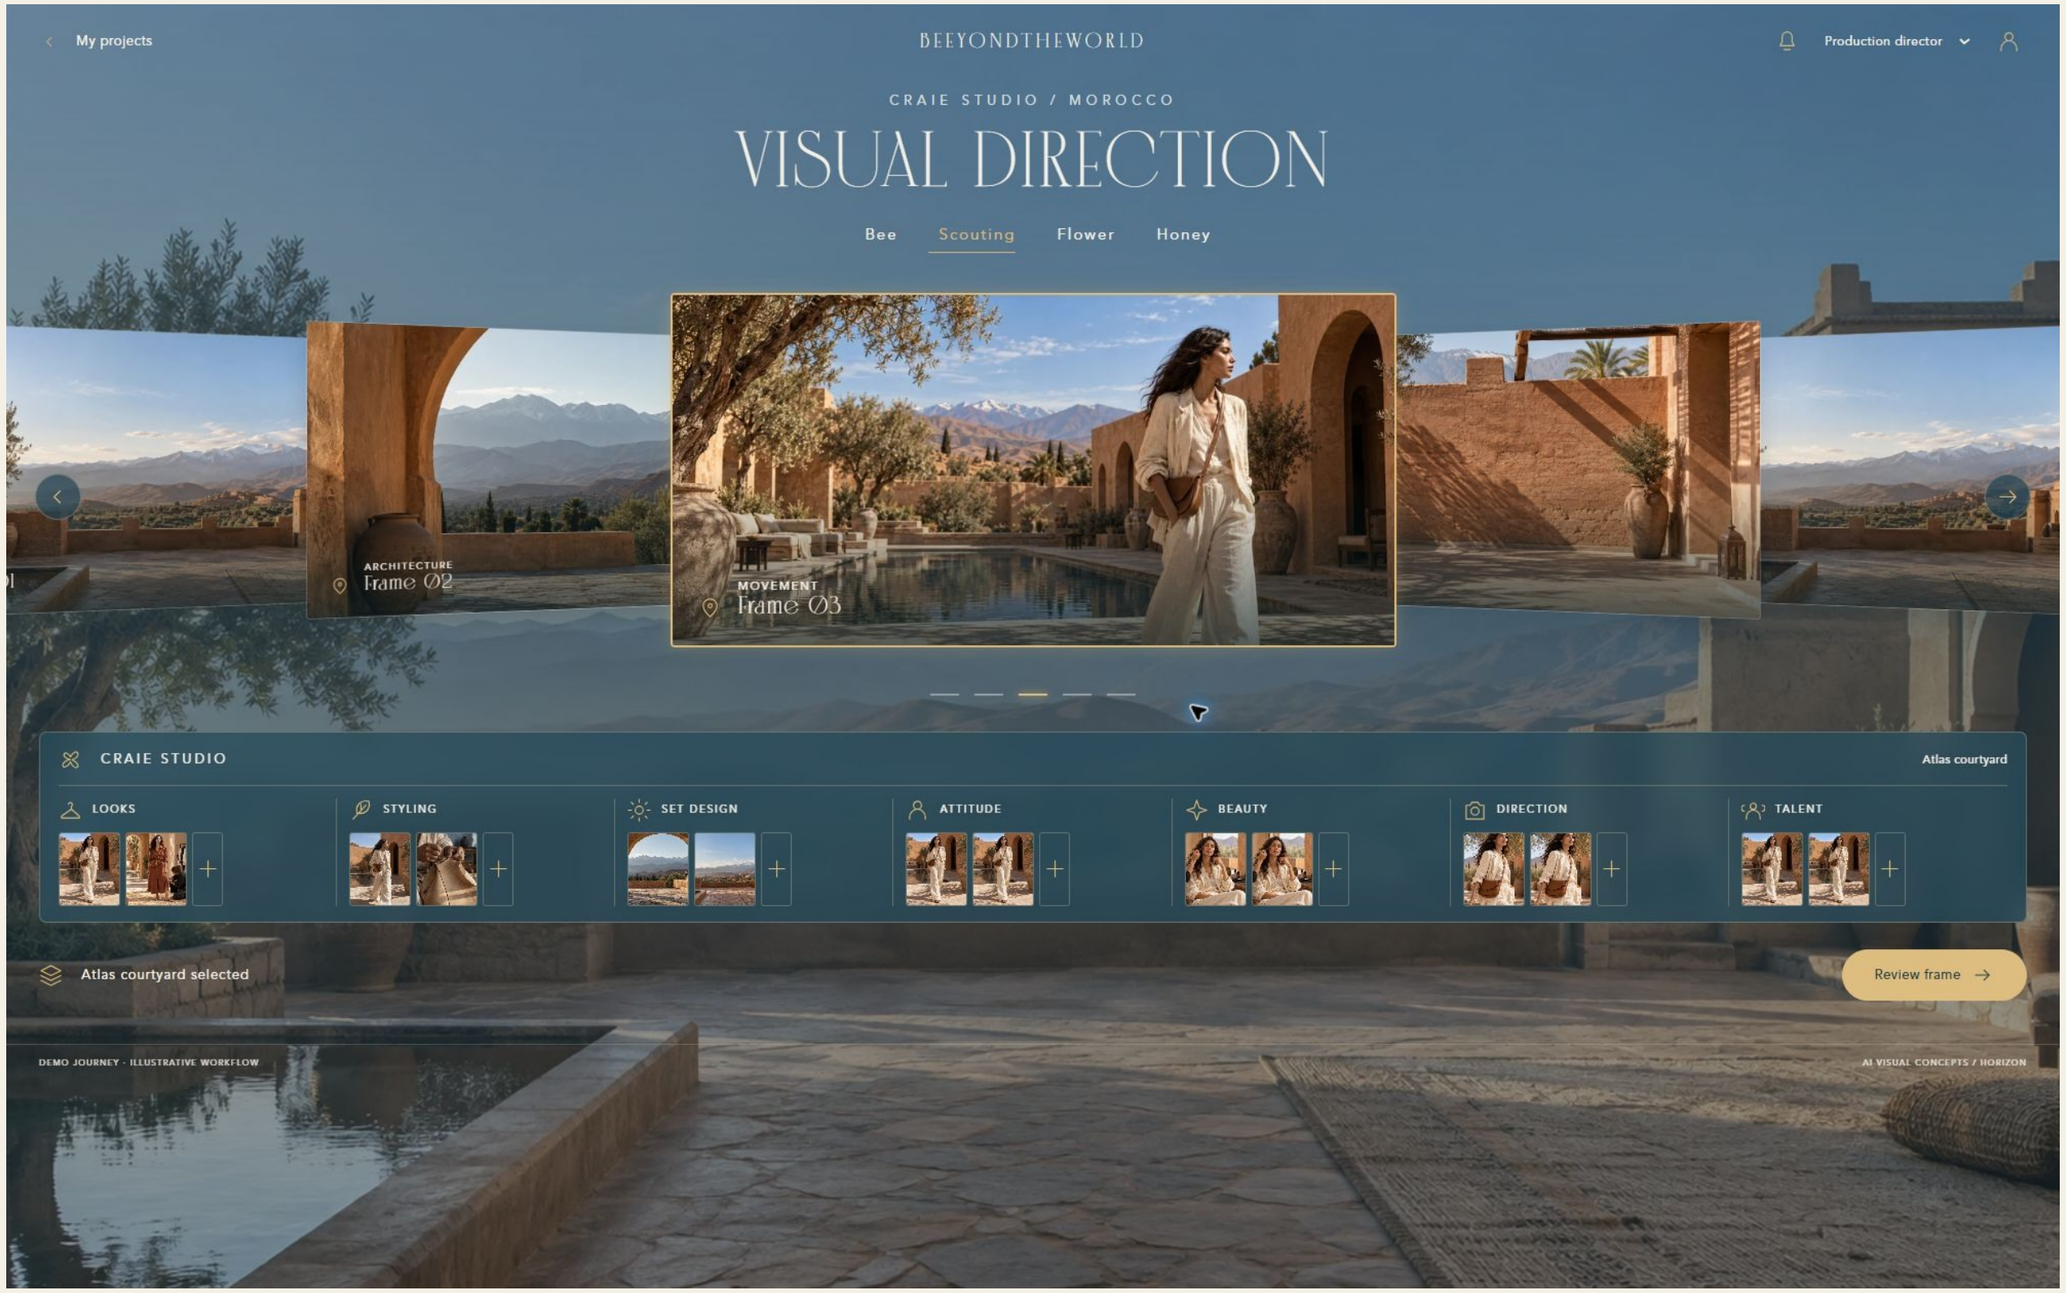

À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Parcourir les cadres avec les flèches, choisir la vue centrale, puis ouvrir ses références. Les sept disciplines restent liées au même cadre.

CE QUI PASSE À LA SUITE

Les cadres et looks retenus passent par Bee puis par la marque. Production, DA, photo et film.

04 / SCOUTING : DE BEE À FLOWER • 2 NOVEMBRE

Allocation créative par frame

Consulter

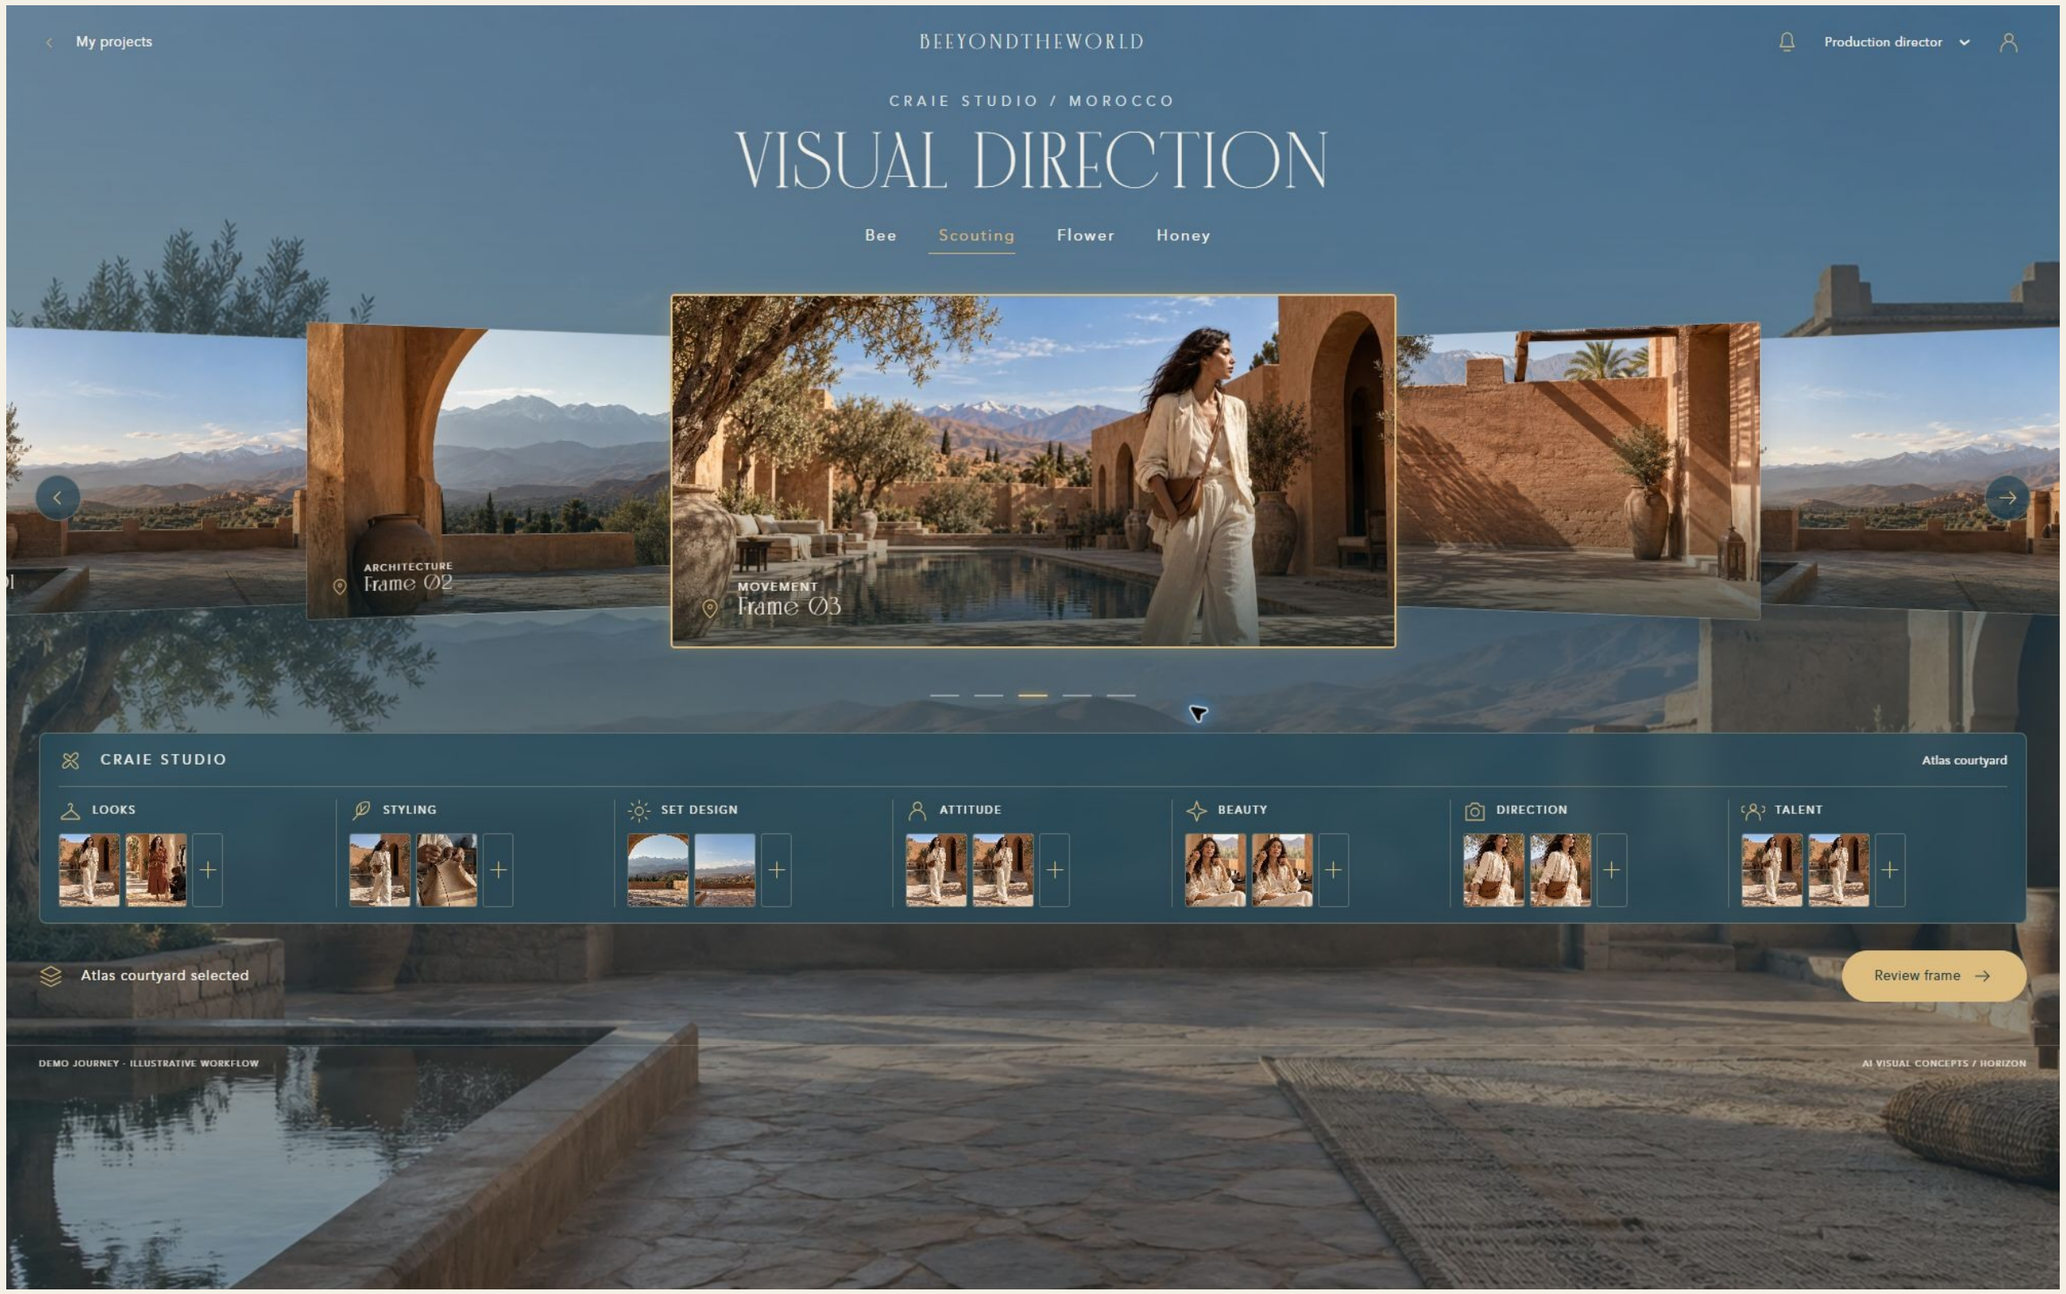

À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Lire les informations utiles à sa mission et vérifier la version. Transmettre une question au responsable de cette étape si un élément manque.

CE QUI PASSE À LA SUITE

Les cadres et looks retenus passent par Bee puis par la marque. Production, DA, photo et film.

04 / SCOUTING : DE BEE À FLOWER • 2 NOVEMBRE

Valider la direction finale

Consulter

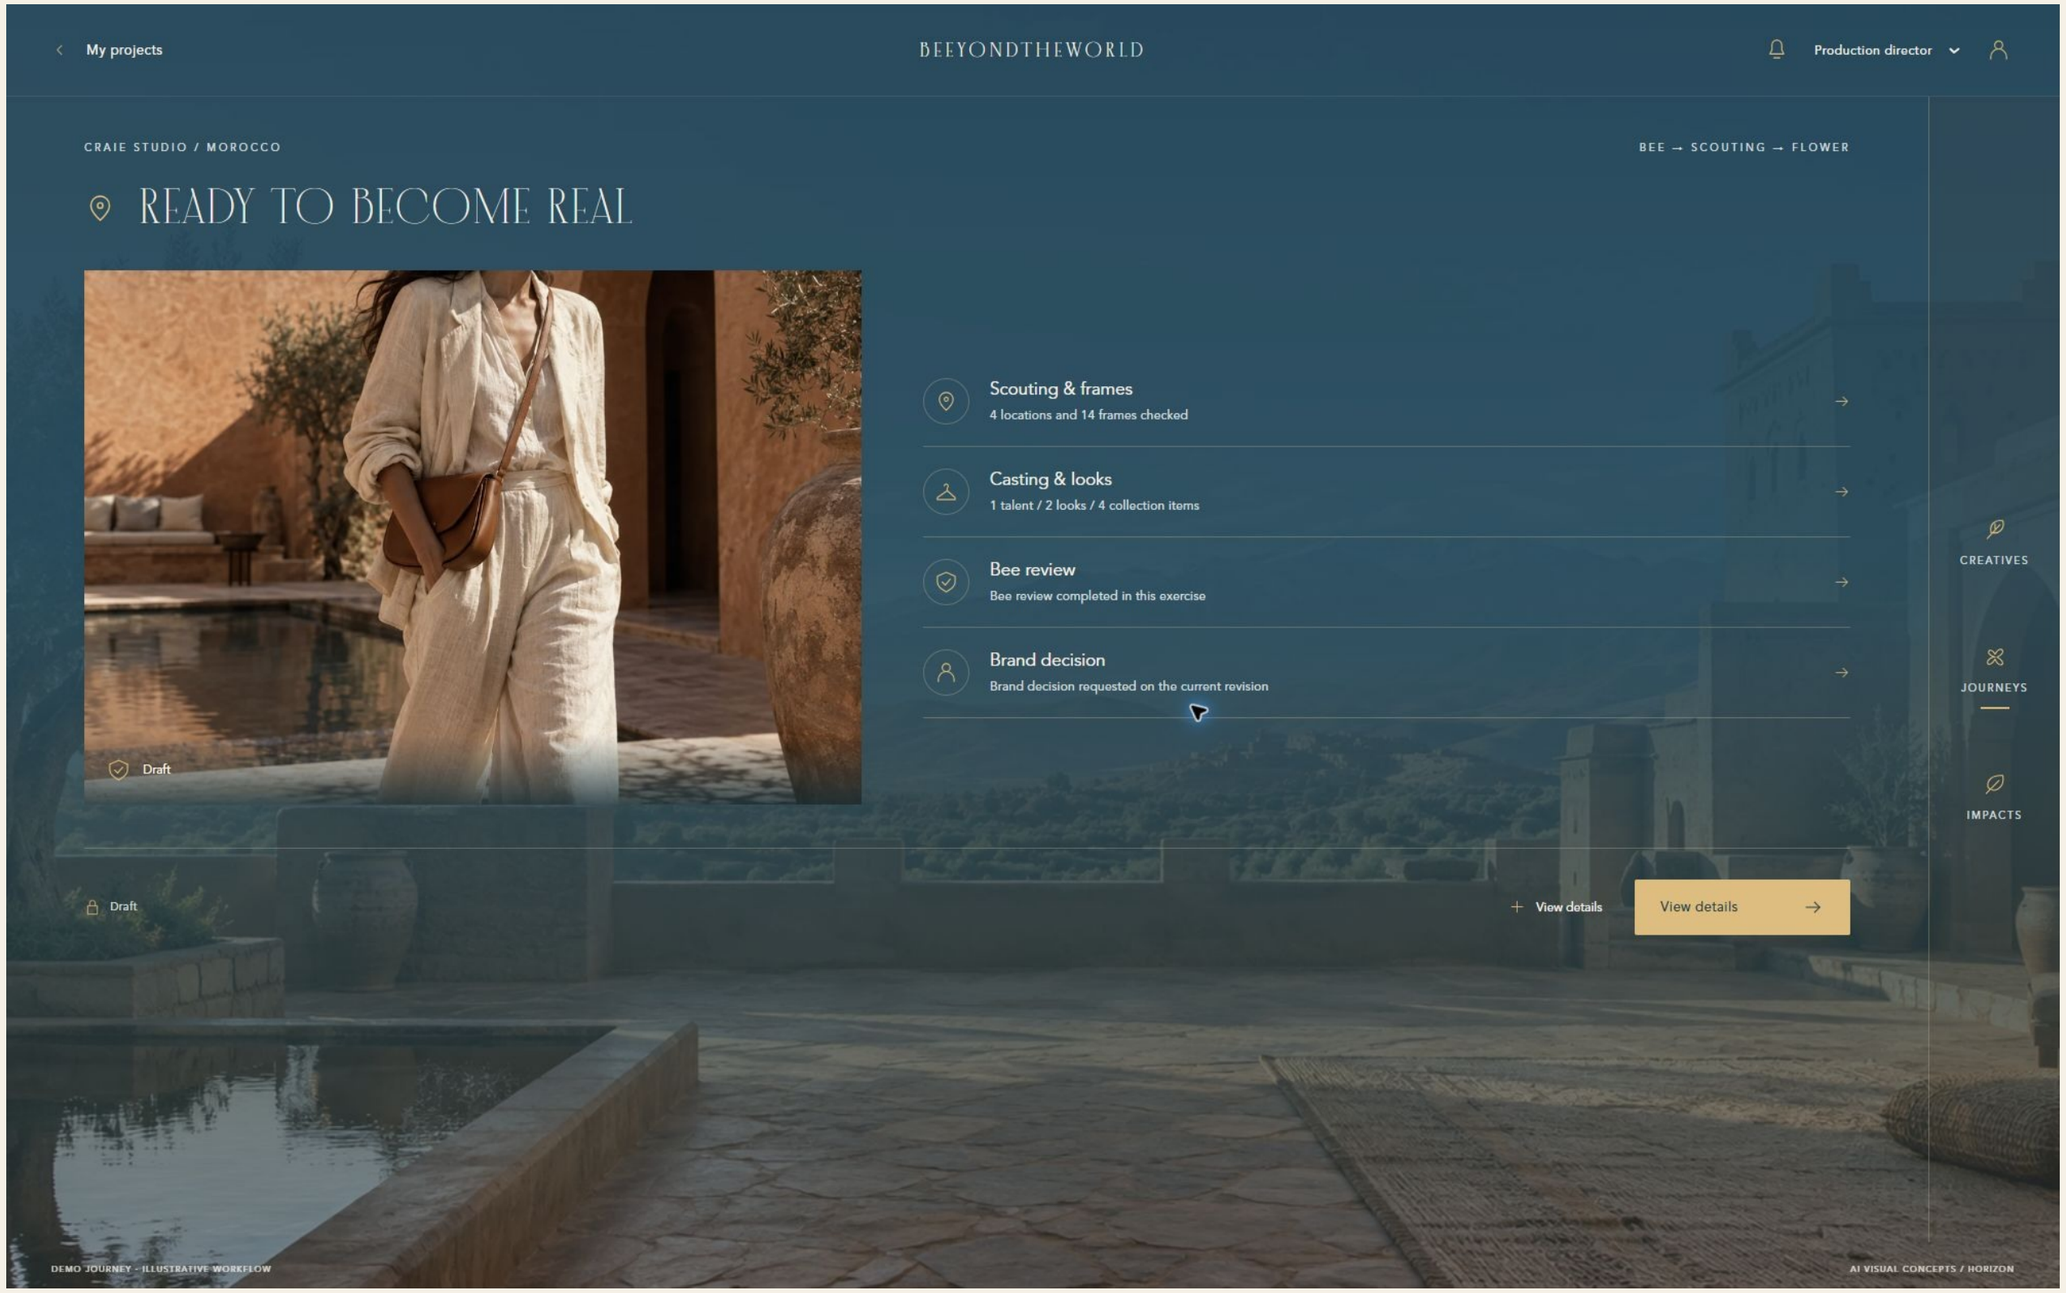

À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Examiner le périmètre créatif et les cadres de la révision concernée. Bee se prononce avant la marque ; une modification impose une nouvelle revue.

CE QUI PASSE À LA SUITE

Les cadres et looks retenus passent par Bee puis par la marque. Production, DA, photo et film.

05 / PRÉPARATION ET FEU VERT • 3 NOVEMBRE

Itinéraire et déplacements

Préparer / compléter

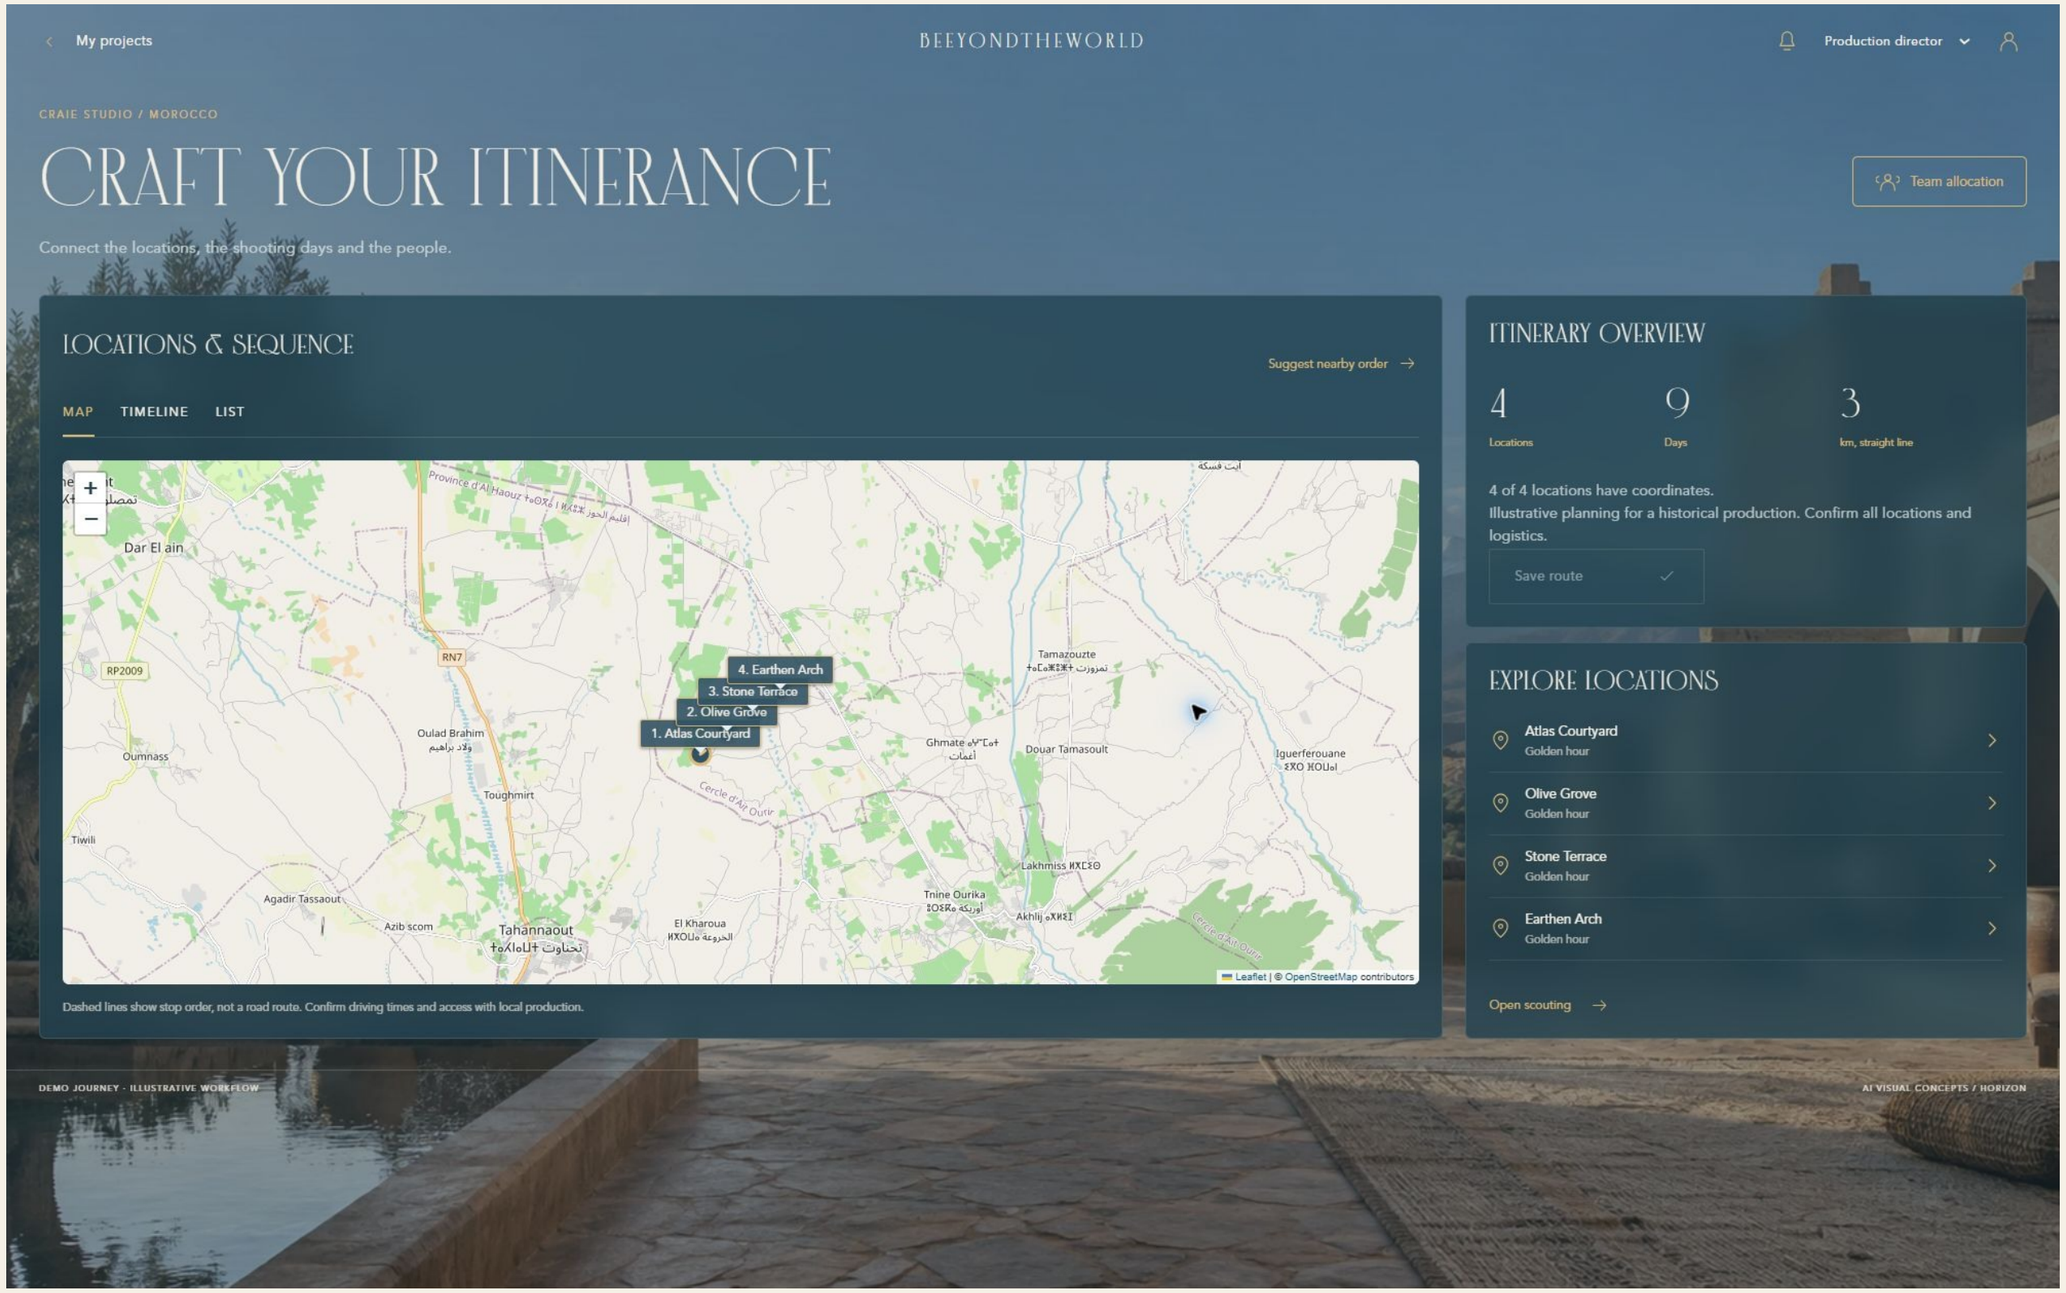

À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Préparer les informations et références affichées, vérifier leur cohérence avec le brief puis transmettre au responsable de l'étape.

CE QUI PASSE À LA SUITE

Aucun départ en production sans création, équipe, accès et budget cohérents. Production et métiers plateau.

05 / PRÉPARATION ET FEU VERT • 3 NOVEMBRE

Réservations de l’équipe

Préparer / compléter

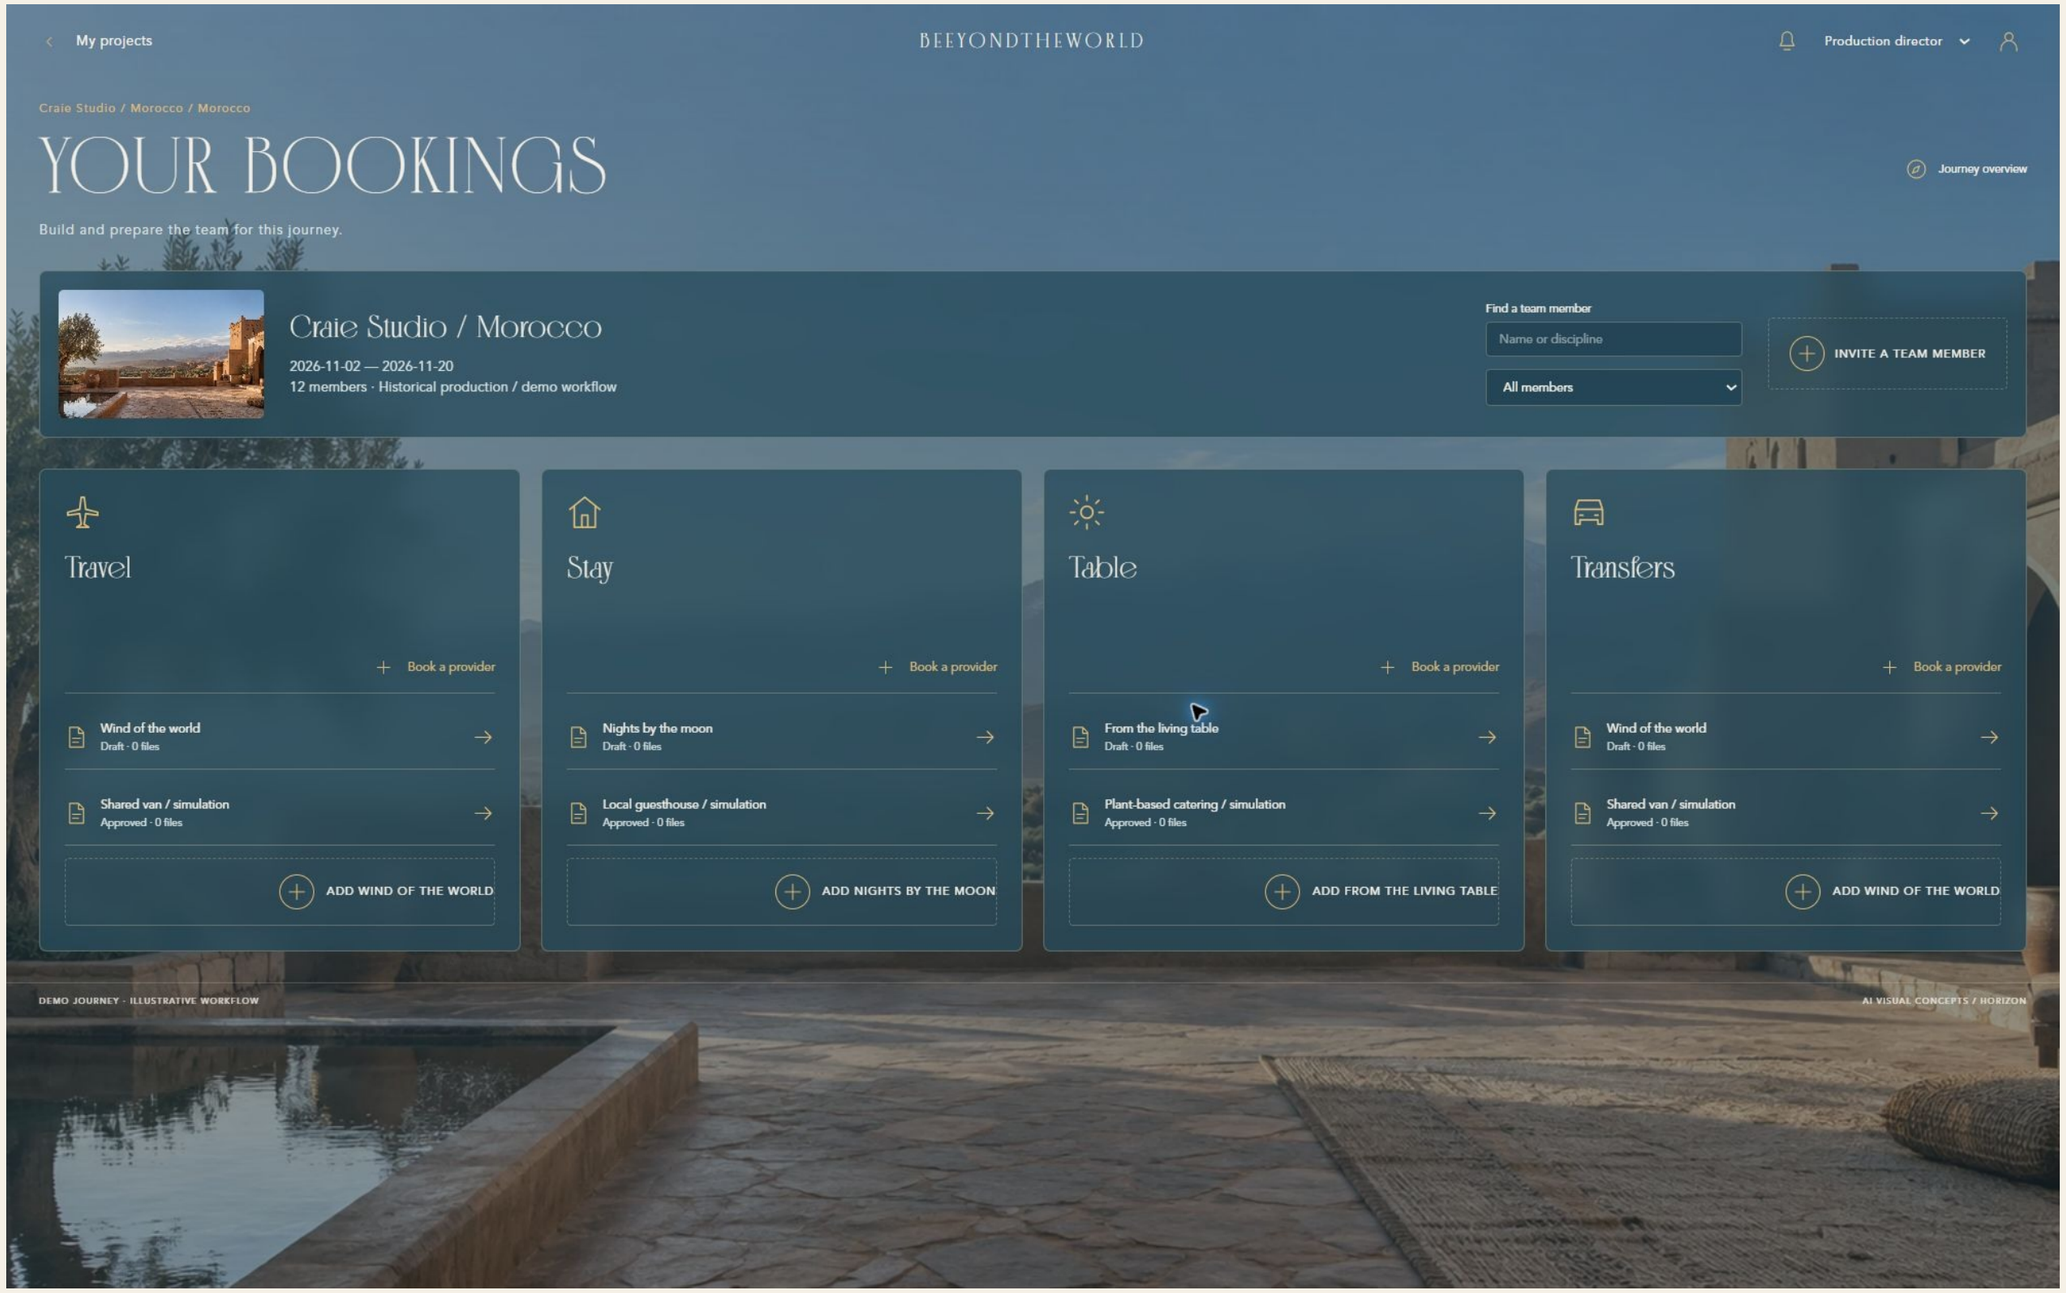

À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Consulter les réservations associées à la mission ; la production organise l’ensemble. Les prestataires et coûts de ce cas sont fictifs.

CE QUI PASSE À LA SUITE

Aucun départ en production sans création, équipe, accès et budget cohérents. Production et métiers plateau.

05 / PRÉPARATION ET FEU VERT • 3 NOVEMBRE

Transport

Préparer / compléter

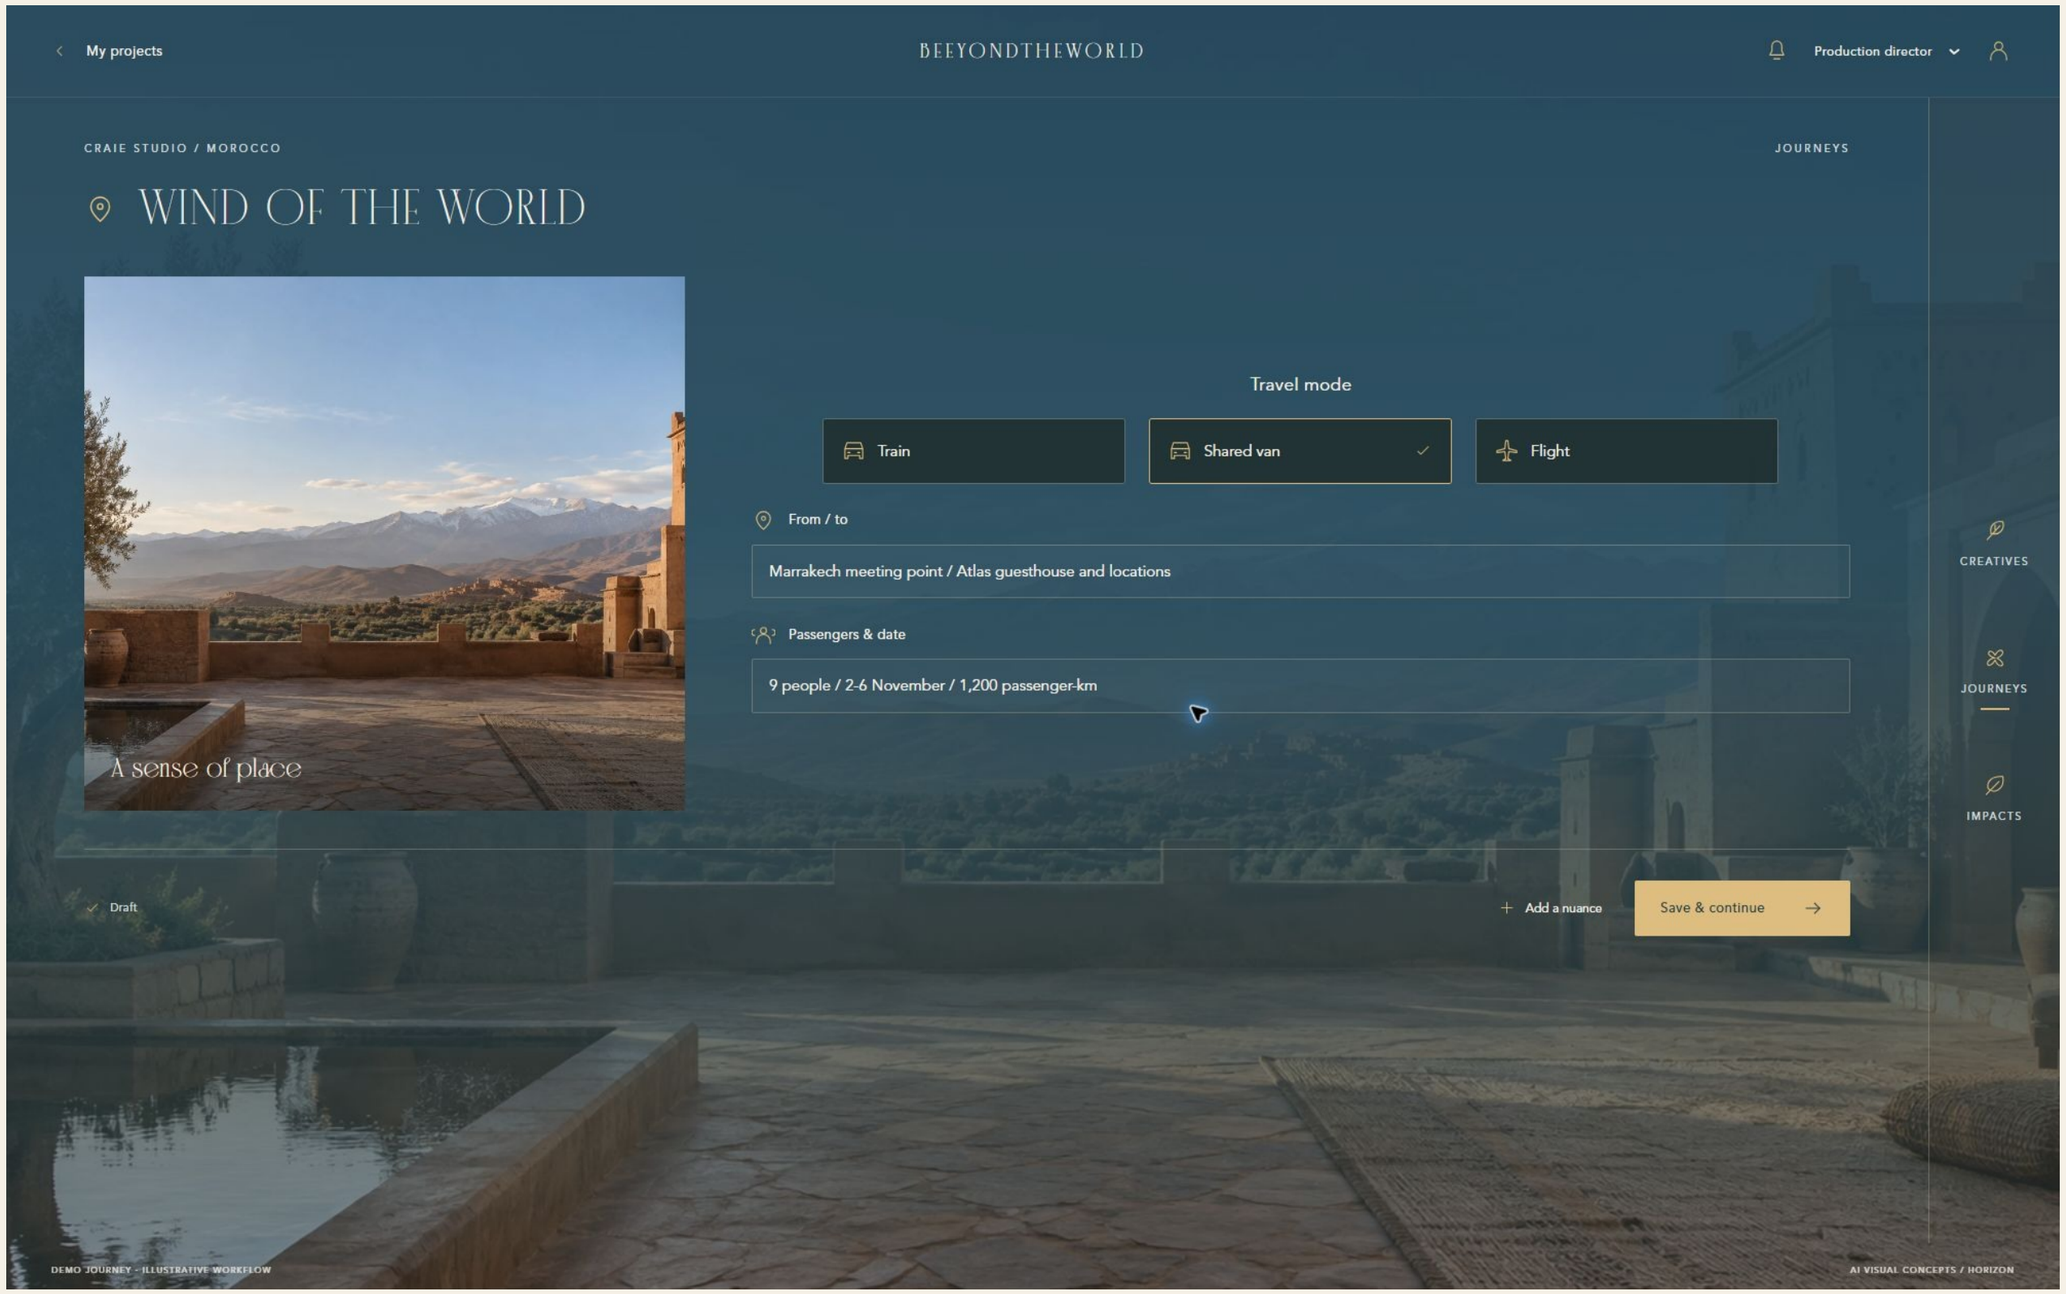

À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Préparer les informations et références affichées, vérifier leur cohérence avec le brief puis transmettre au responsable de l'étape.

CE QUI PASSE À LA SUITE

Aucun départ en production sans création, équipe, accès et budget cohérents. Production et métiers plateau.

05 / PRÉPARATION ET FEU VERT • 3 NOVEMBRE

Hébergement

Préparer / compléter

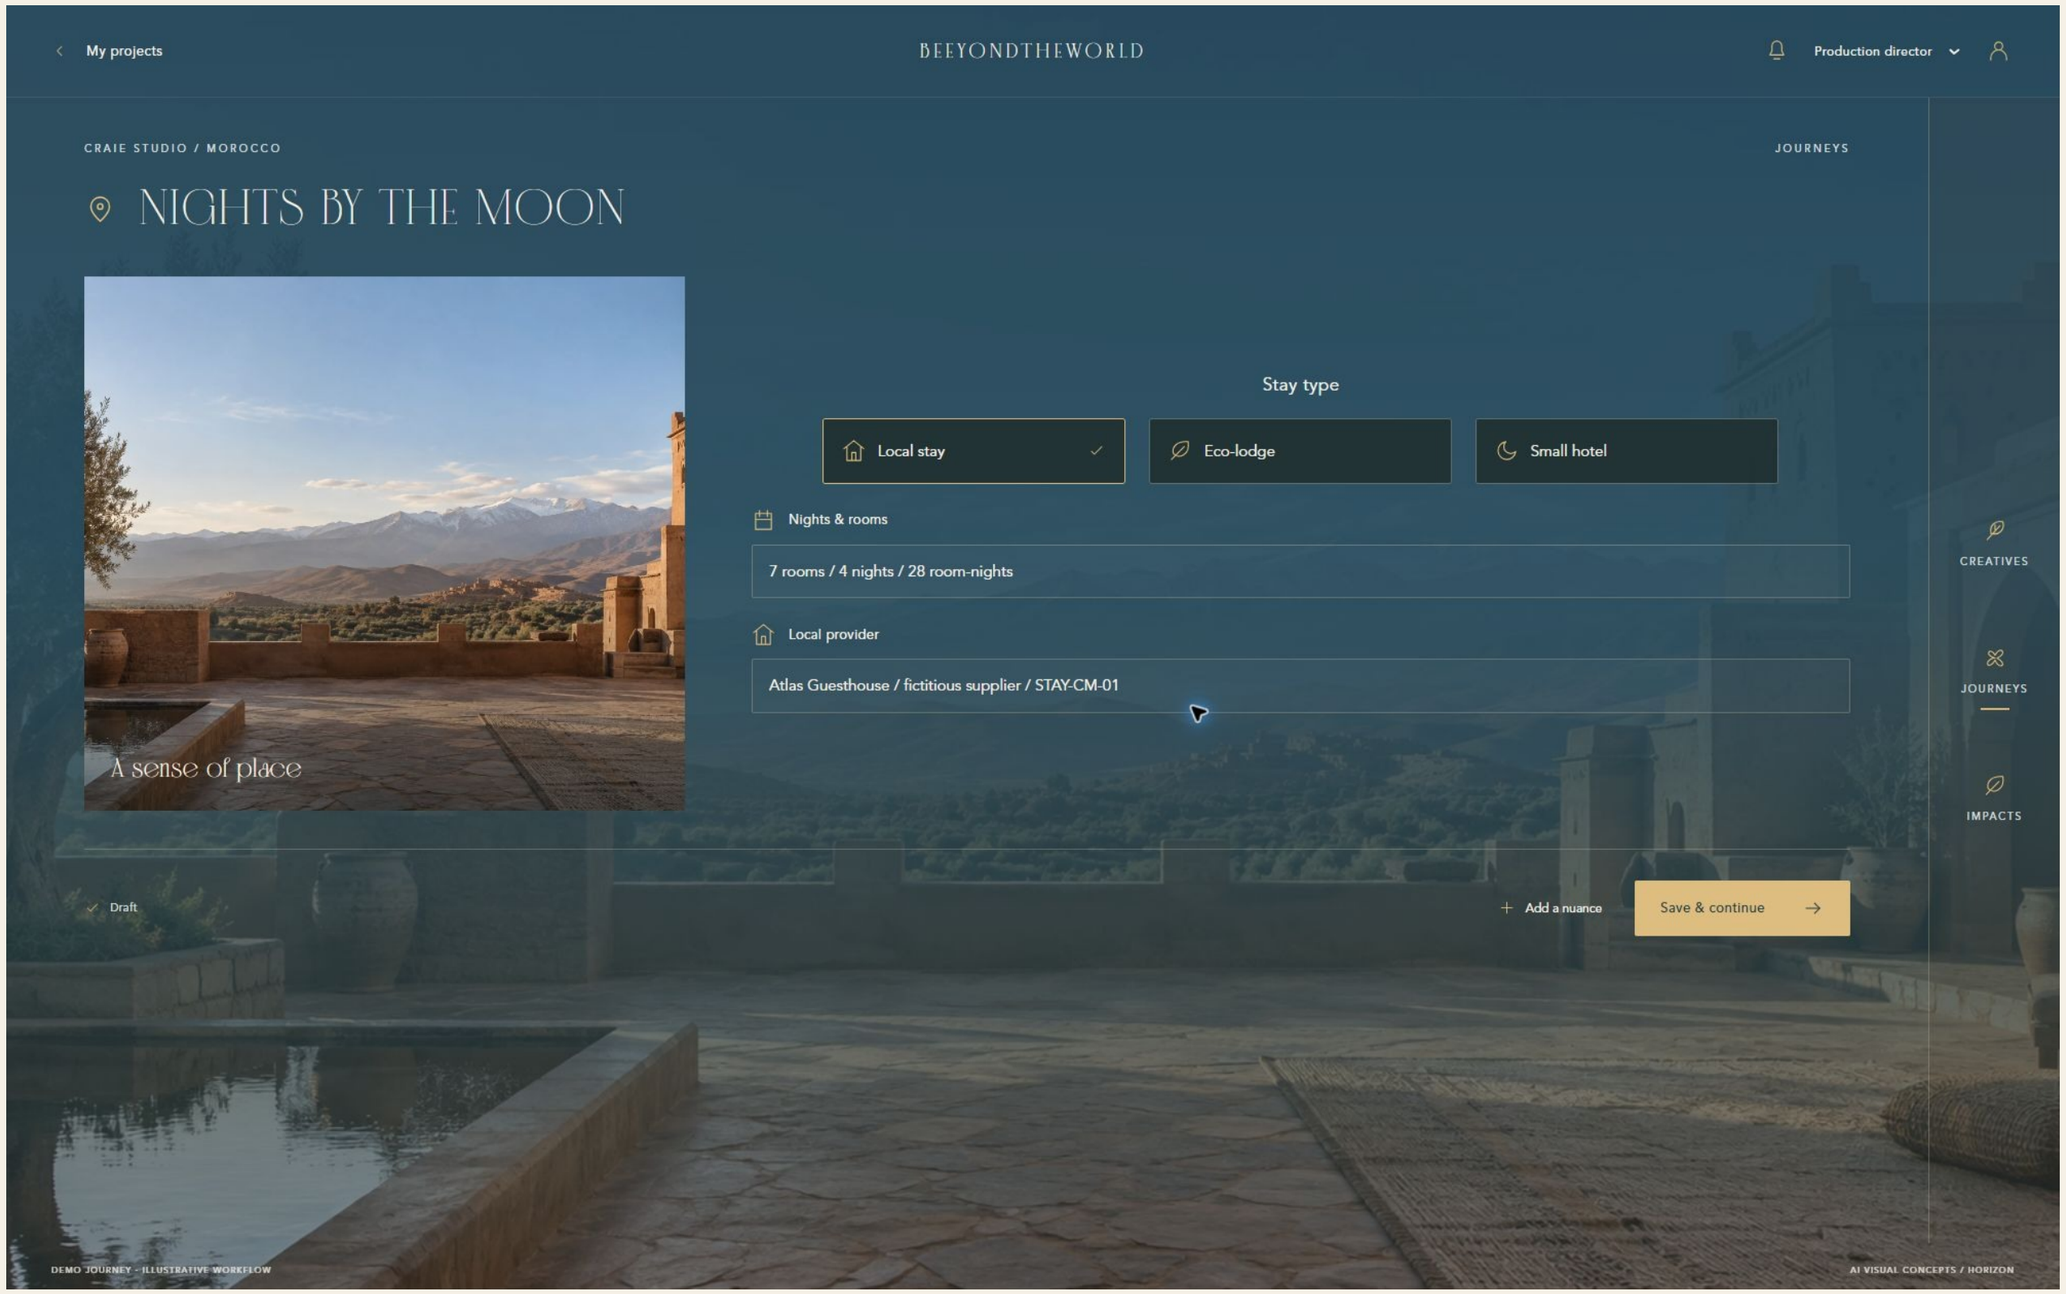

À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Préparer les informations et références affichées, vérifier leur cohérence avec le brief puis transmettre au responsable de l'étape.

CE QUI PASSE À LA SUITE

Aucun départ en production sans création, équipe, accès et budget cohérents. Production et métiers plateau.

05 / PRÉPARATION ET FEU VERT • 3 NOVEMBRE

Restauration

Préparer / compléter

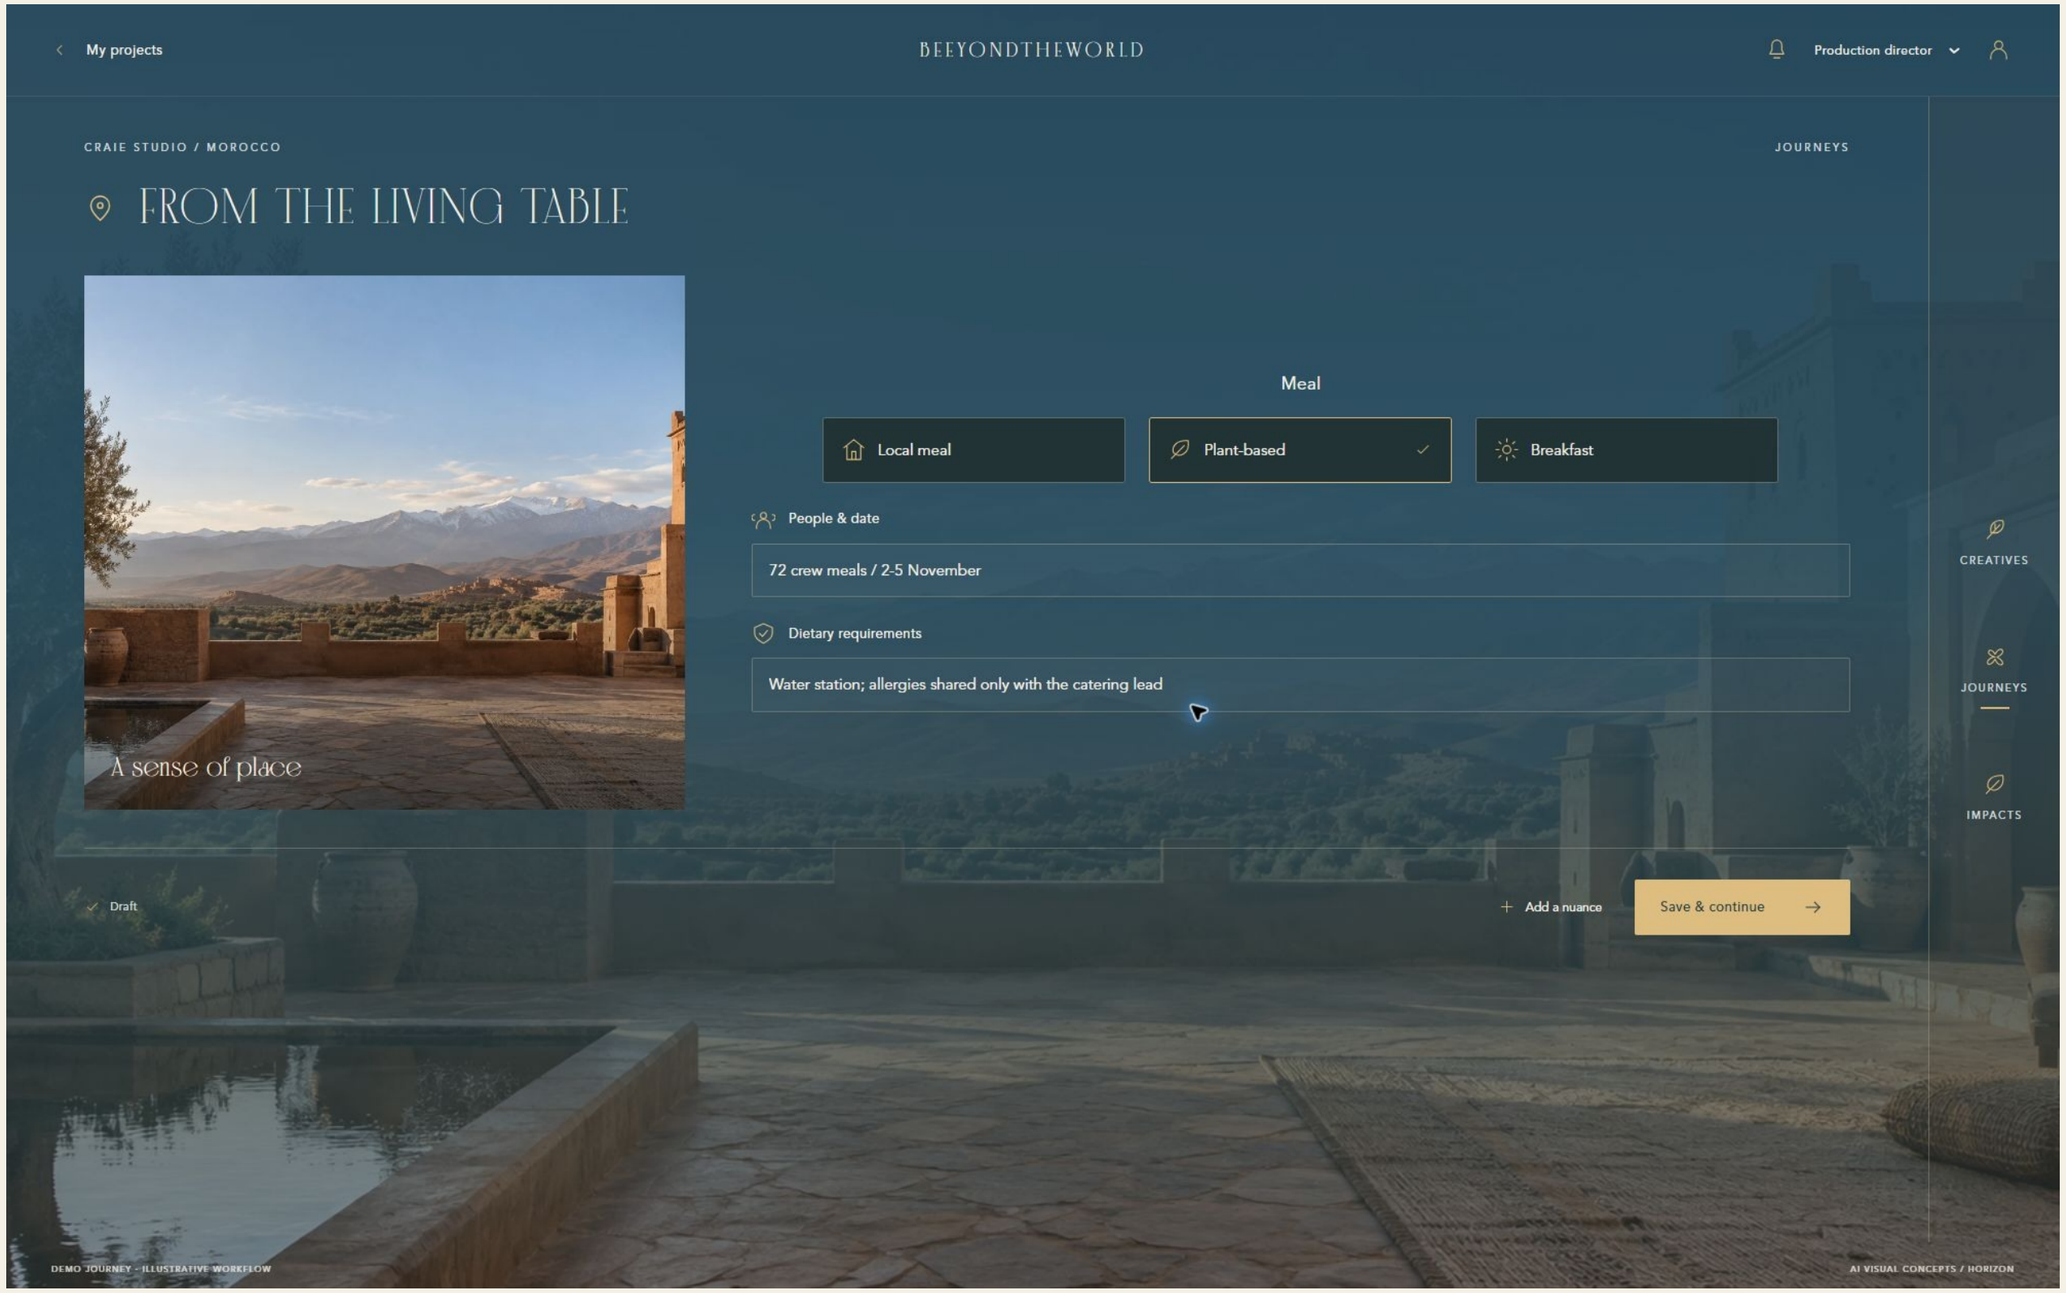

À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Préparer les informations et références affichées, vérifier leur cohérence avec le brief puis transmettre au responsable de l’étape.

CE QUI PASSE À LA SUITE

Aucun départ en production sans création, équipe, accès et budget cohérents. Production et métiers plateau.

05 / PRÉPARATION ET FEU VERT • 3 NOVEMBRE

Matériel et besoins

Préparer / compléter

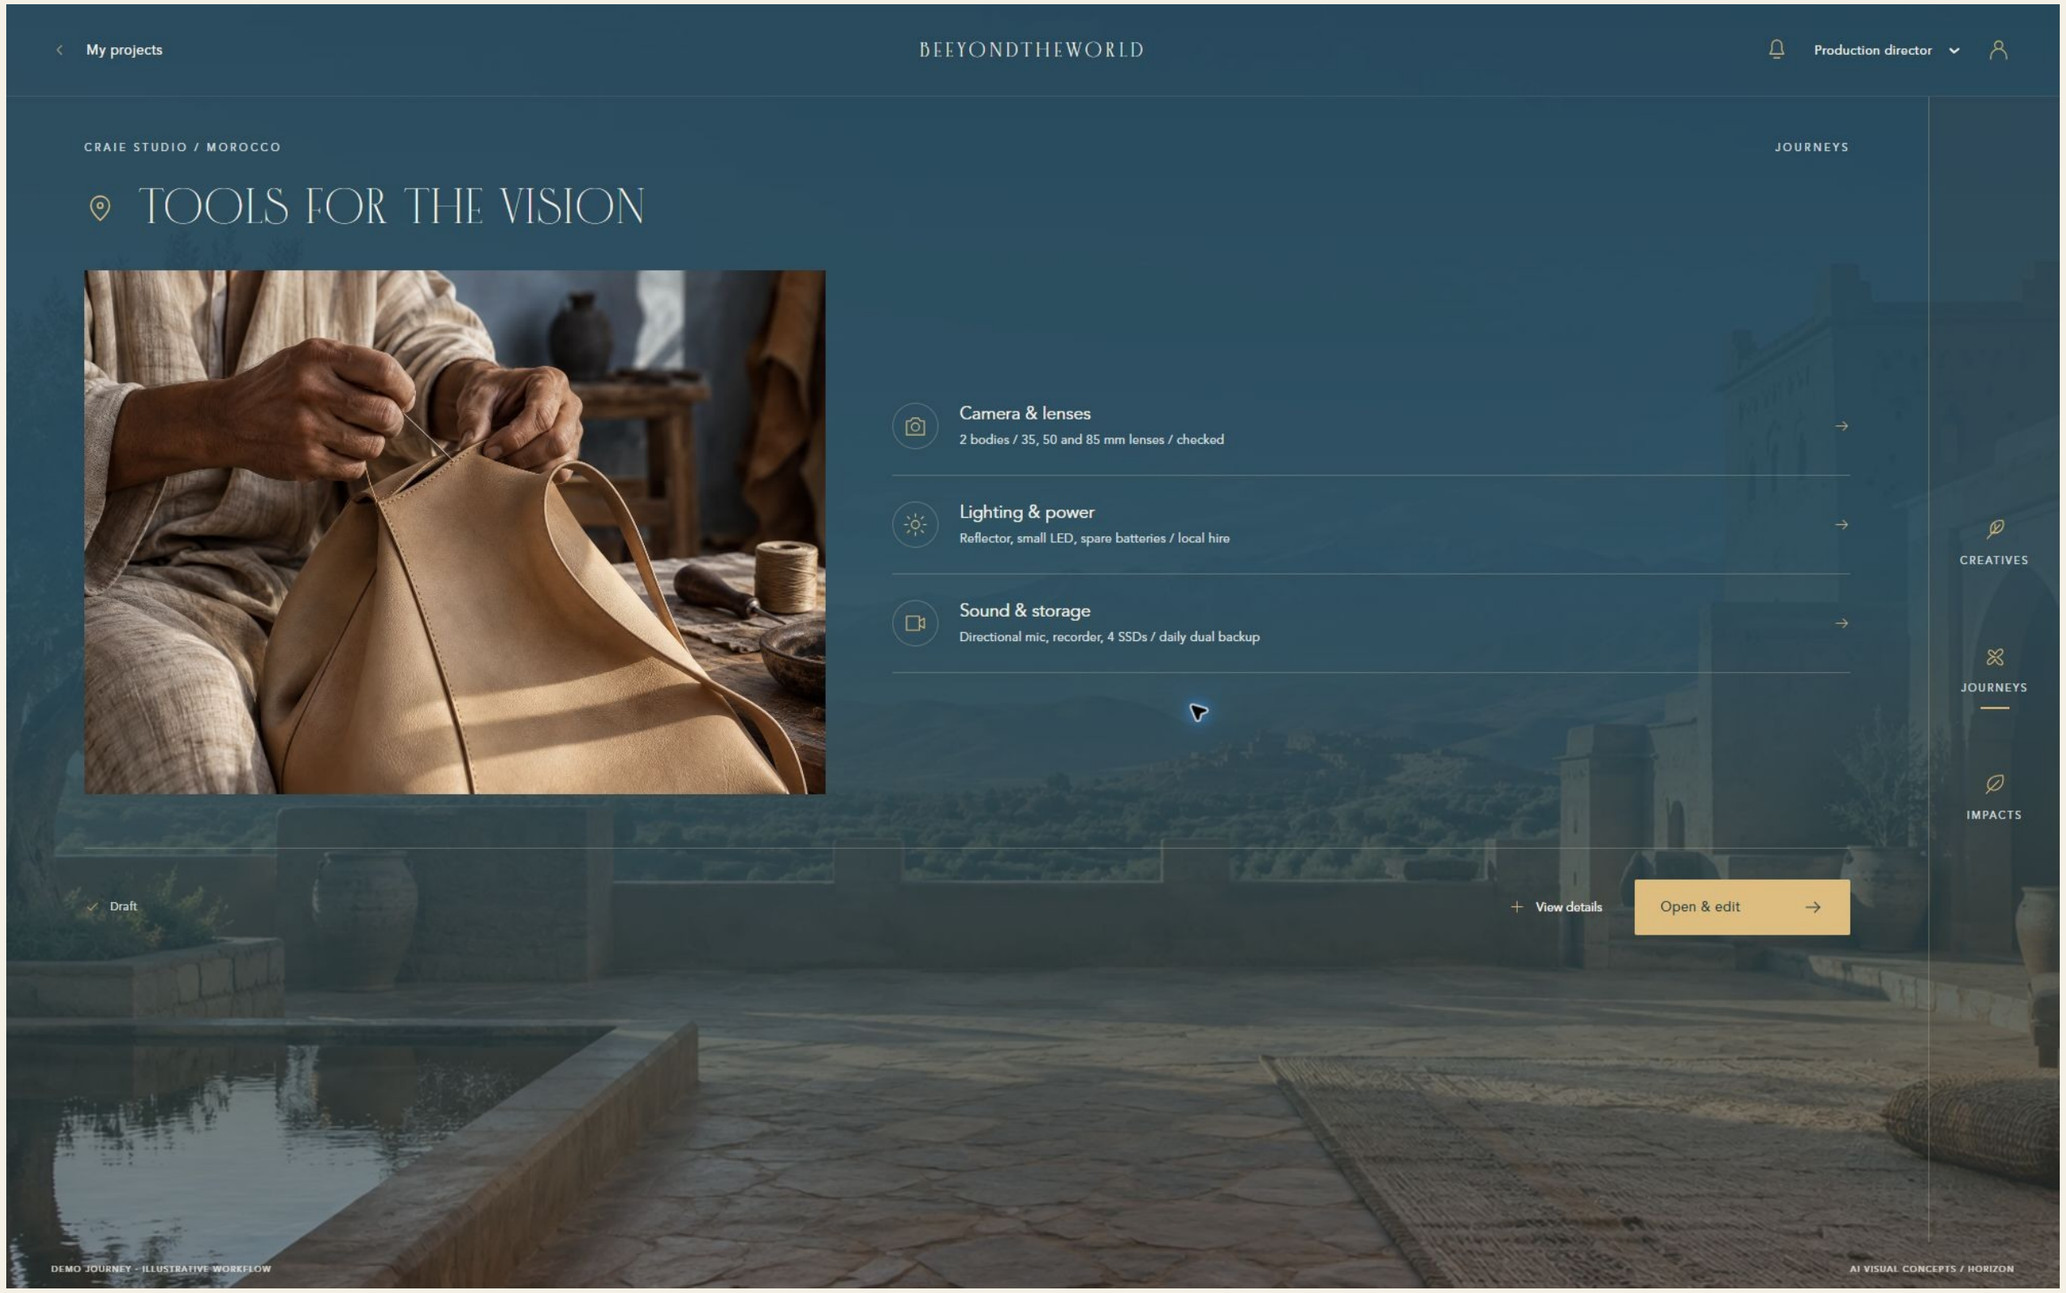

À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Préparer les informations et références affichées, vérifier leur cohérence avec le brief puis transmettre au responsable de l’étape.

CE QUI PASSE À LA SUITE

Aucun départ en production sans création, équipe, accès et budget cohérents. Production et métiers plateau.

05 / PRÉPARATION ET FEU VERT • 3 NOVEMBRE

Looks et frames

Consulter

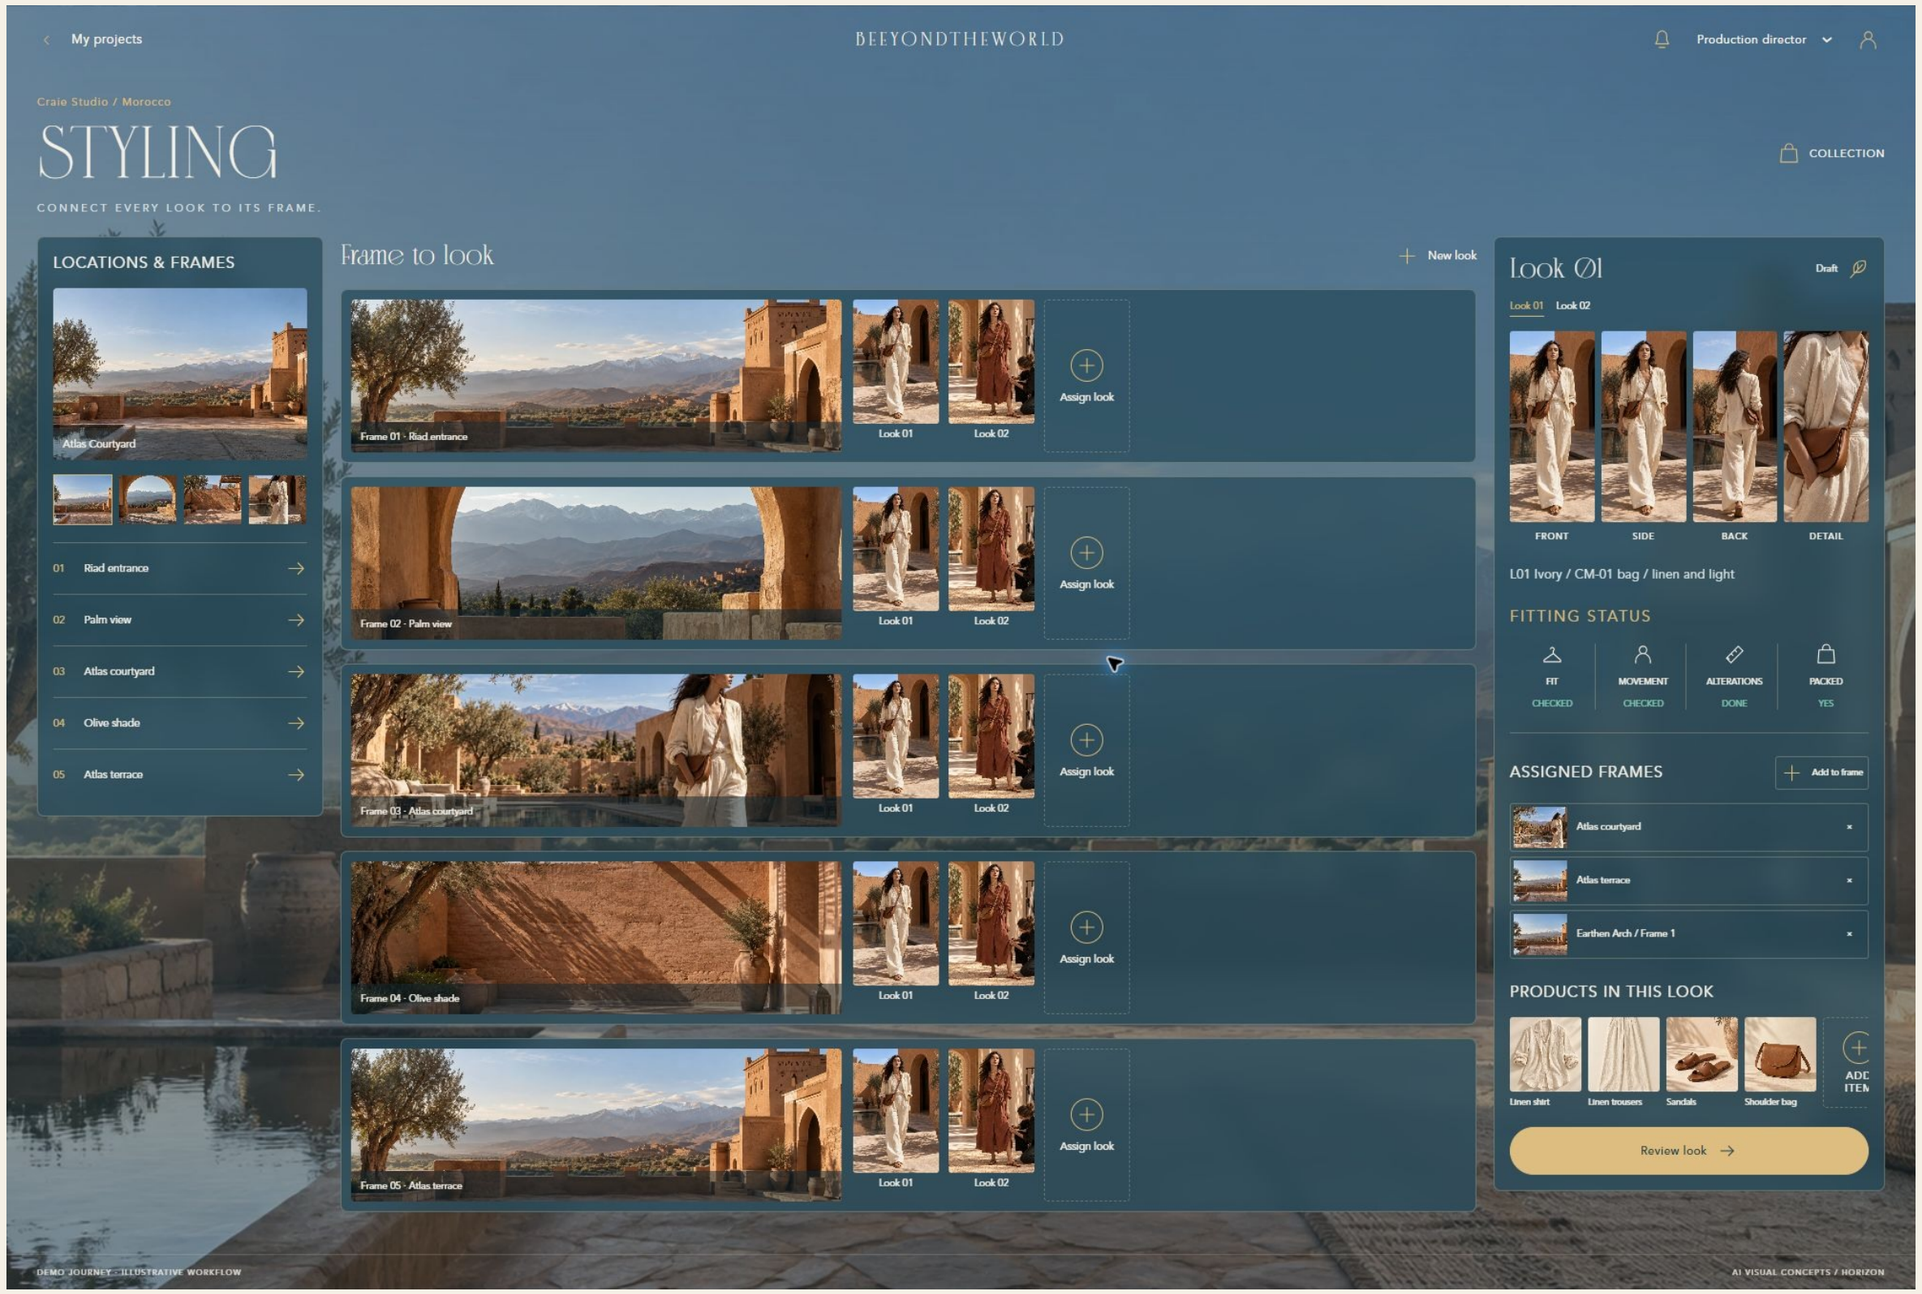

À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Sélectionner L01 Ivory ou L02 Rust, vérifier le sac CM-01, puis parcourir les vues de raccord et les éléments du look.

CE QUI PASSE À LA SUITE

Aucun départ en production sans création, équipe, accès et budget cohérents. Production et métiers plateau.

05 / PRÉPARATION ET FEU VERT • 3 NOVEMBRE

Essayages et raccords

Consulter

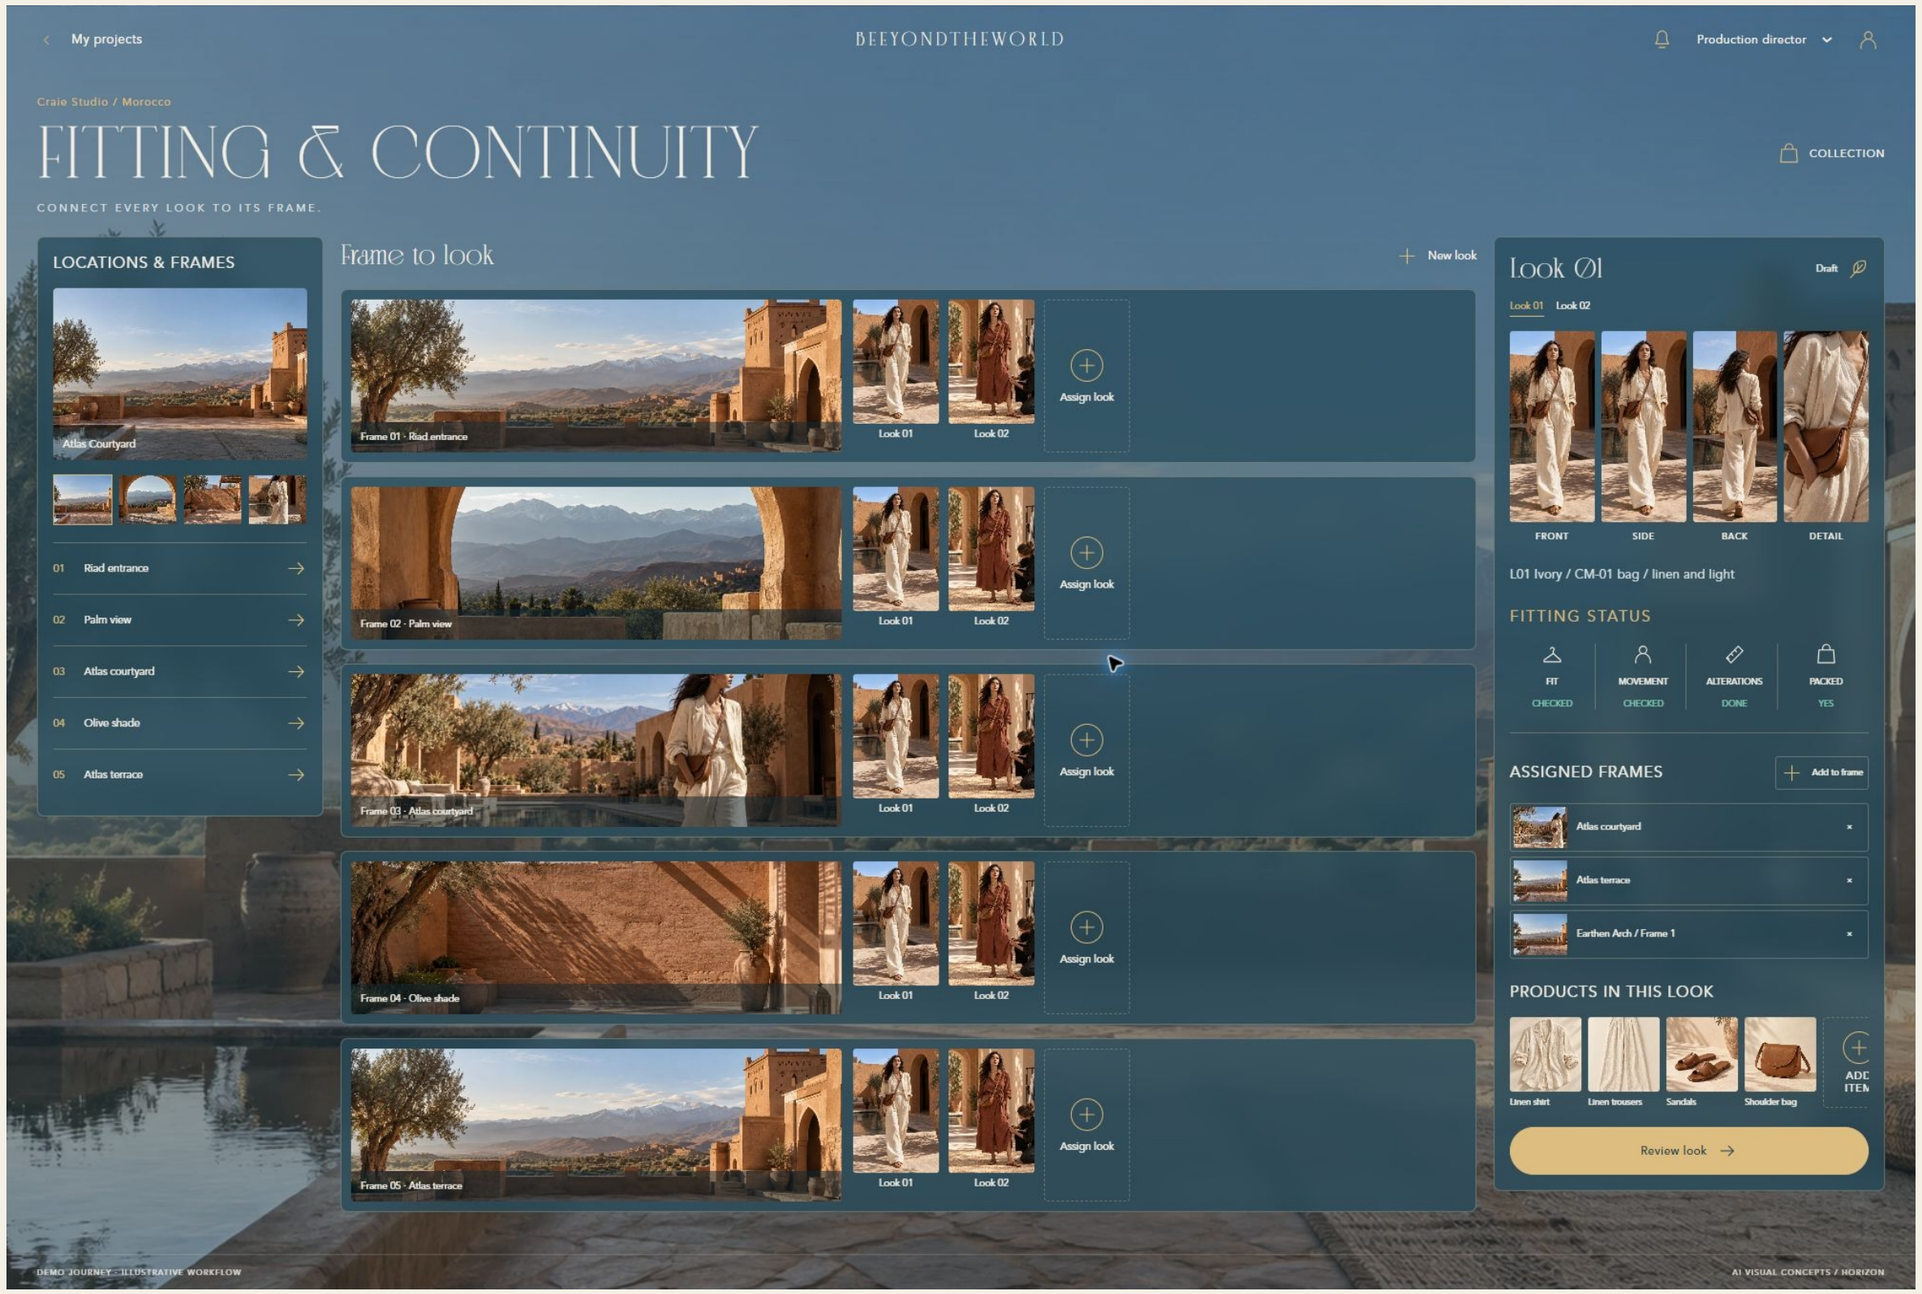

À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Vérifier coupe, mouvement, retouches et préparation. Les références illustrées aident à communiquer ; elles ne remplacent pas un essayage réel.

CE QUI PASSE À LA SUITE

Aucun départ en production sans création, équipe, accès et budget cohérents. Production et métiers plateau.

05 / PRÉPARATION ET FEU VERT • 3 NOVEMBRE

Direction beauté

Consulter

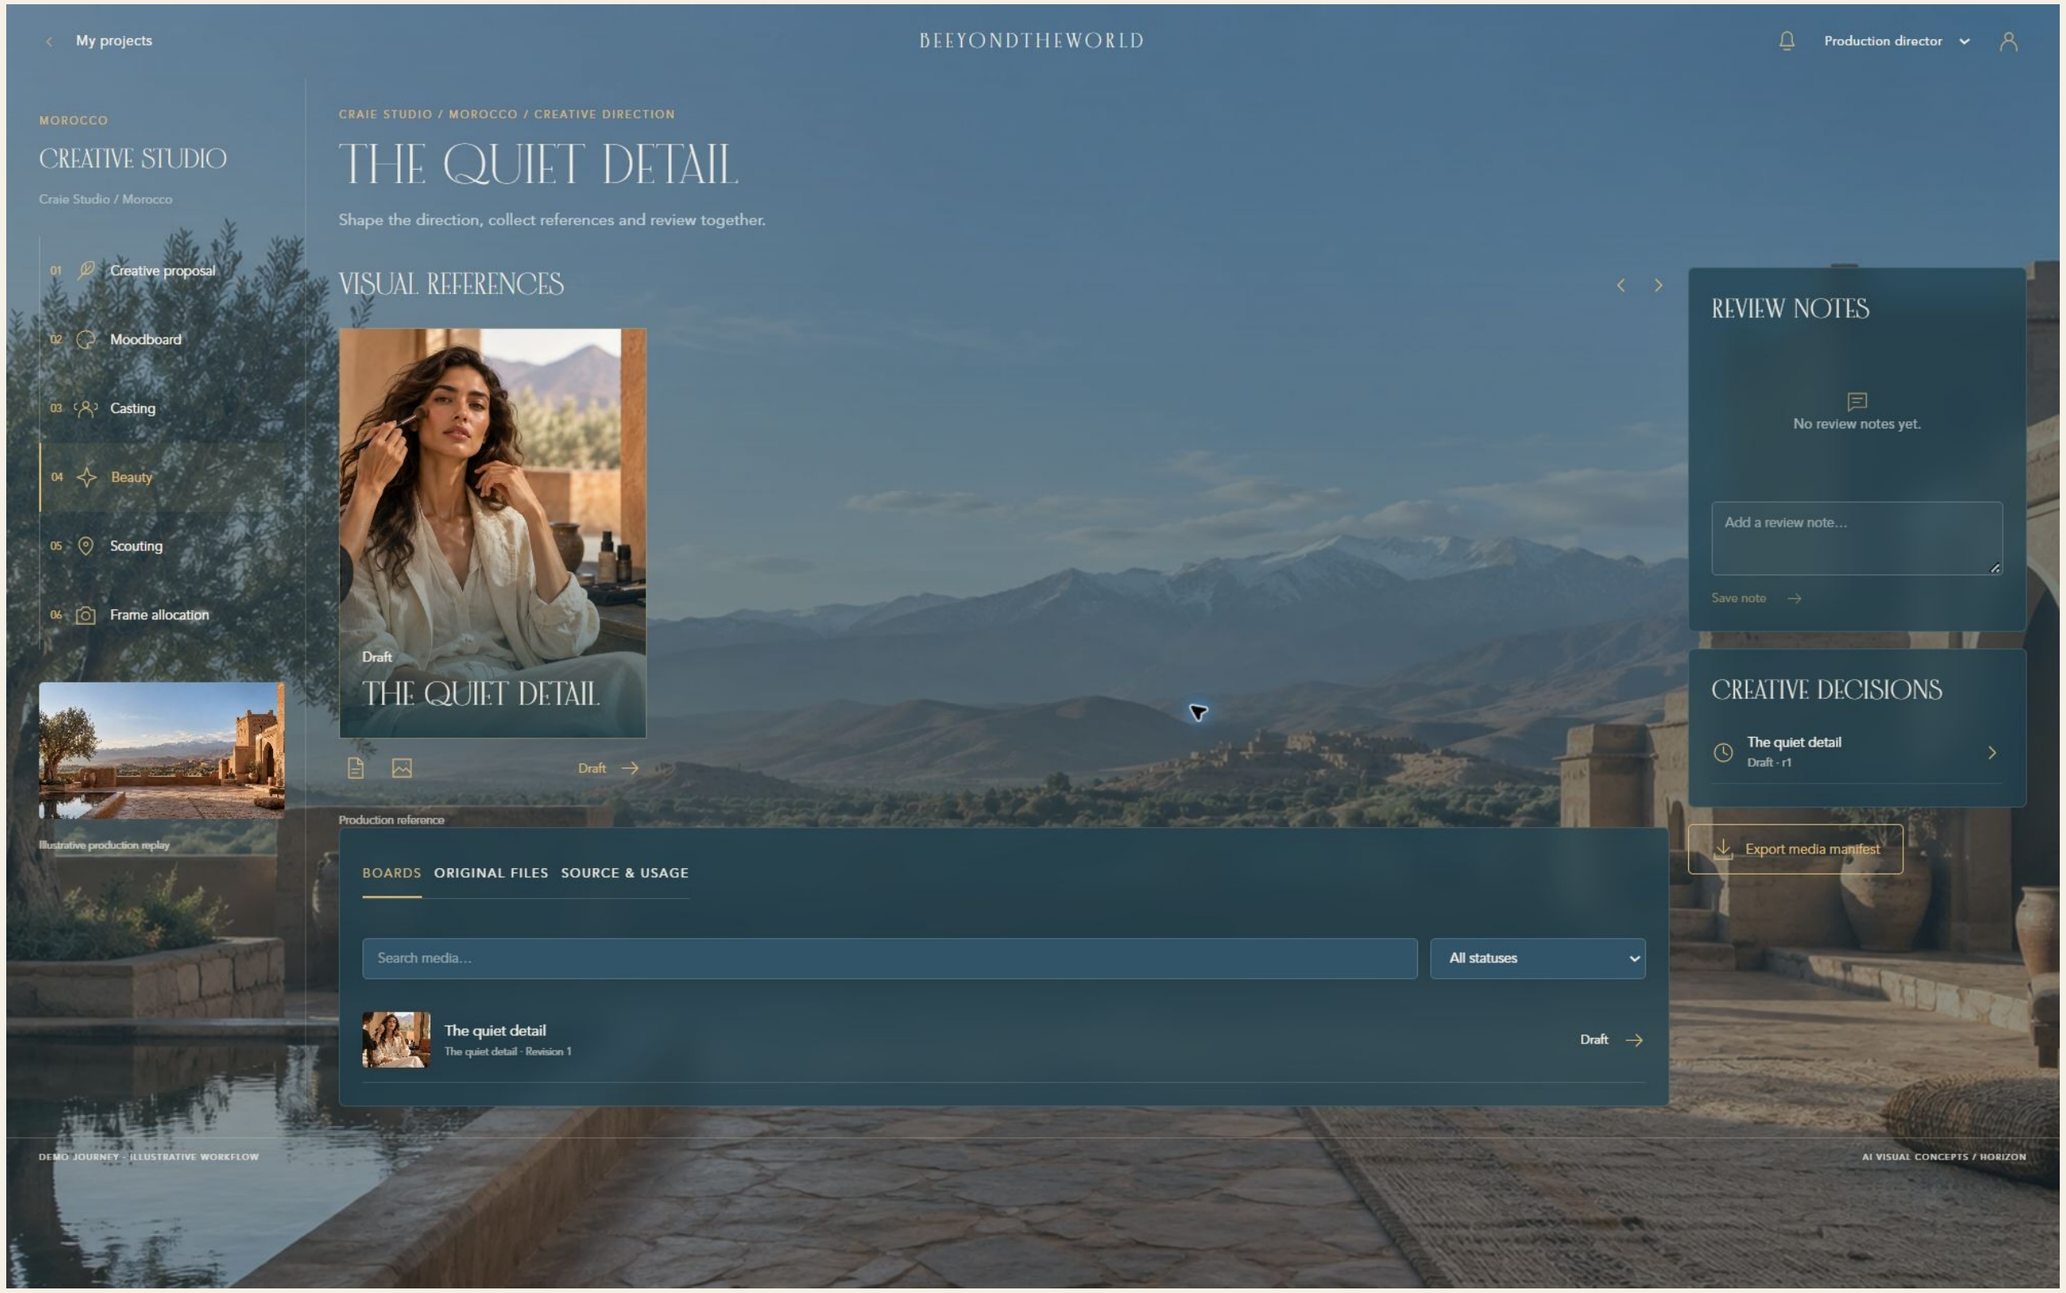

À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Lire les informations utiles à sa mission et vérifier la version. Transmettre une question au responsable de cette étape si un élément manque.

CE QUI PASSE À LA SUITE

Aucun départ en production sans création, équipe, accès et budget cohérents. Production et métiers plateau.

05 / PRÉPARATION ET FEU VERT • 3 NOVEMBRE

Passage au tournage

Préparer / compléter

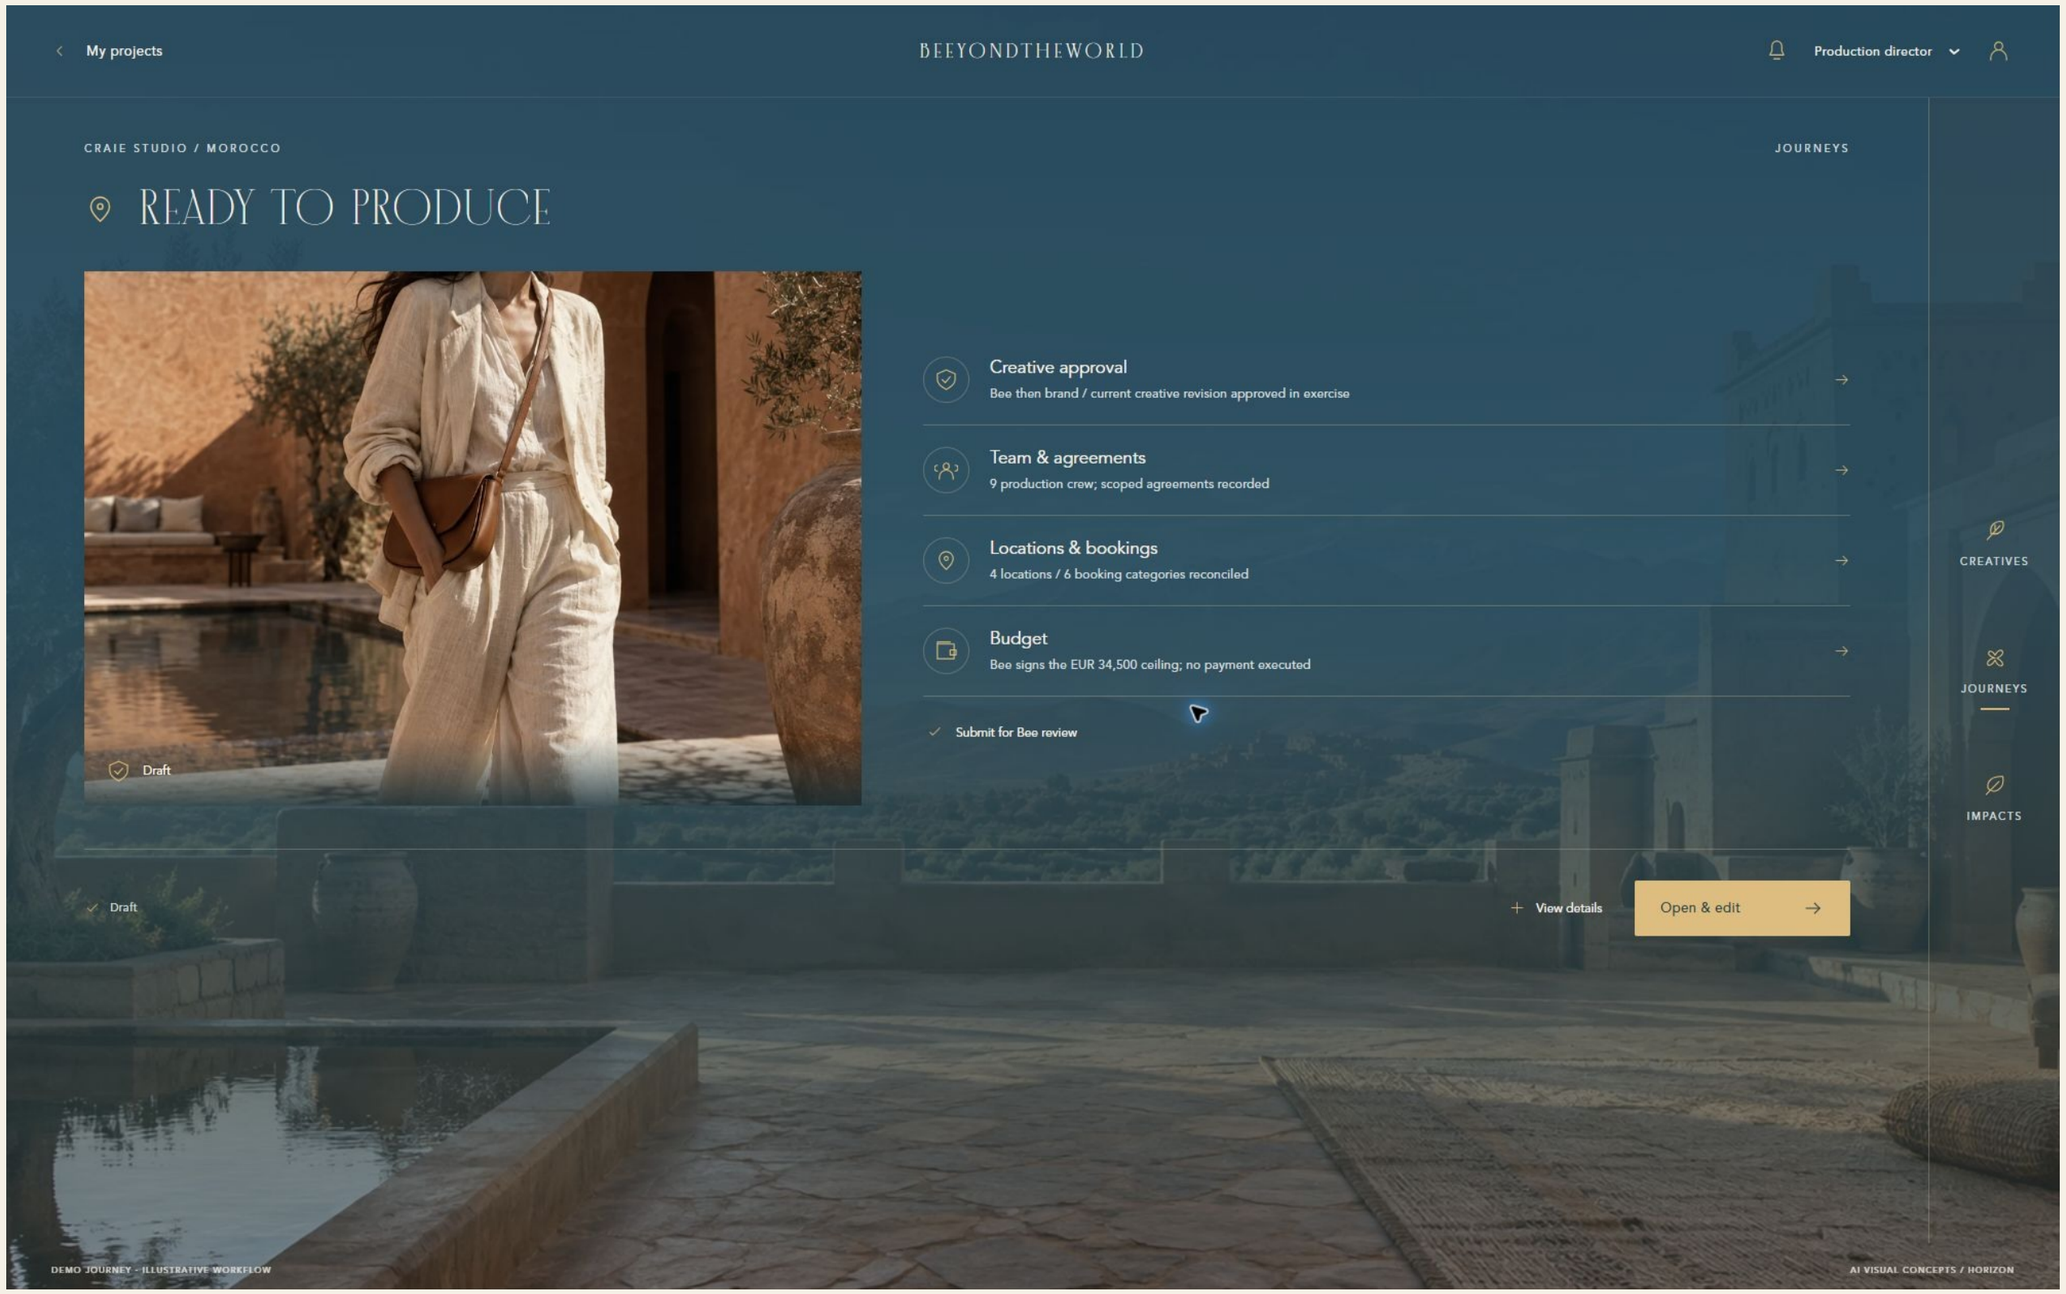

À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Vérifier la cohérence de l'équipe, des accords, du brief, des lieux et de la logistique avant le passage au plateau.

CE QUI PASSE À LA SUITE

Aucun départ en production sans création, équipe, accès et budget cohérents. Production et métiers plateau.

05 / PRÉPARATION ET FEU VERT • 3 NOVEMBRE

Look 02 — continuité et raccords

Consulter

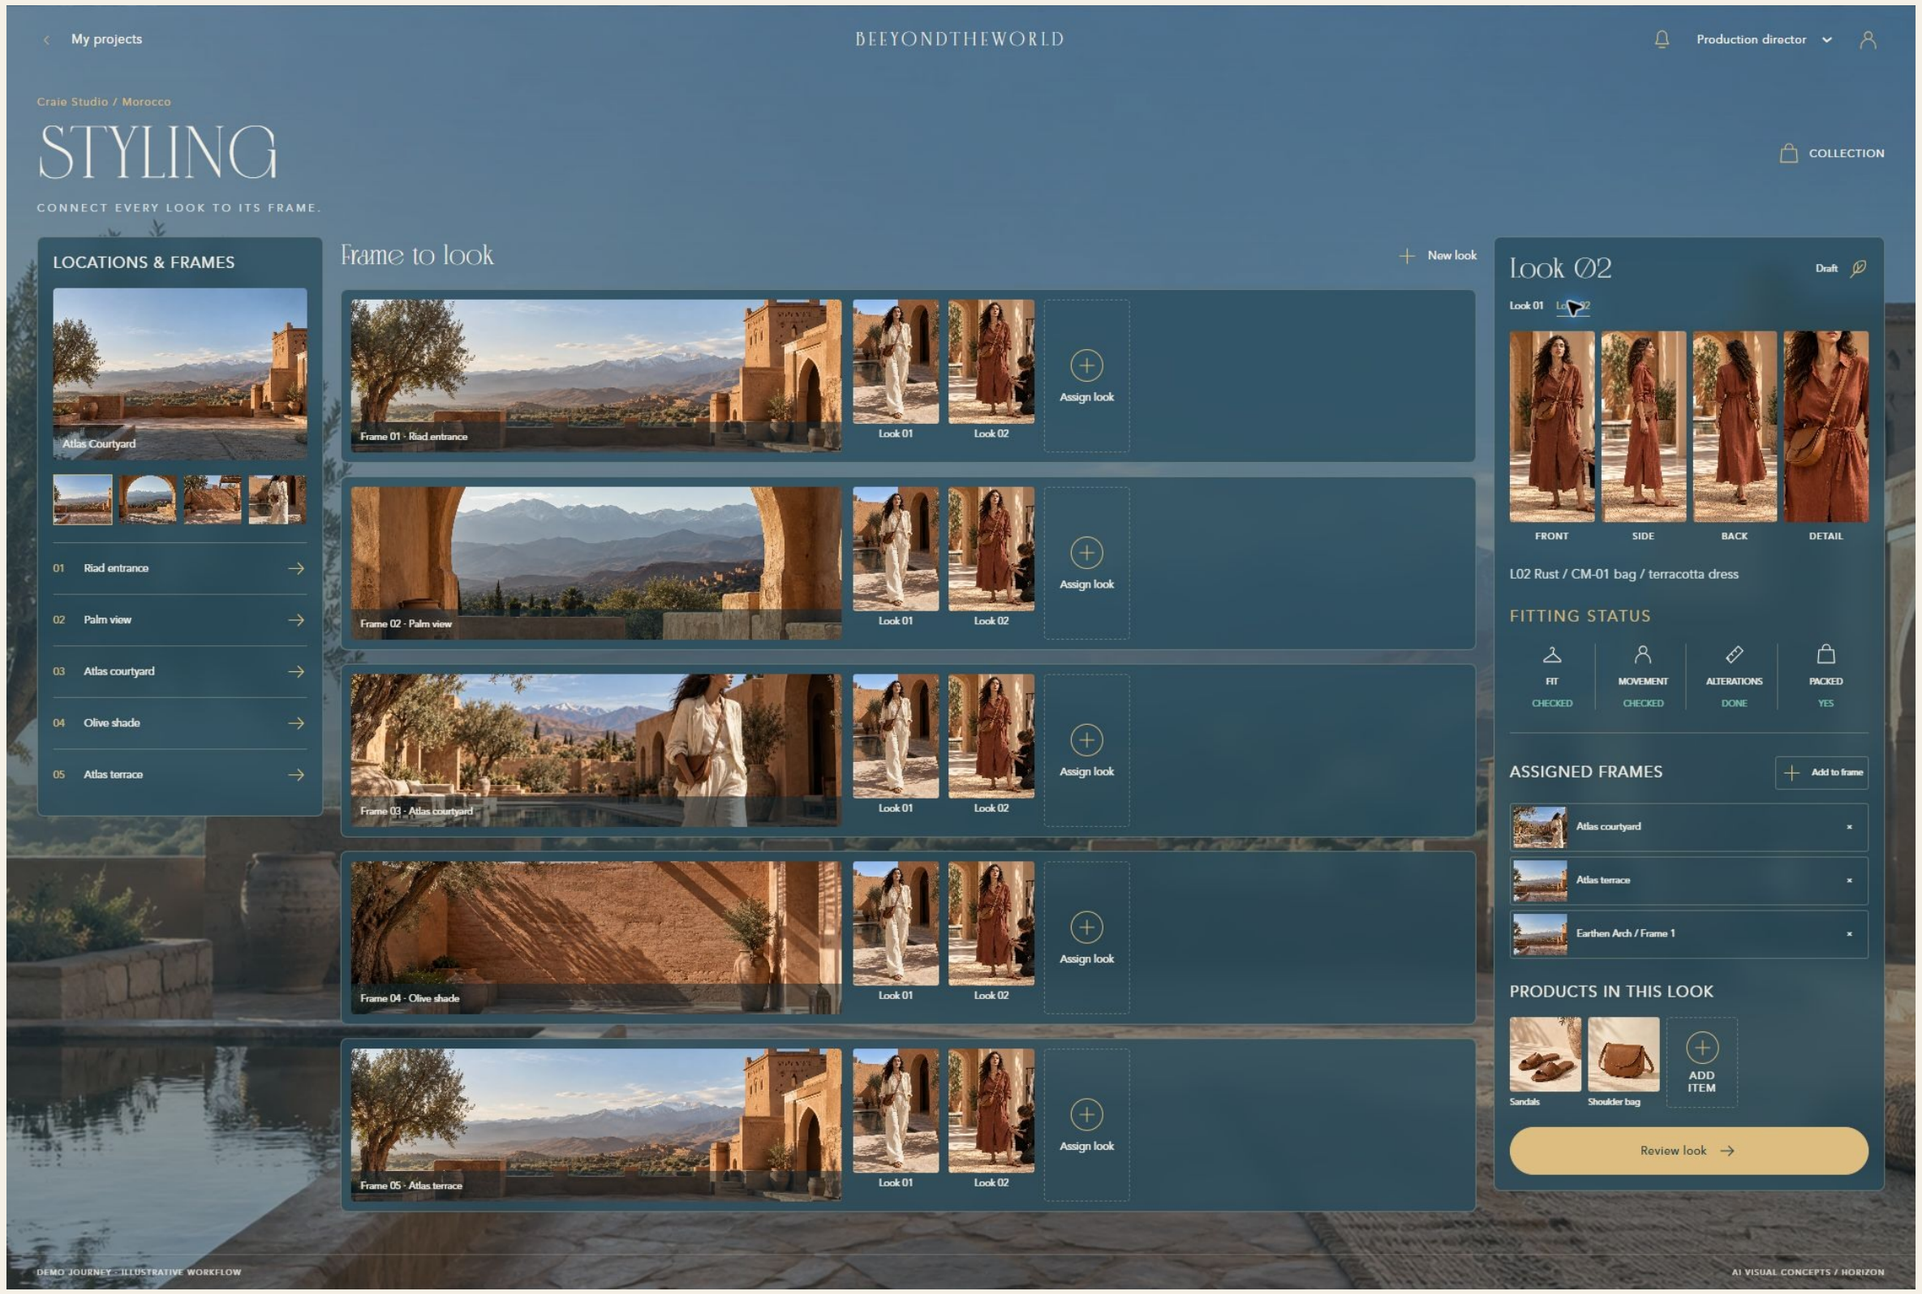

À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Le second look conserve le même talent et le même sac. Comparer face, profil, dos et détail pour préparer les raccords.

CE QUI PASSE À LA SUITE

Aucun départ en production sans création, équipe, accès et budget cohérents. Production et métiers plateau.

07 / FLOWER : LA PRODUCTION • 4-6 NOVEMBRE

Feuille de service · 1/2

Préparer / compléter

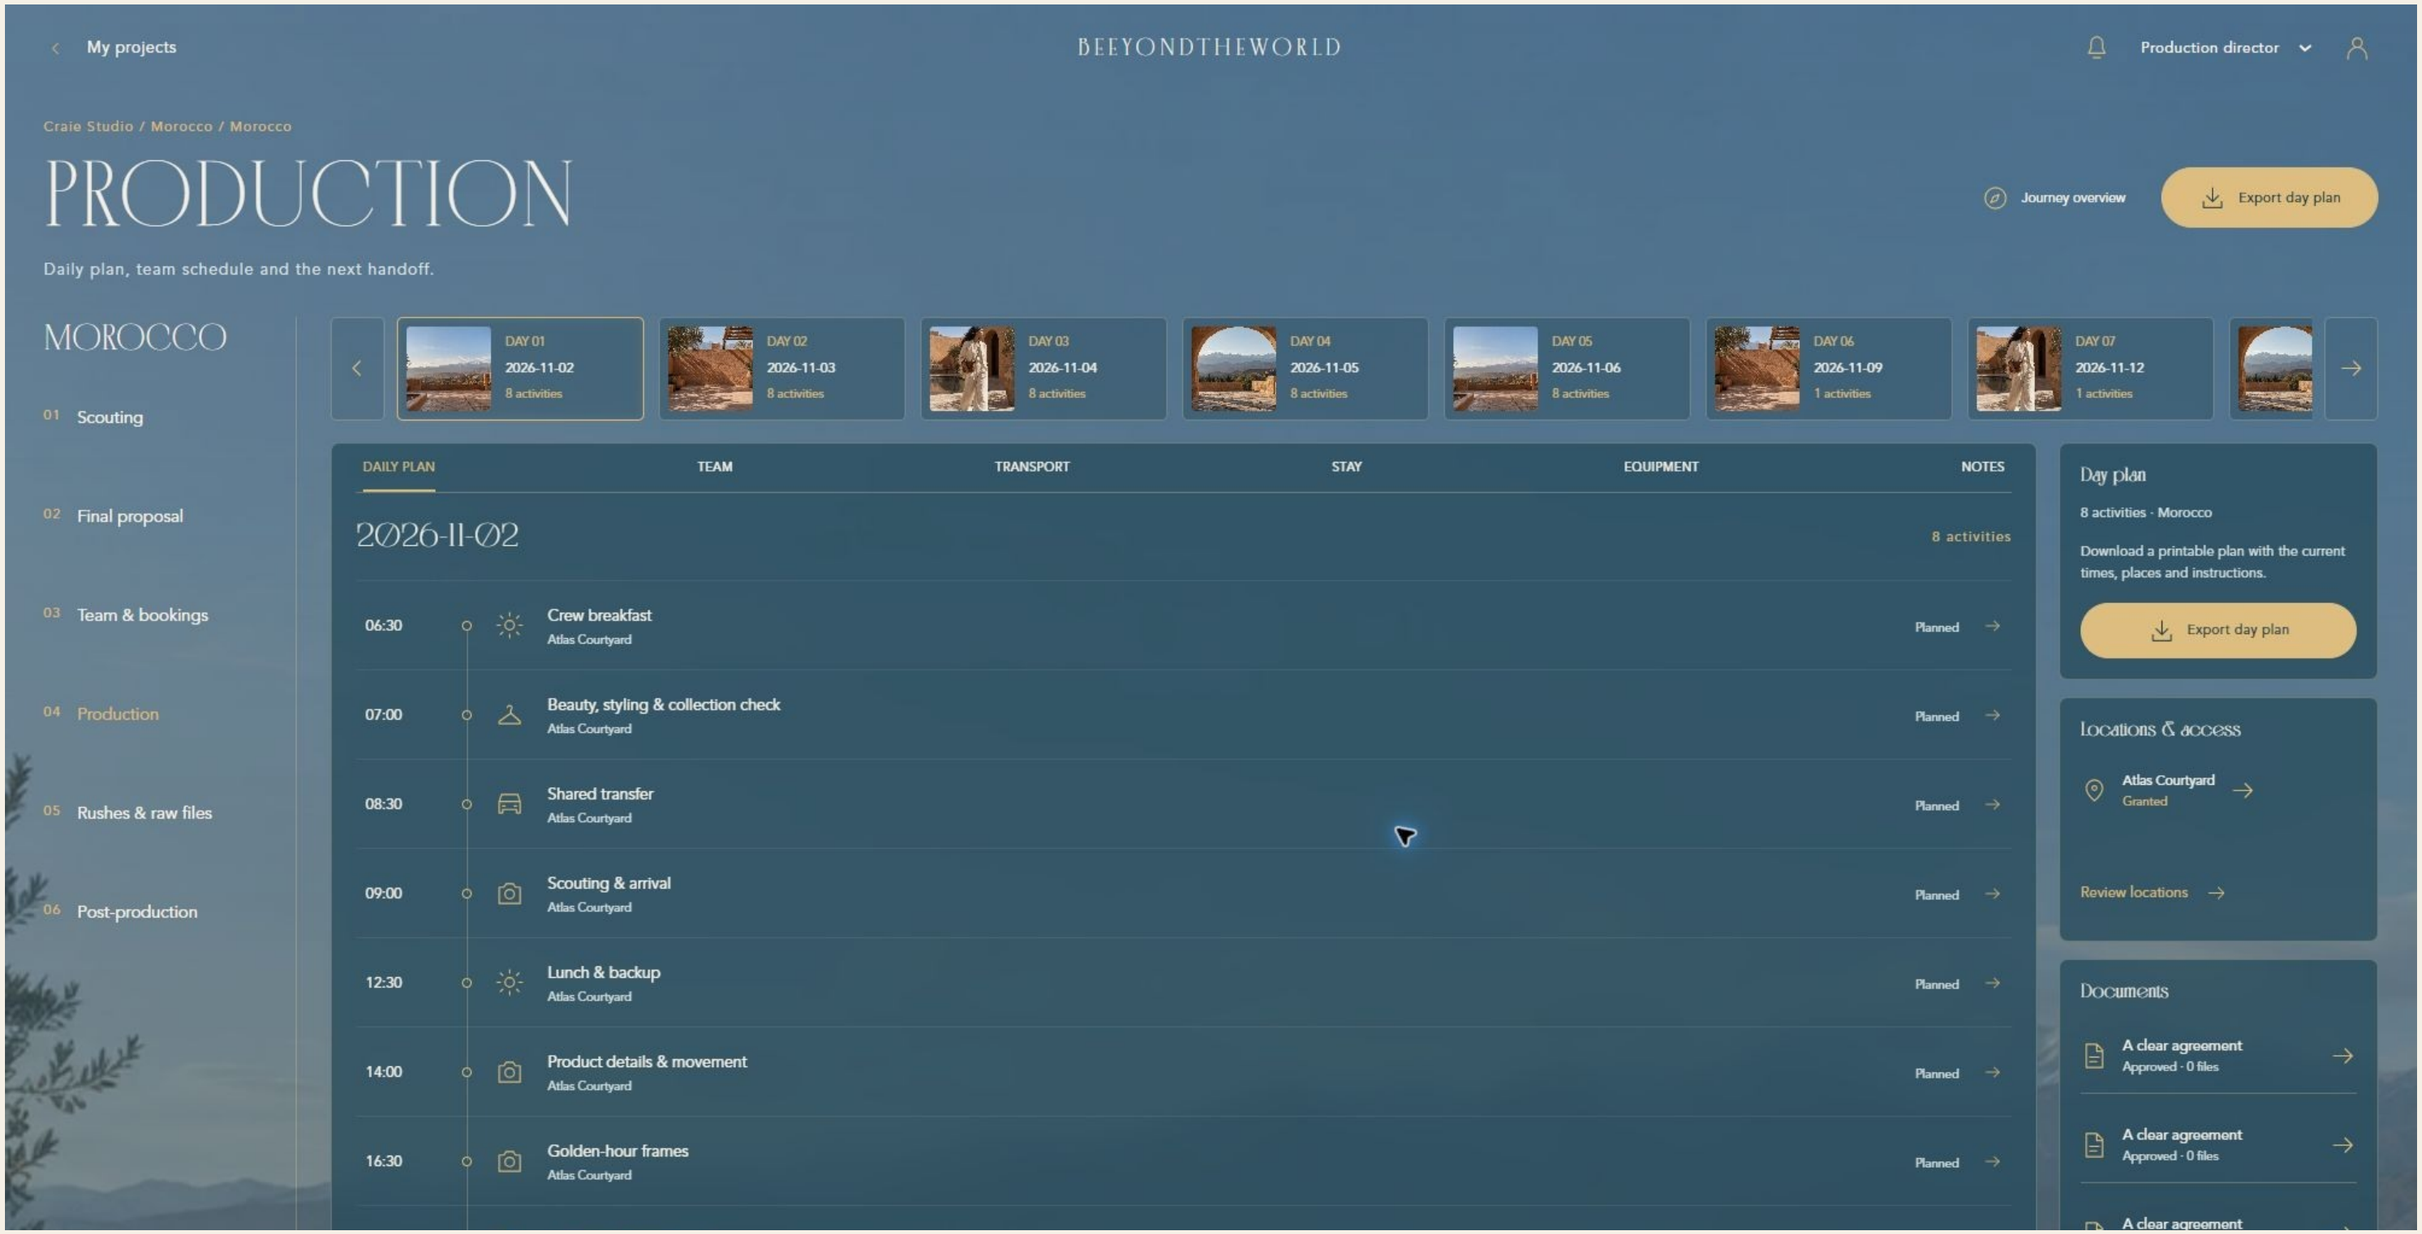

À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Préparer les informations et références affichées, vérifier leur cohérence avec le brief puis transmettre au responsable de l’étape.

CE QUI PASSE À LA SUITE

On suit les versions, les raccords, les justificatifs et les incidents. Production, DA et équipe image.

07 / FLOWER : LA PRODUCTION • 4-6 NOVEMBRE

Feuille de service · 2/2

Préparer / compléter

À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Préparer les informations et références affichées, vérifier leur cohérence avec le brief puis transmettre au responsable de l'étape.

CE QUI PASSE À LA SUITE

On suit les versions, les raccords, les justificatifs et les incidents. Production, DA et équipe image.

07 / FLOWER : LA PRODUCTION • 4-6 NOVEMBRE

Suivi des plans

Préparer / compléter

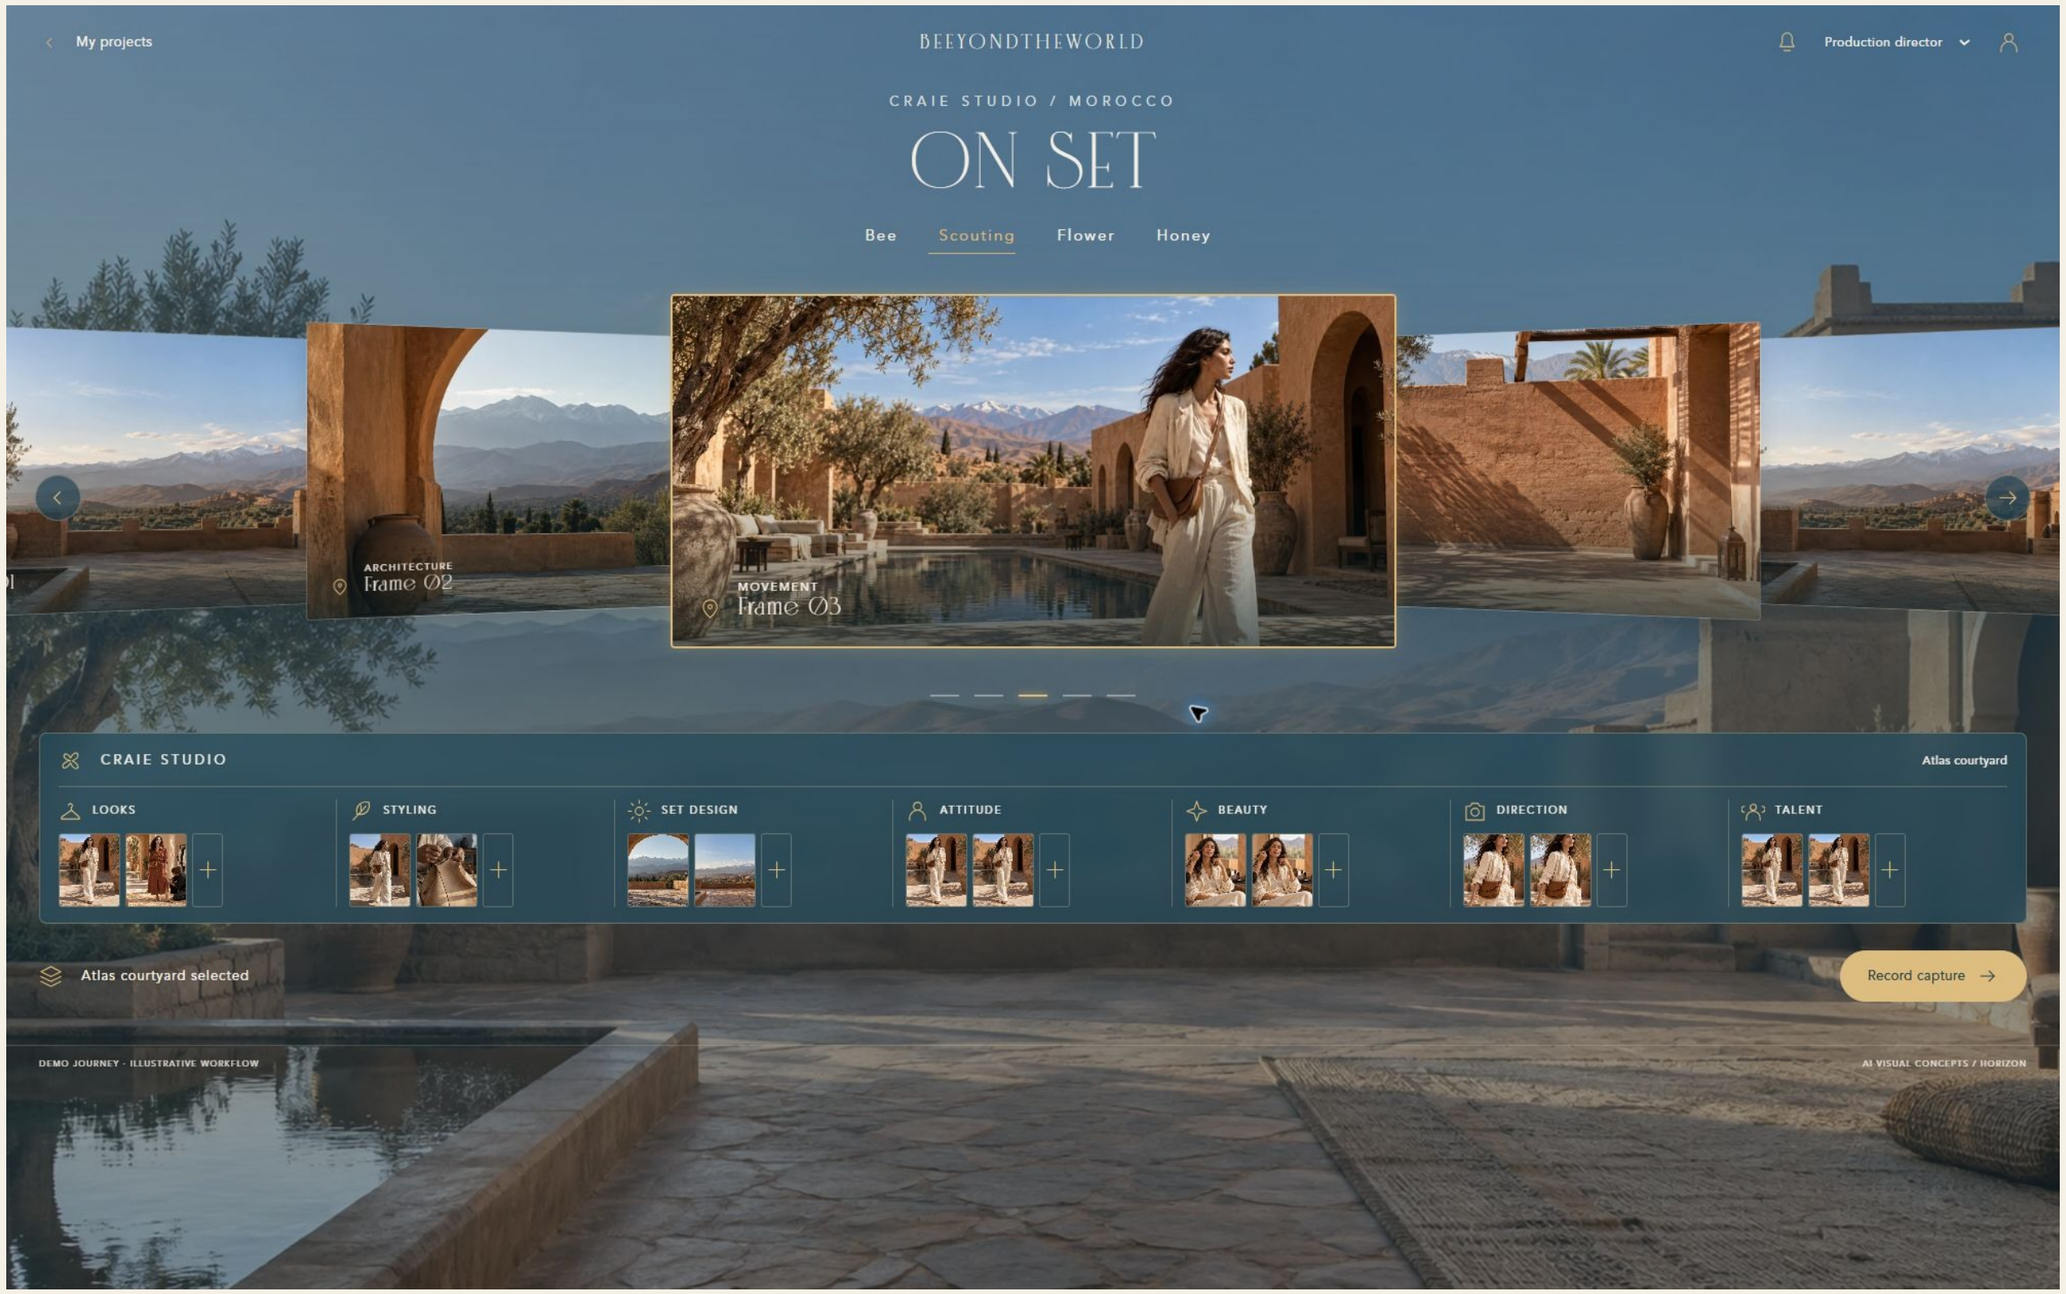

À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Préparer les informations et références affichées, vérifier leur cohérence avec le brief puis transmettre au responsable de l'étape.

CE QUI PASSE À LA SUITE

On suit les versions, les raccords, les justificatifs et les incidents. Production, DA et équipe image.

07 / FLOWER : LA PRODUCTION • 4-6 NOVEMBRE

Aperçus pendant le tournage

Consulter

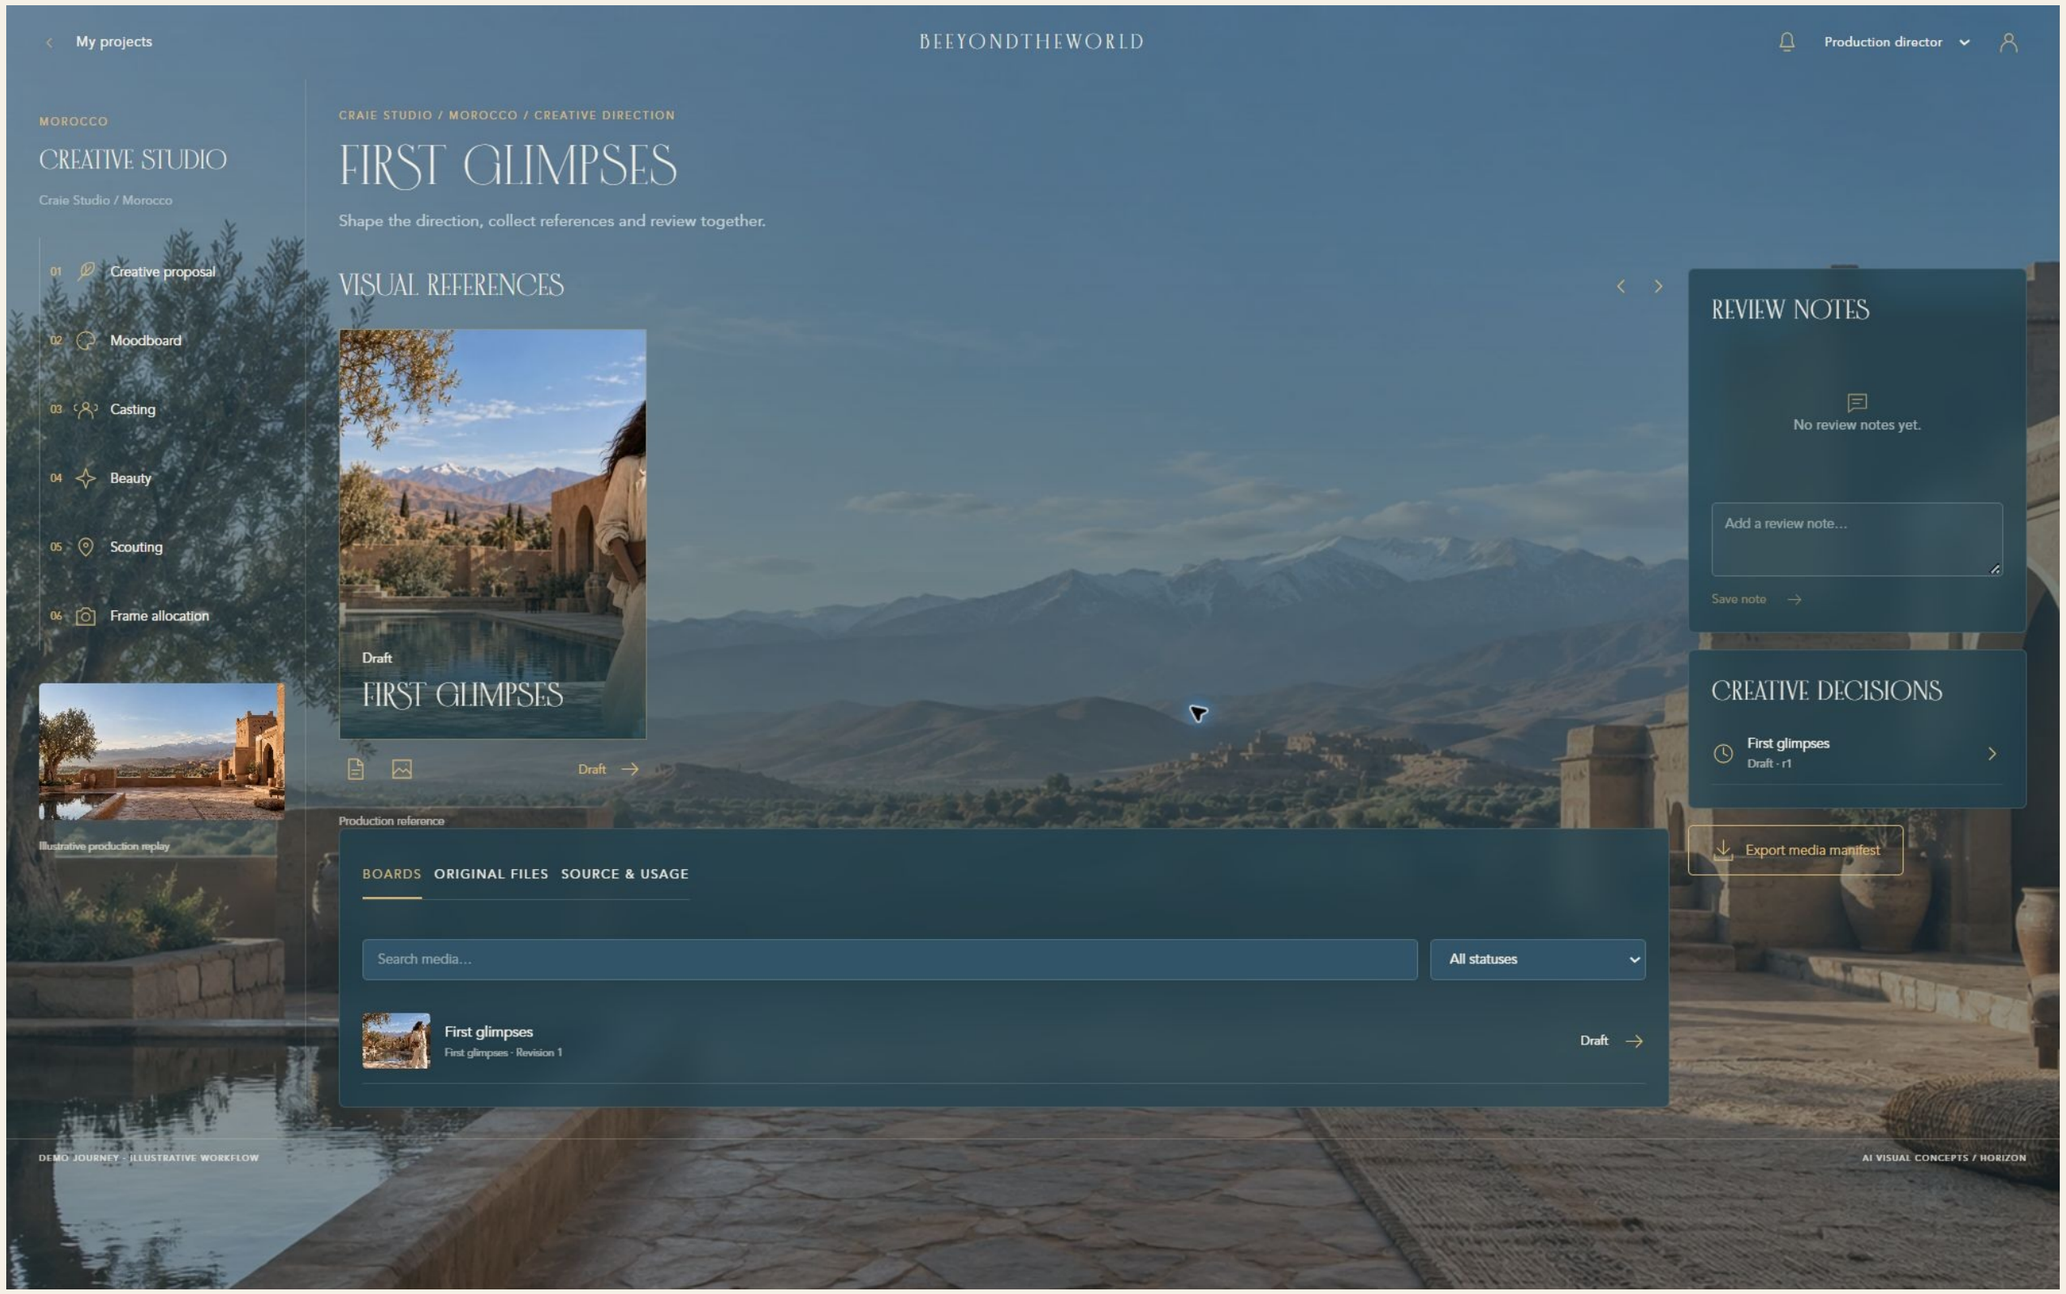

À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Lire les informations utiles à sa mission et vérifier la version. Transmettre une question au responsable de cette étape si un élément manque.

CE QUI PASSE À LA SUITE

On suit les versions, les raccords, les justificatifs et les incidents. Production, DA et équipe image.

07 / FLOWER : LA PRODUCTION • 4-6 NOVEMBRE

Backstage

Préparer / compléter

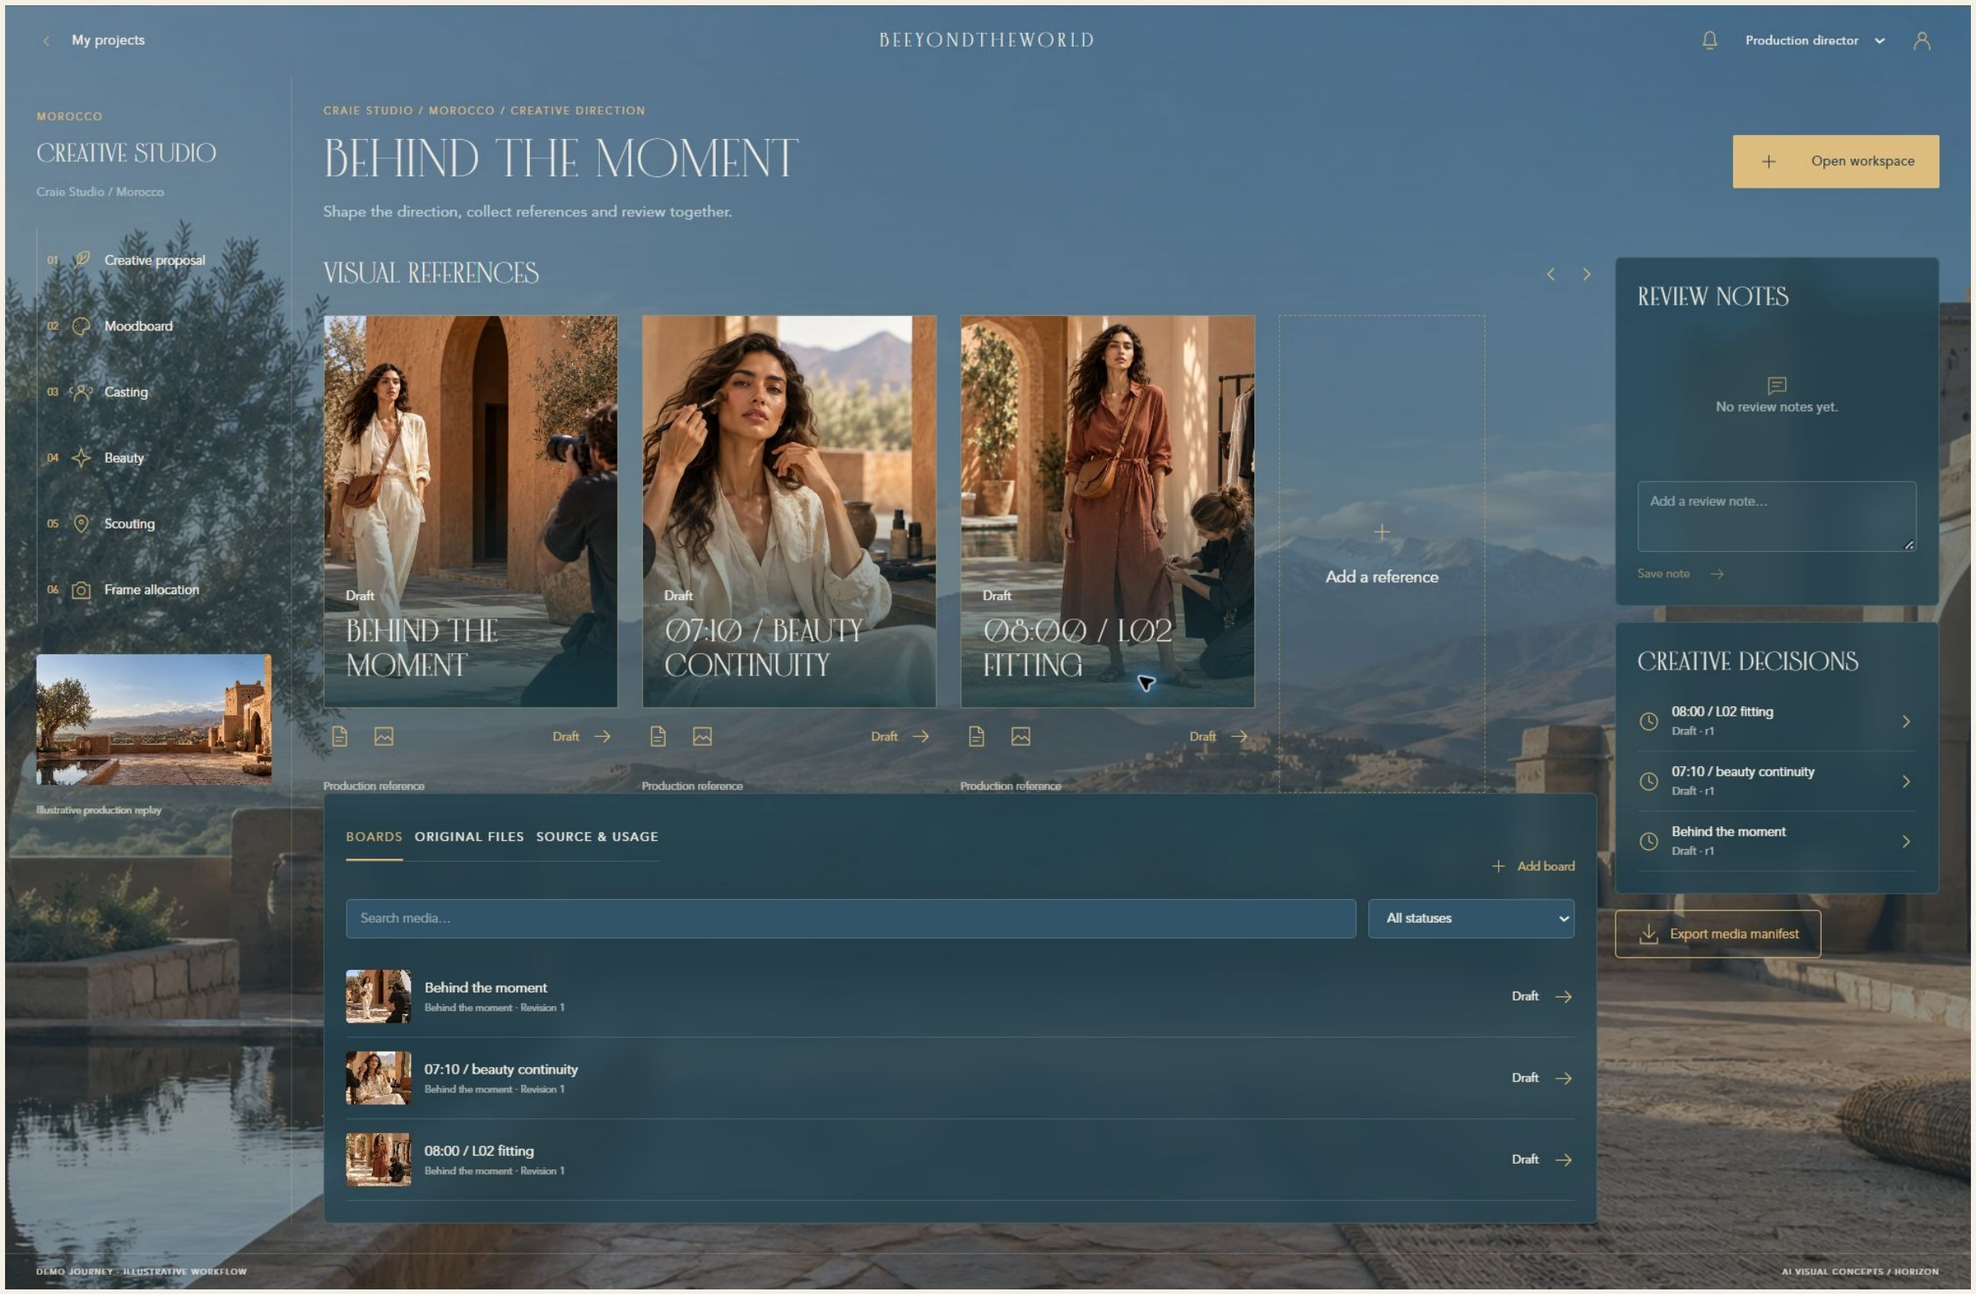

À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Préparer les informations et références affichées, vérifier leur cohérence avec le brief puis transmettre au responsable de l'étape.

CE QUI PASSE À LA SUITE

On suit les versions, les raccords, les justificatifs et les incidents. Production, DA et équipe image.

07 / FLOWER : LA PRODUCTION • 4-6 NOVEMBRE

Dépenses de production

Préparer / compléter

À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Préparer les informations et références affichées, vérifier leur cohérence avec le brief puis transmettre au responsable de l'étape.

CE QUI PASSE À LA SUITE

On suit les versions, les raccords, les justificatifs et les incidents. Production, DA et équipe image.

07 / FLOWER : LA PRODUCTION • 4-6 NOVEMBRE

Saisir une dépense

Préparer / compléter

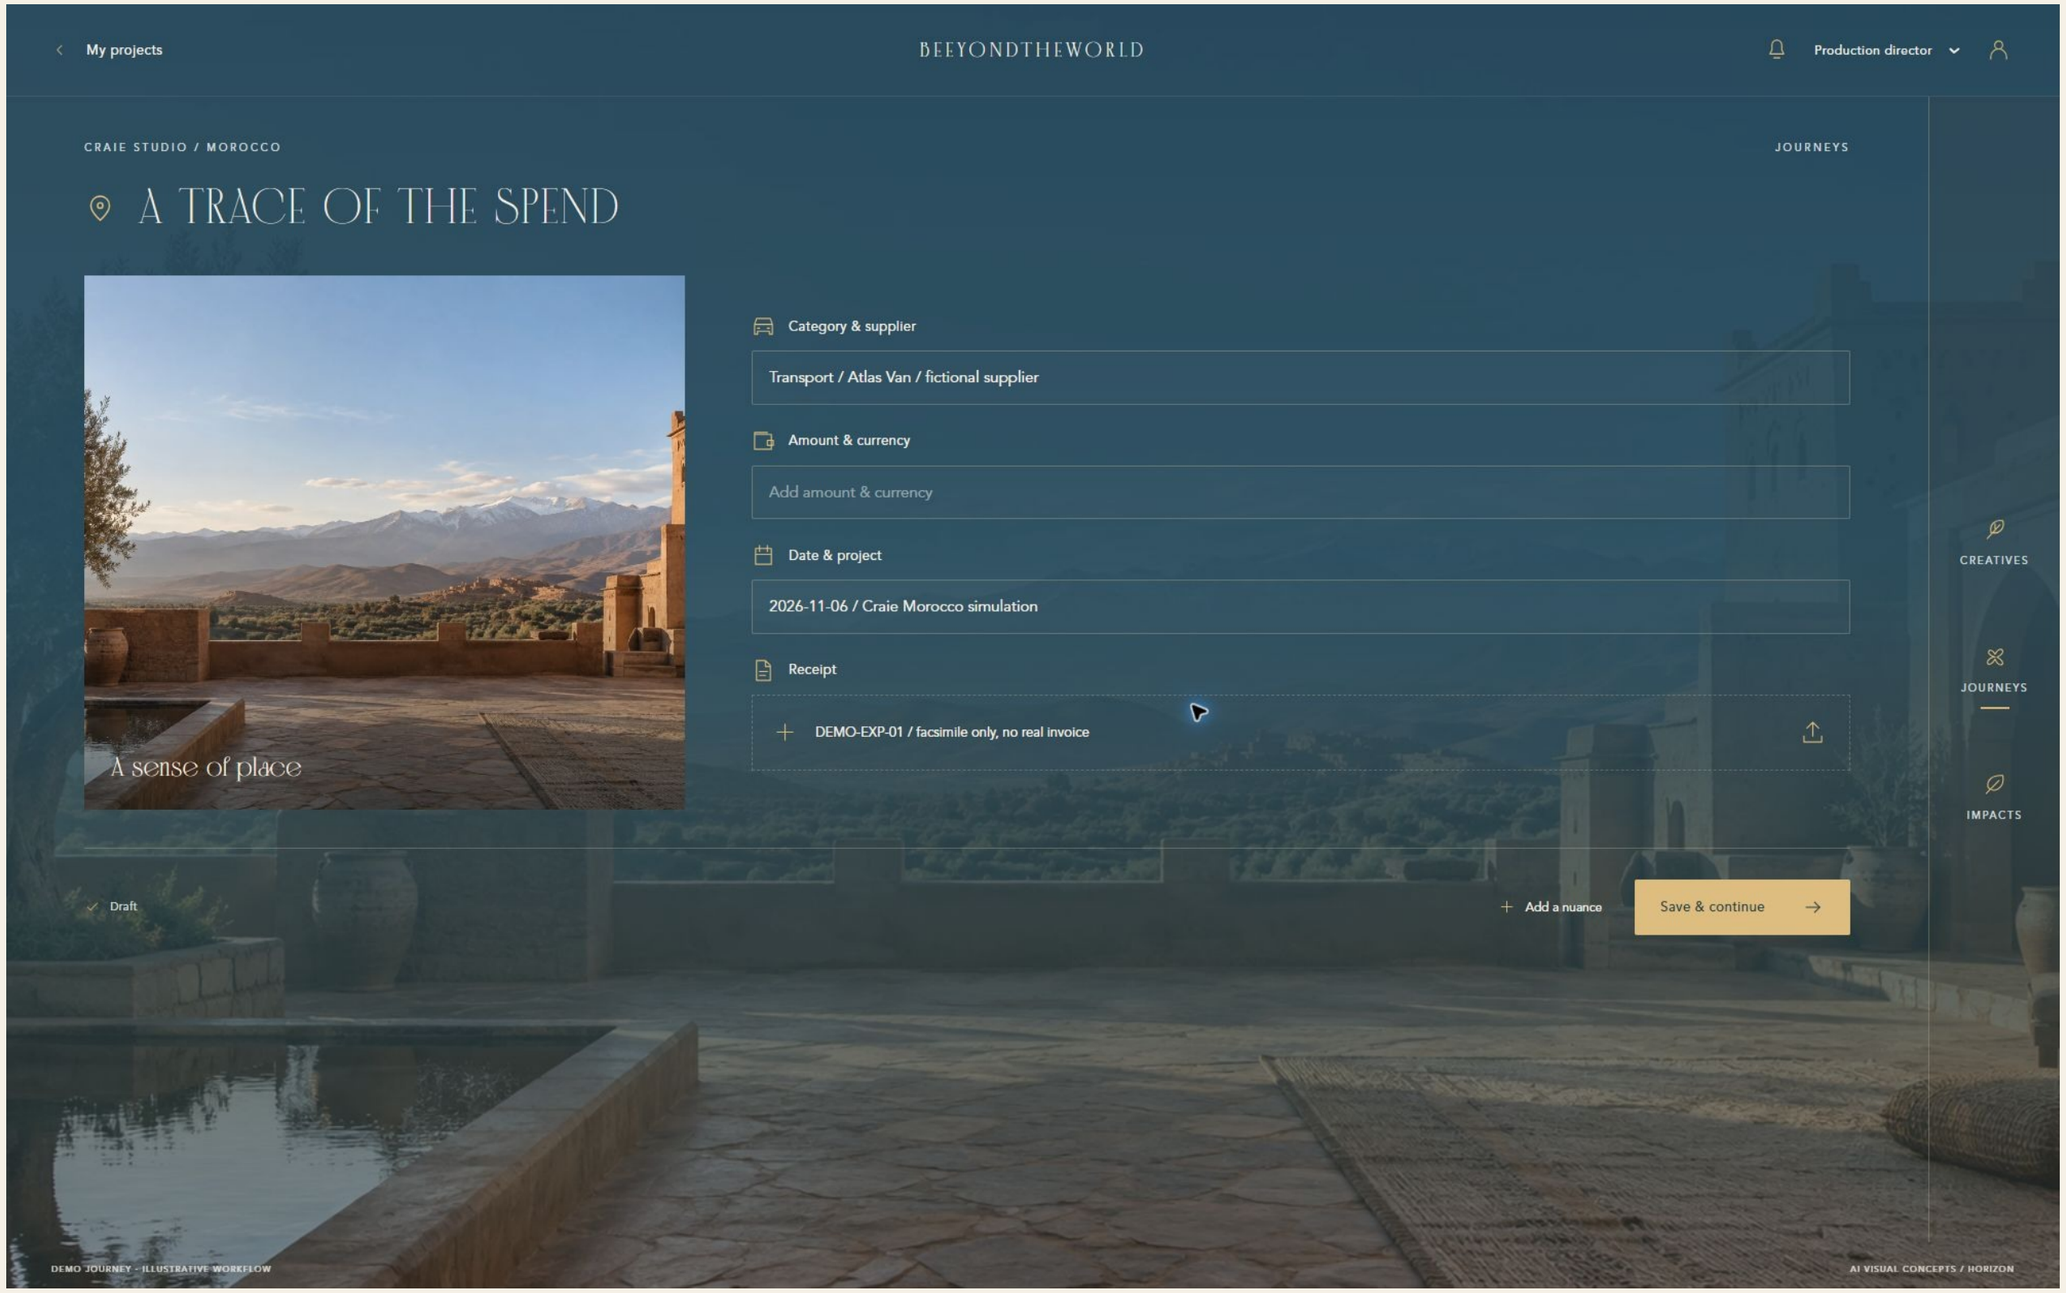

À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Préparer les informations et références affichées, vérifier leur cohérence avec le brief puis transmettre au responsable de l'étape.

CE QUI PASSE À LA SUITE

On suit les versions, les raccords, les justificatifs et les incidents. Production, DA et équipe image.

07 / FLOWER : LA PRODUCTION • 4-6 NOVEMBRE

Sources et sauvegardes

Préparer / compléter

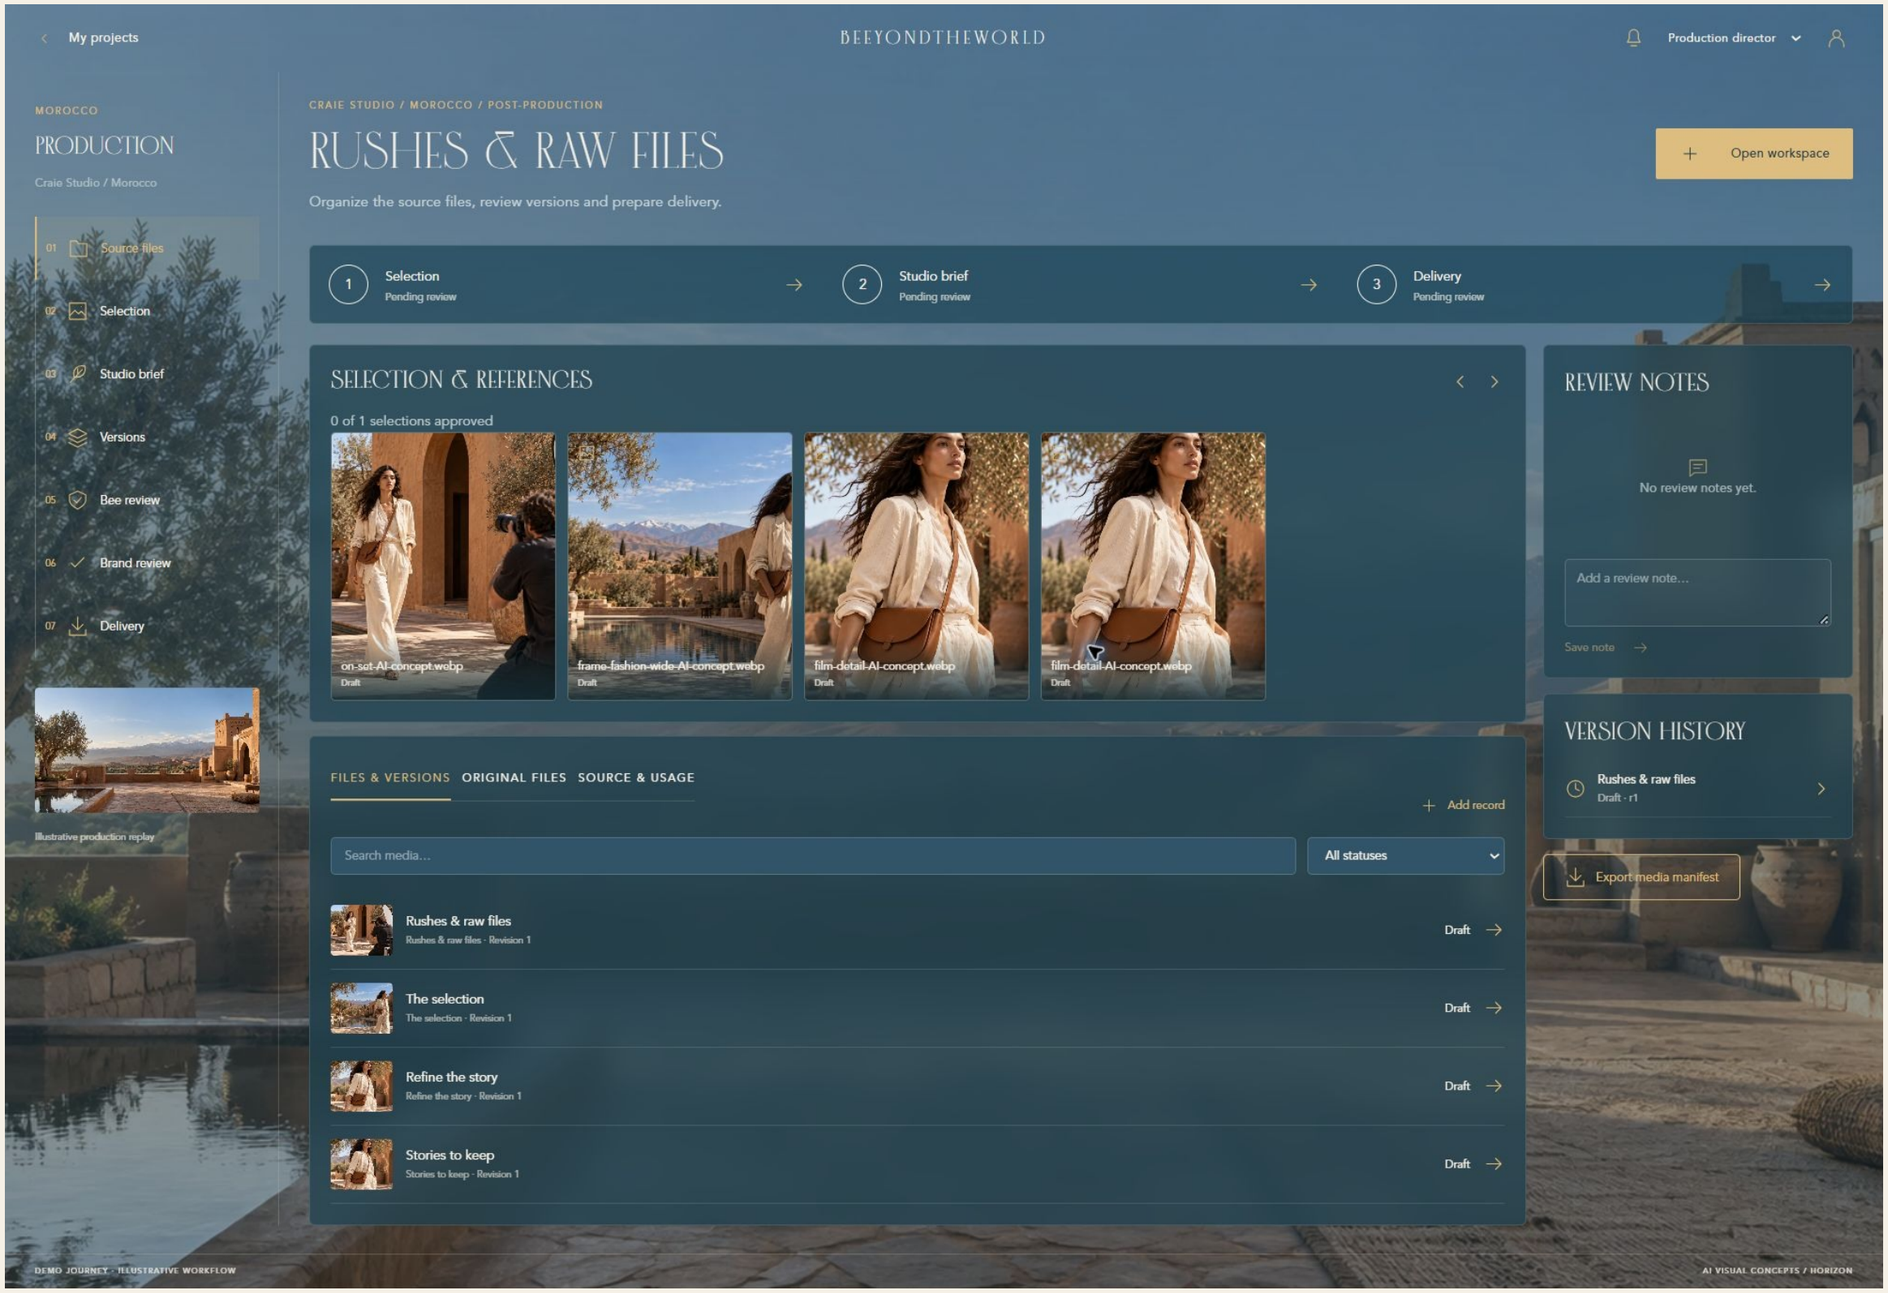

À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Préparer les informations et références affichées, vérifier leur cohérence avec le brief puis transmettre au responsable de l'étape.

CE QUI PASSE À LA SUITE

On suit les versions, les raccords, les justificatifs et les incidents. Production, DA et équipe image.

07 / FLOWER : LA PRODUCTION • 4-6 NOVEMBRE

Brief de postproduction

Préparer / compléter

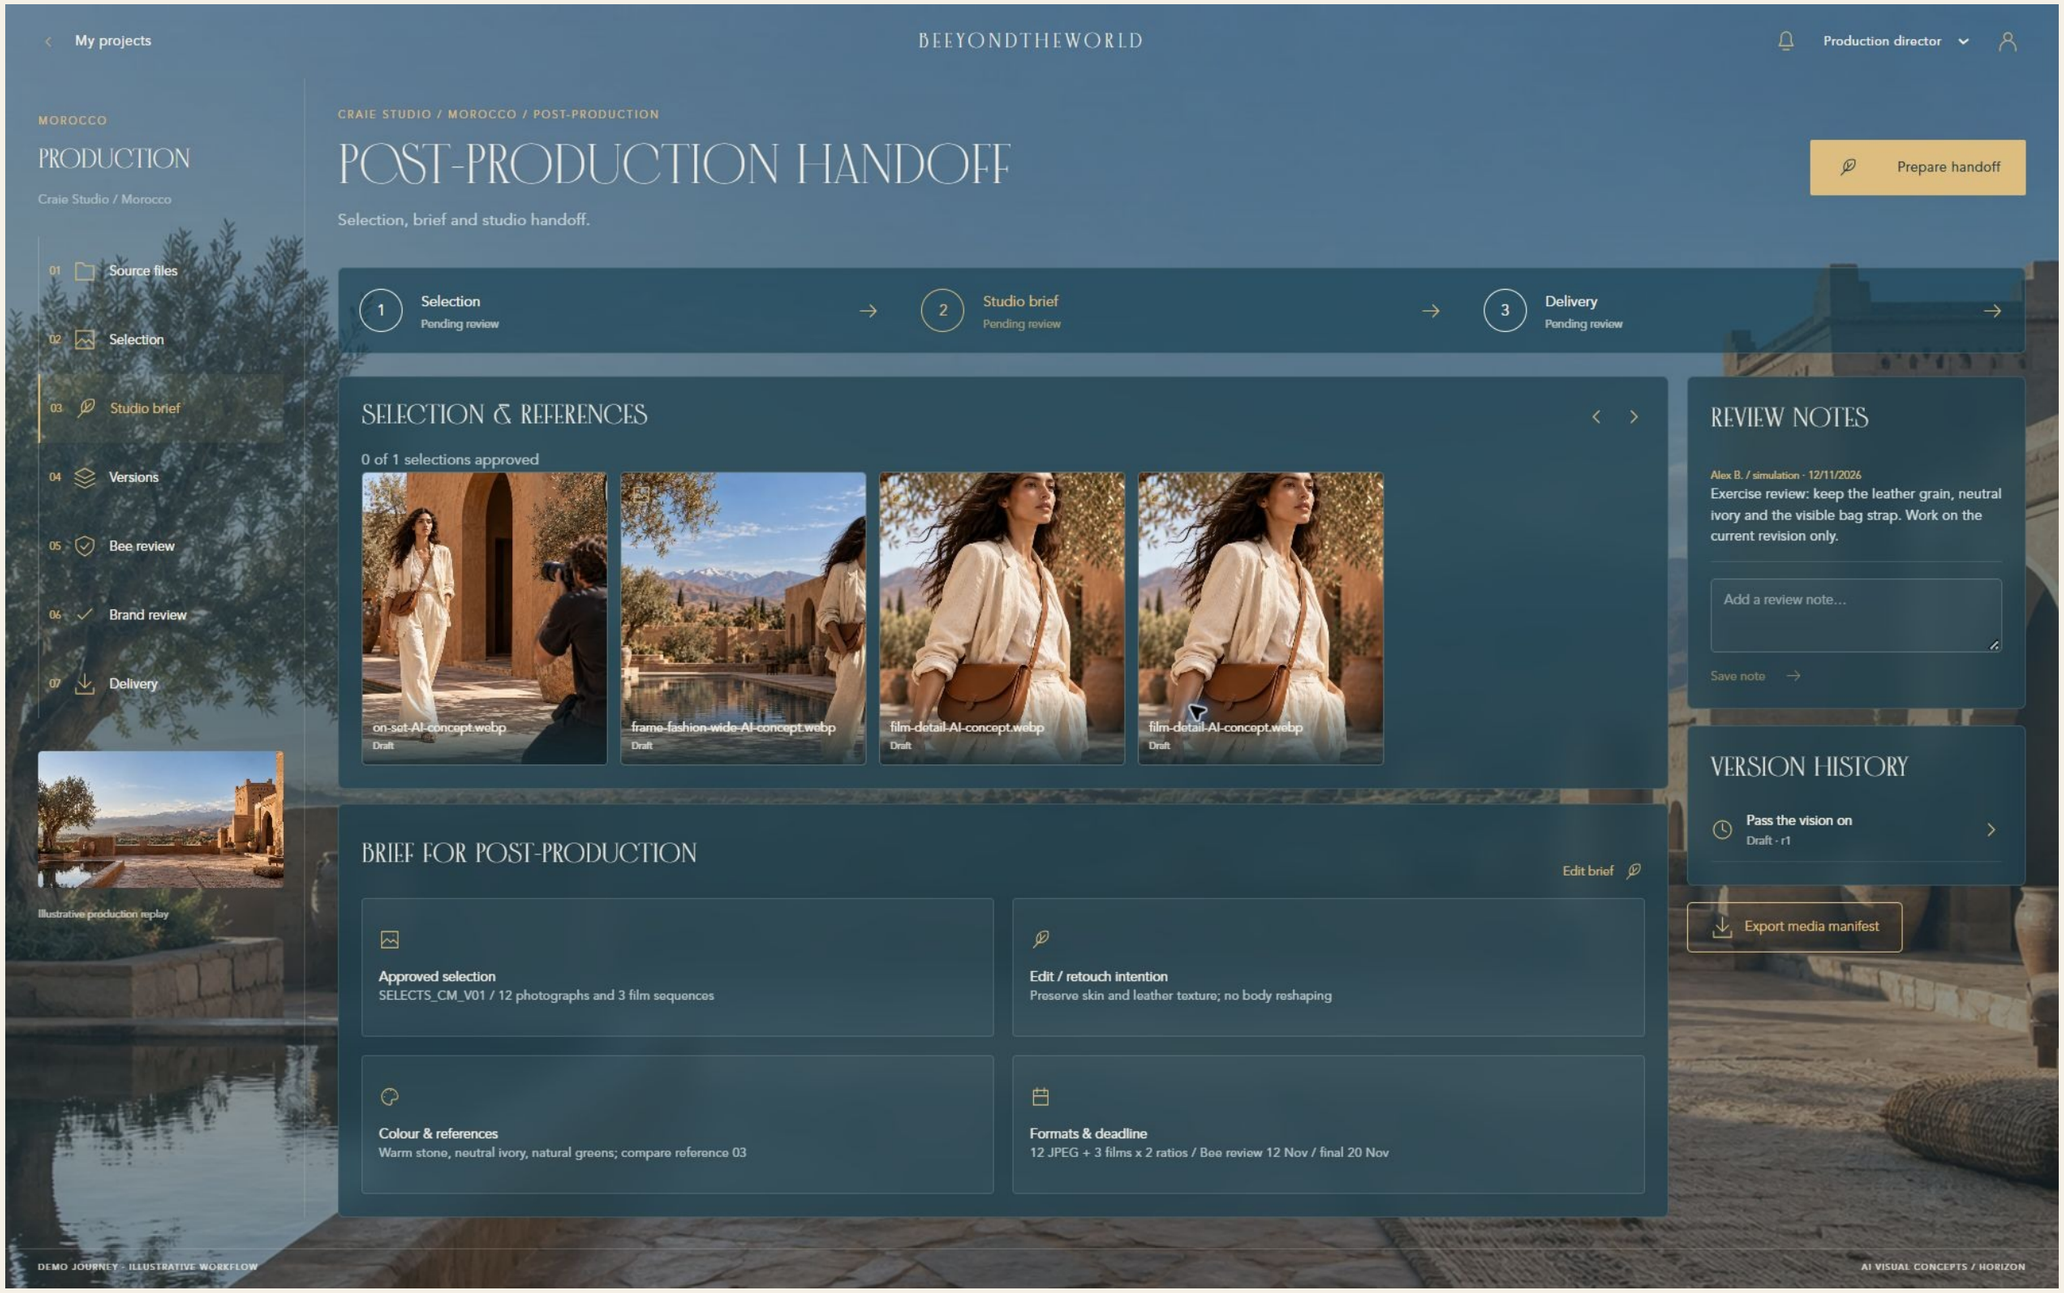

À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Préparer les informations et références affichées, vérifier leur cohérence avec le brief puis transmettre au responsable de l'étape.

CE QUI PASSE À LA SUITE

On suit les versions, les raccords, les justificatifs et les incidents. Production, DA et équipe image.

09 / MONTAGE, RETOUCHE ET VALIDATIONS • 9-16 NOVEMBRE

Planning de postproduction · 1/2

Préparer / compléter

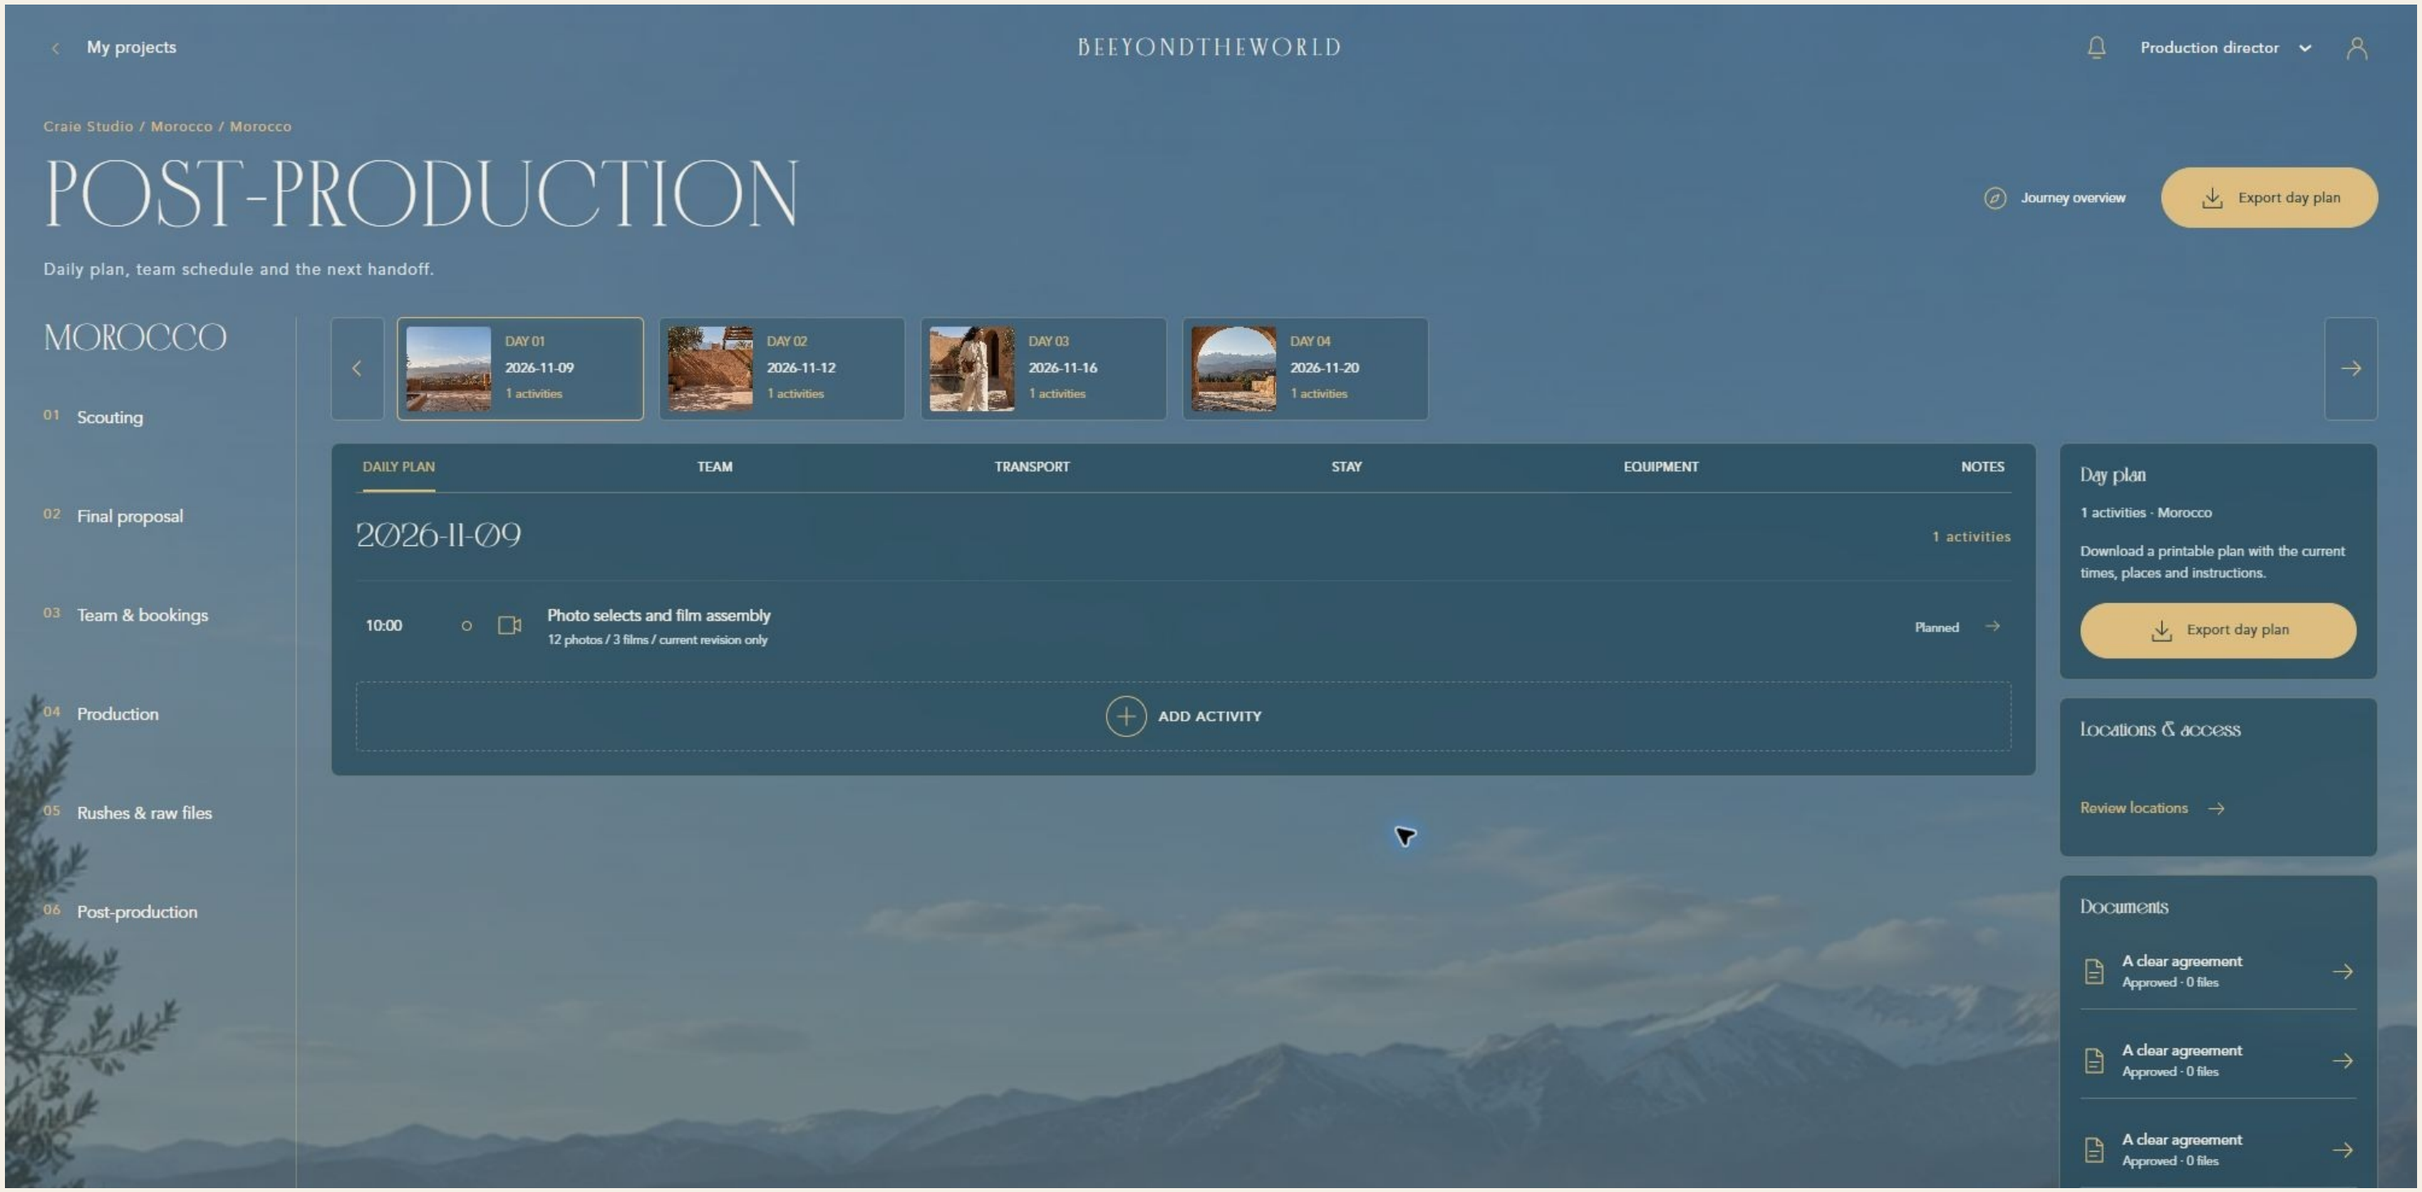

À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Préparer les informations et références affichées, vérifier leur cohérence avec le brief puis transmettre au responsable de l'étape.

CE QUI PASSE À LA SUITE

Si la source change, les validations liées doivent être réexaminées. Montage et retouche vers Bee, puis marque.

09 / MONTAGE, RETOUCHE ET VALIDATIONS • 9-16 NOVEMBRE

Planning de postproduction · 2/2

Préparer / compléter

À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Préparer les informations et références affichées, vérifier leur cohérence avec le brief puis transmettre au responsable de l'étape.

CE QUI PASSE À LA SUITE

Si la source change, les validations liées doivent être réexaminées. Montage et retouche vers Bee, puis marque.

09 / MONTAGE, RETOUCHE ET VALIDATIONS • 9-16 NOVEMBRE

Sélection des images

Consulter

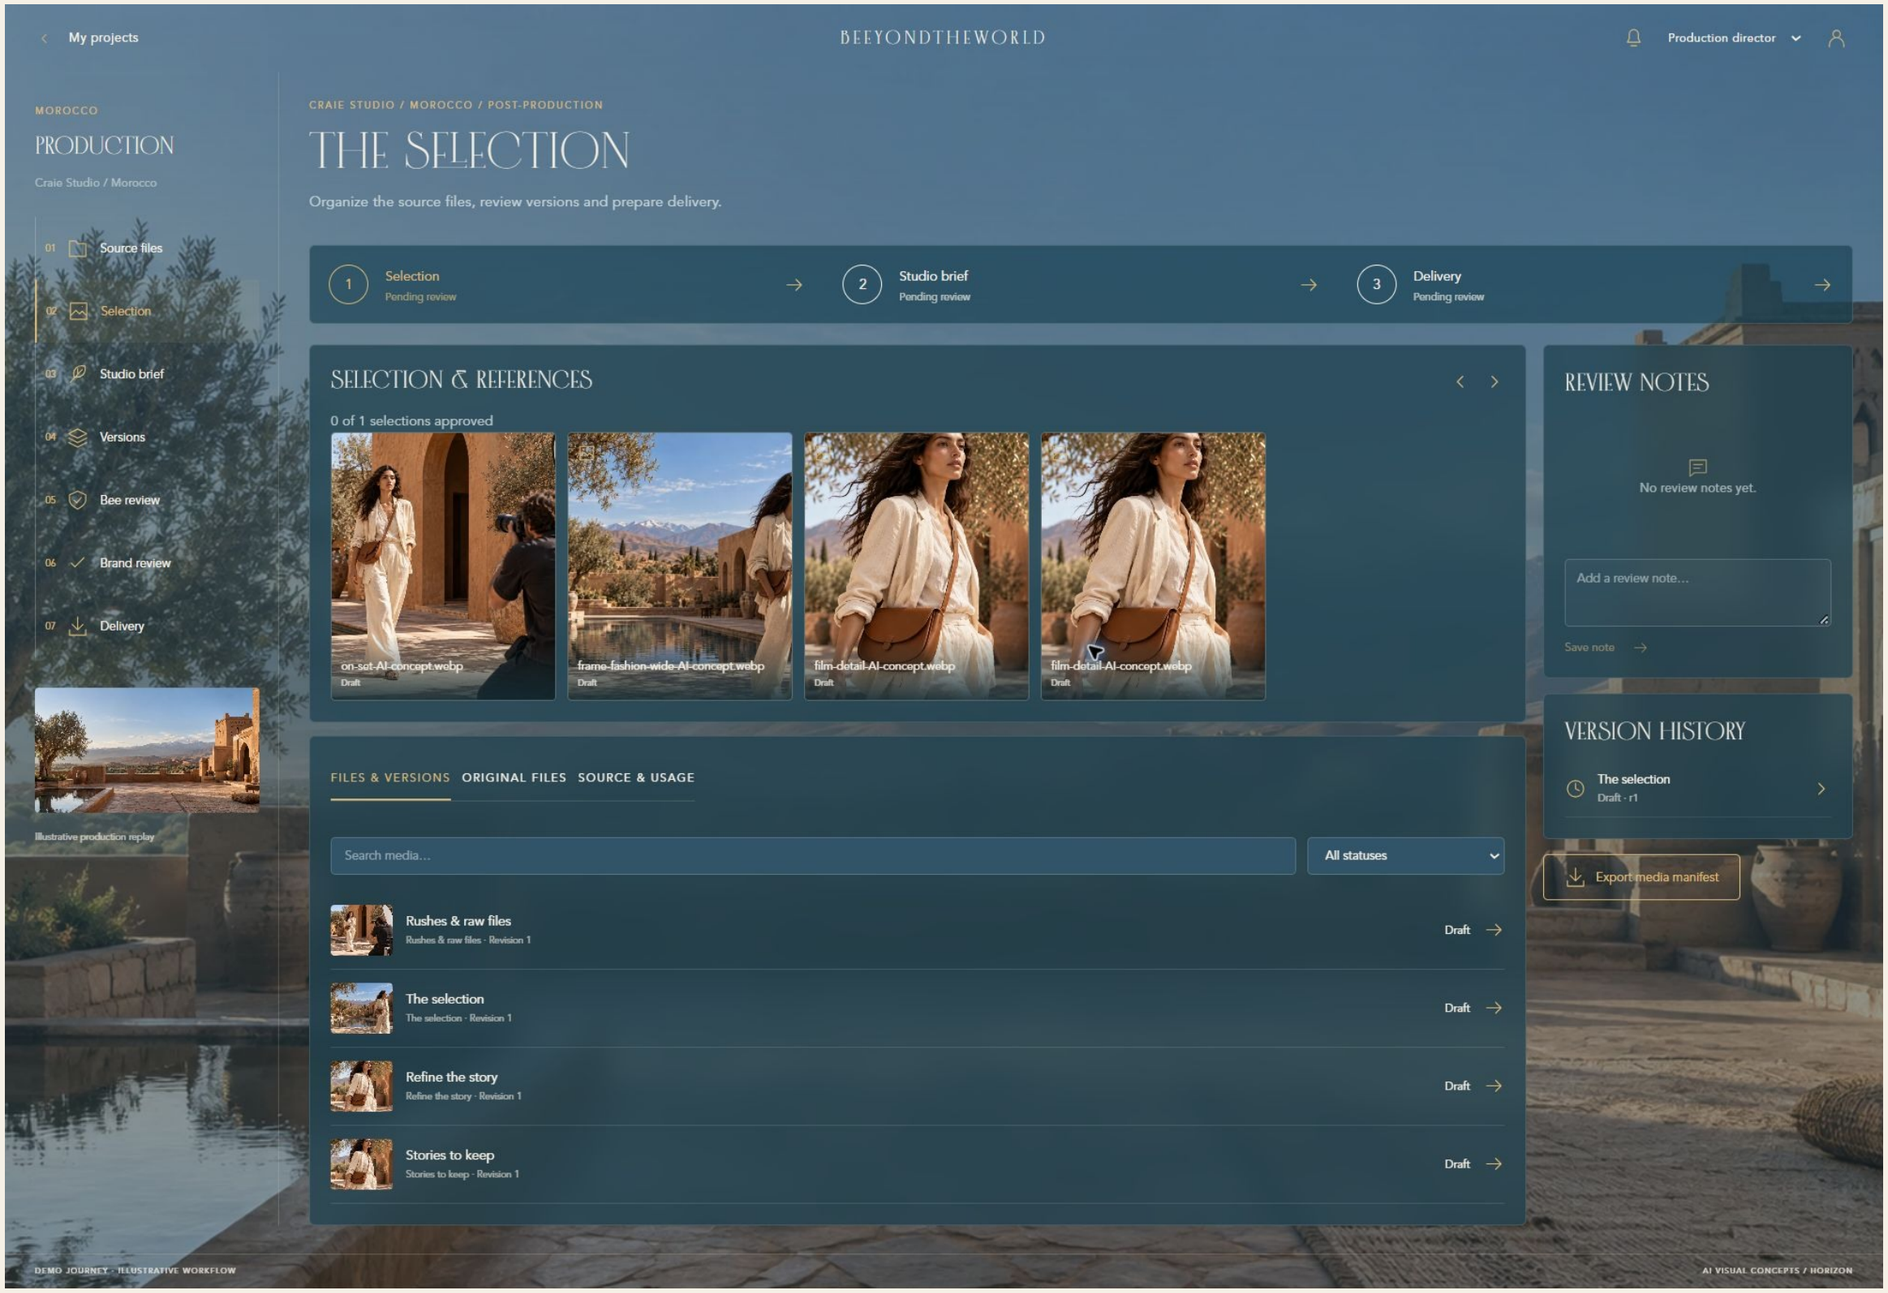

À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Lire les informations utiles à sa mission et vérifier la version. Transmettre une question au responsable de cette étape si un élément manque.

CE QUI PASSE À LA SUITE

Si la source change, les validations liées doivent être réexaminées. Montage et retouche vers Bee, puis marque.

09 / MONTAGE, RETOUCHE ET VALIDATIONS • 9-16 NOVEMBRE

Version et retouches

Consulter

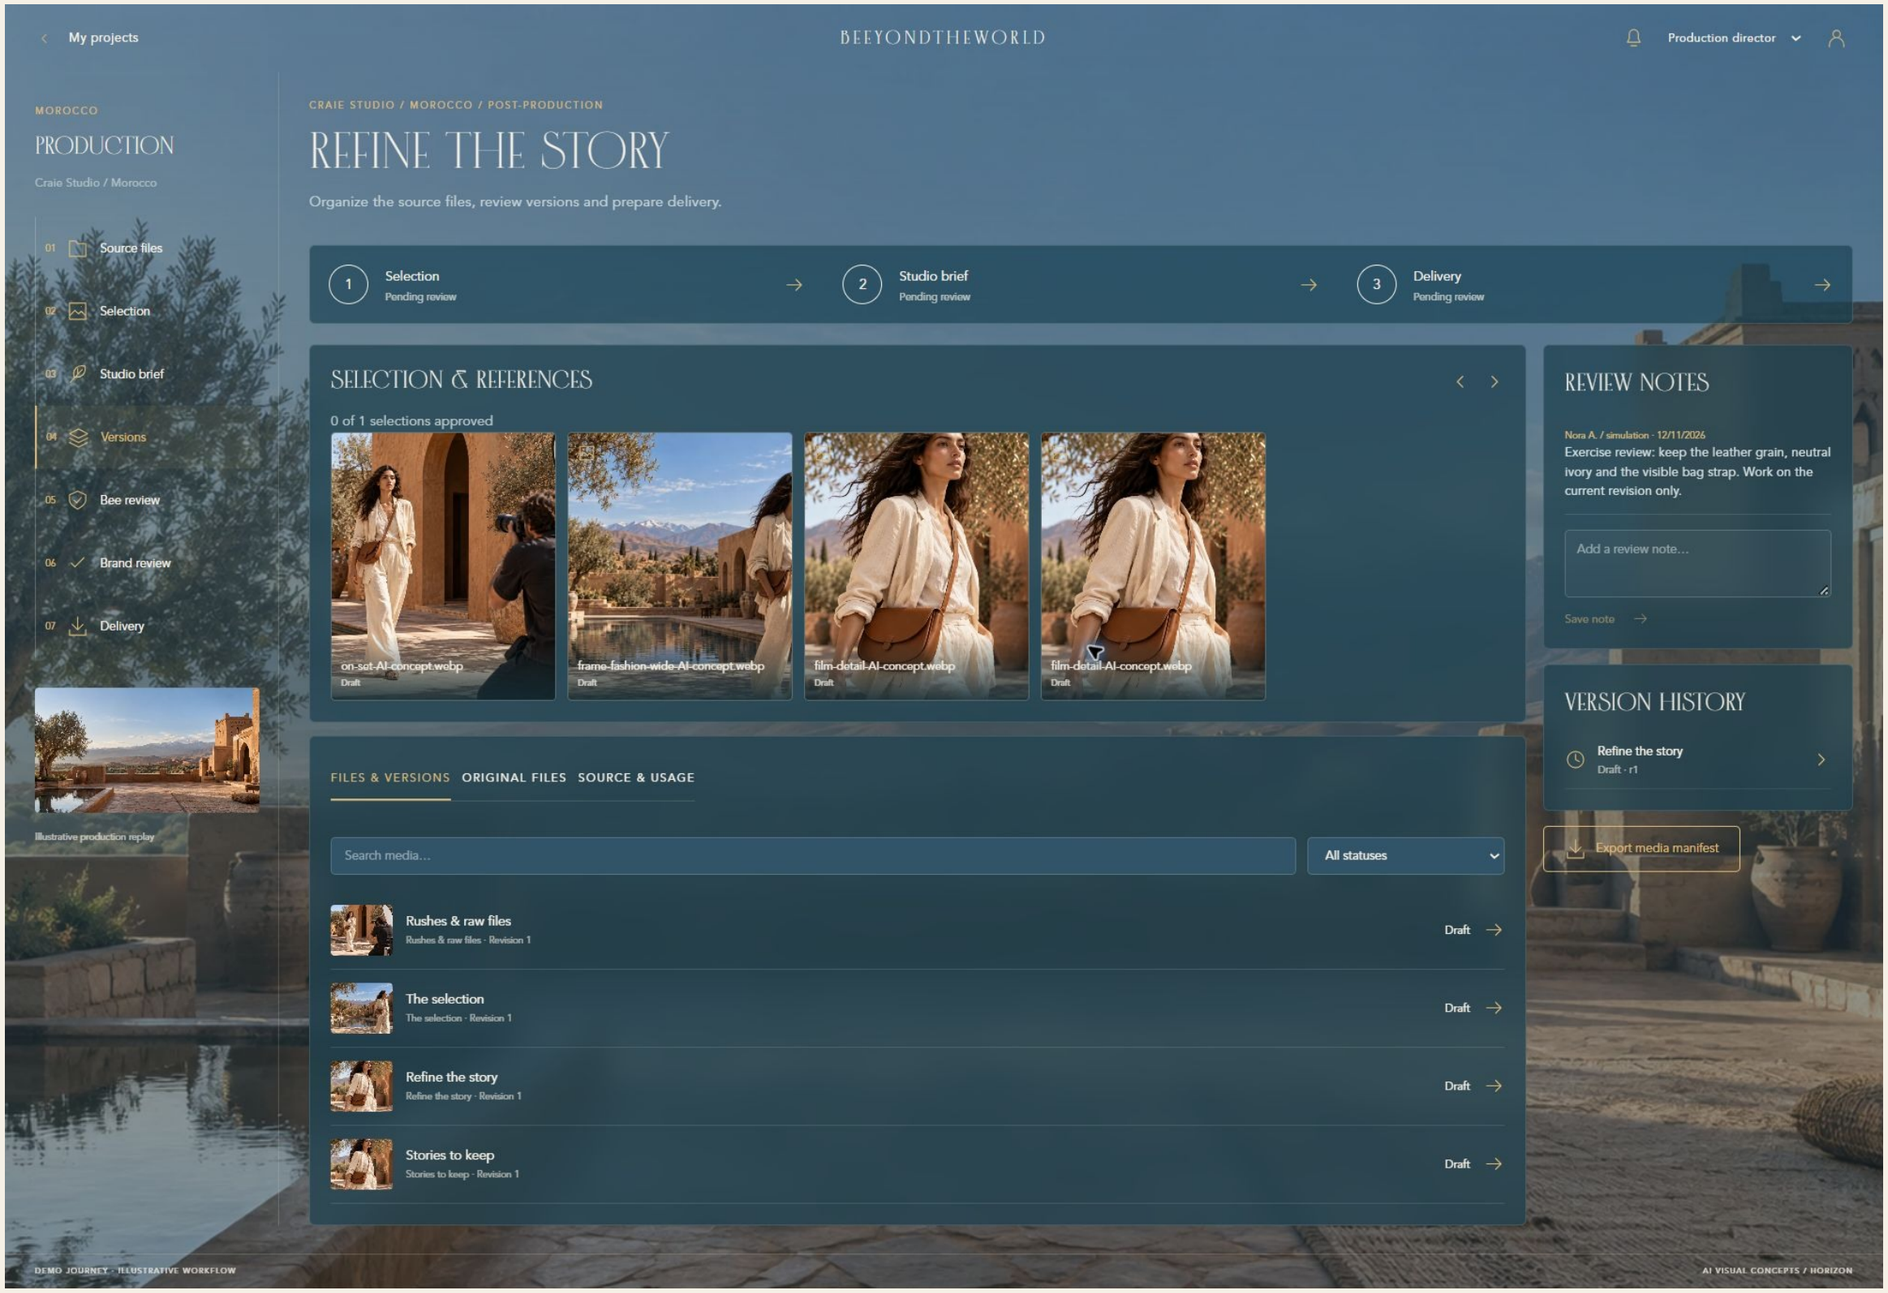

À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Lire les informations utiles à sa mission et vérifier la version. Transmettre une question au responsable de cette étape si un élément manque.

CE QUI PASSE À LA SUITE

Si la source change, les validations liées doivent être réexaminées. Montage et retouche vers Bee, puis marque.

09 / MONTAGE, RETOUCHE ET VALIDATIONS • 9-16 NOVEMBRE

Revue créative Bee

Consulter

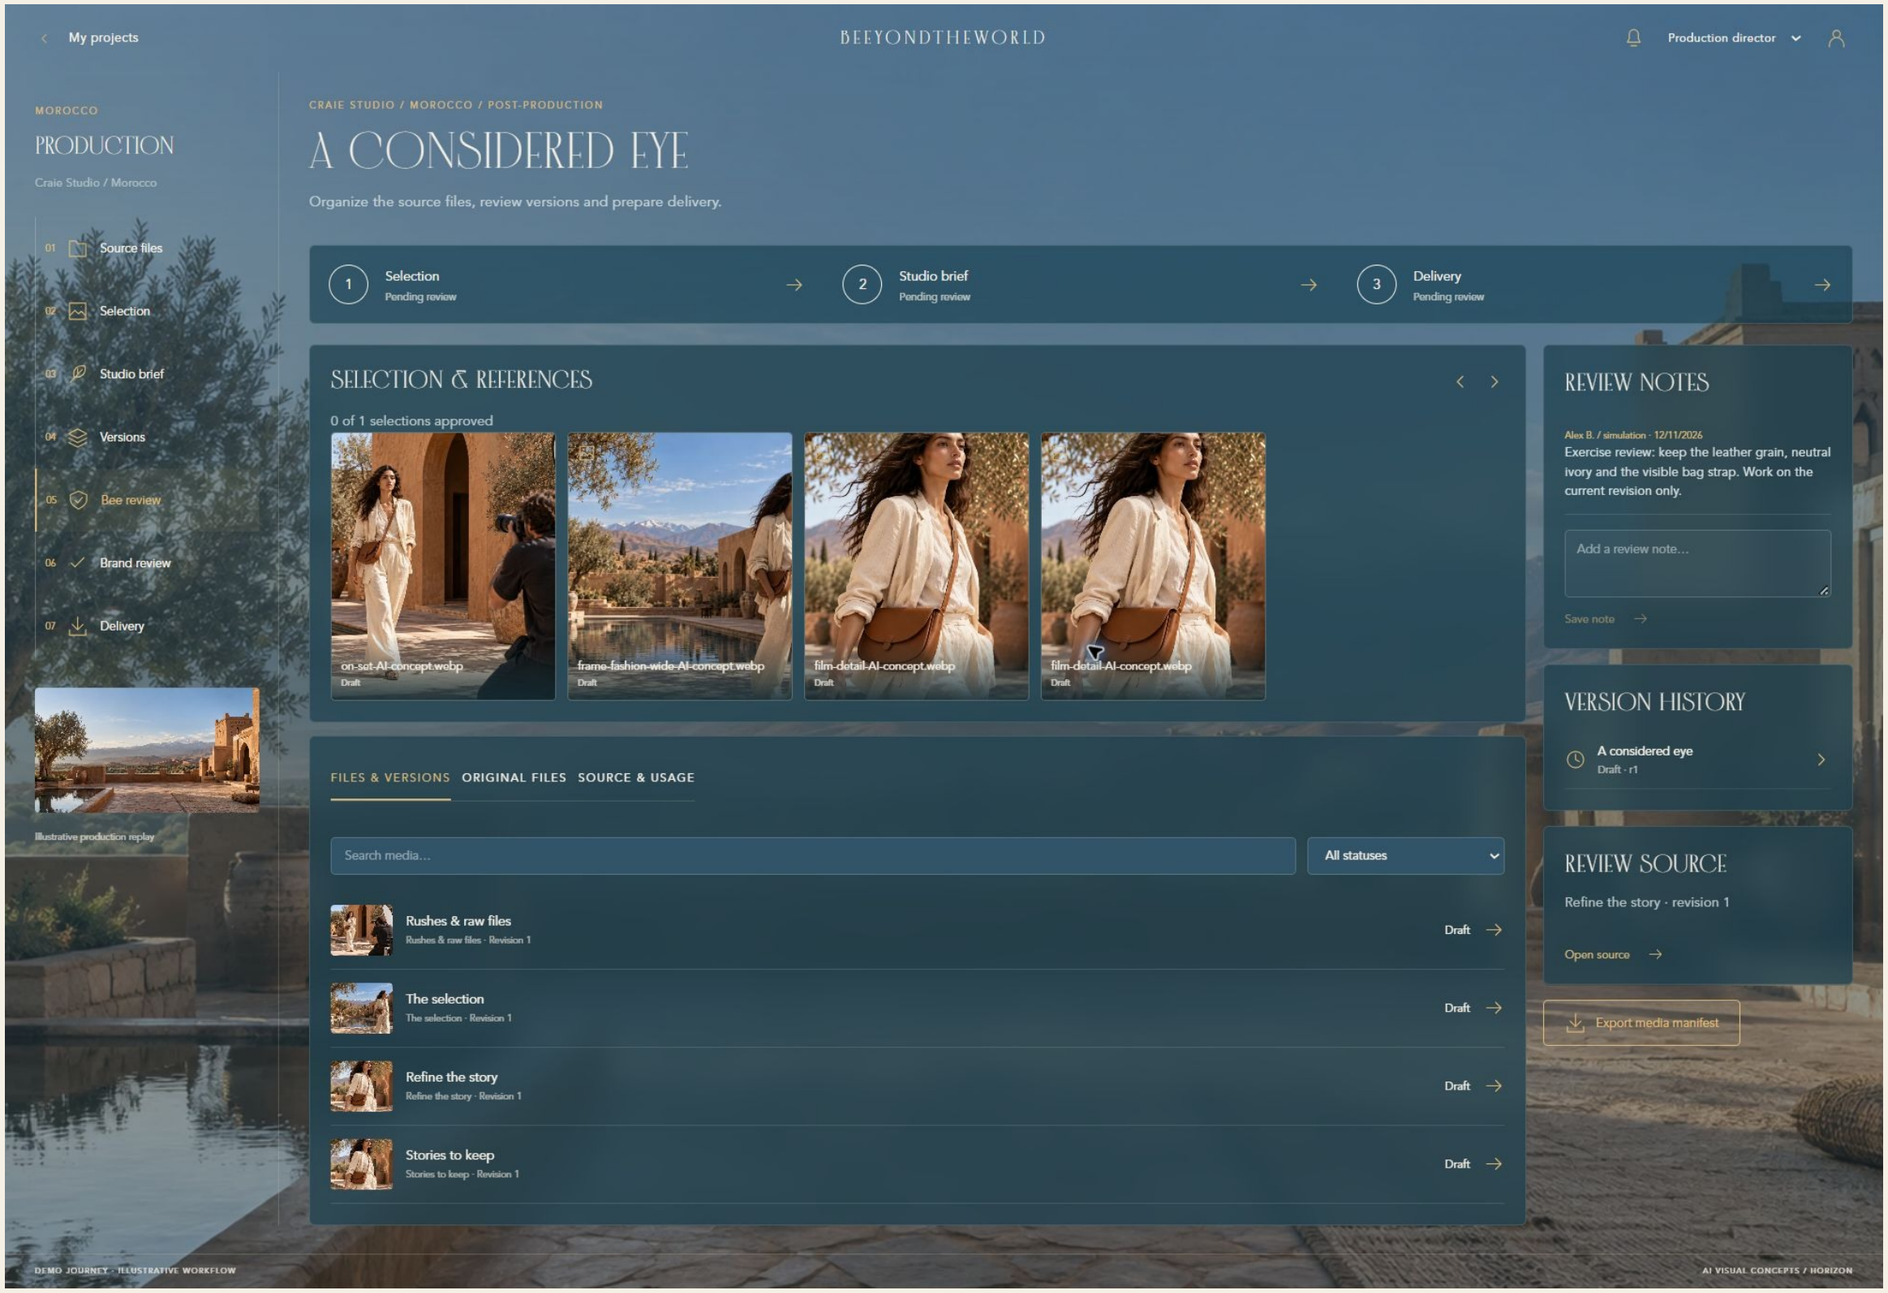

À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Contrôler la version, les remarques et la conformité au brief. Seule une version examinée par Bee passe ensuite à la marque.

CE QUI PASSE À LA SUITE

Si la source change, les validations liées doivent être réexaminées. Montage et retouche vers Bee, puis marque.

09 / MONTAGE, RETOUCHE ET VALIDATIONS • 9-16 NOVEMBRE

Validation de la marque

Consulter

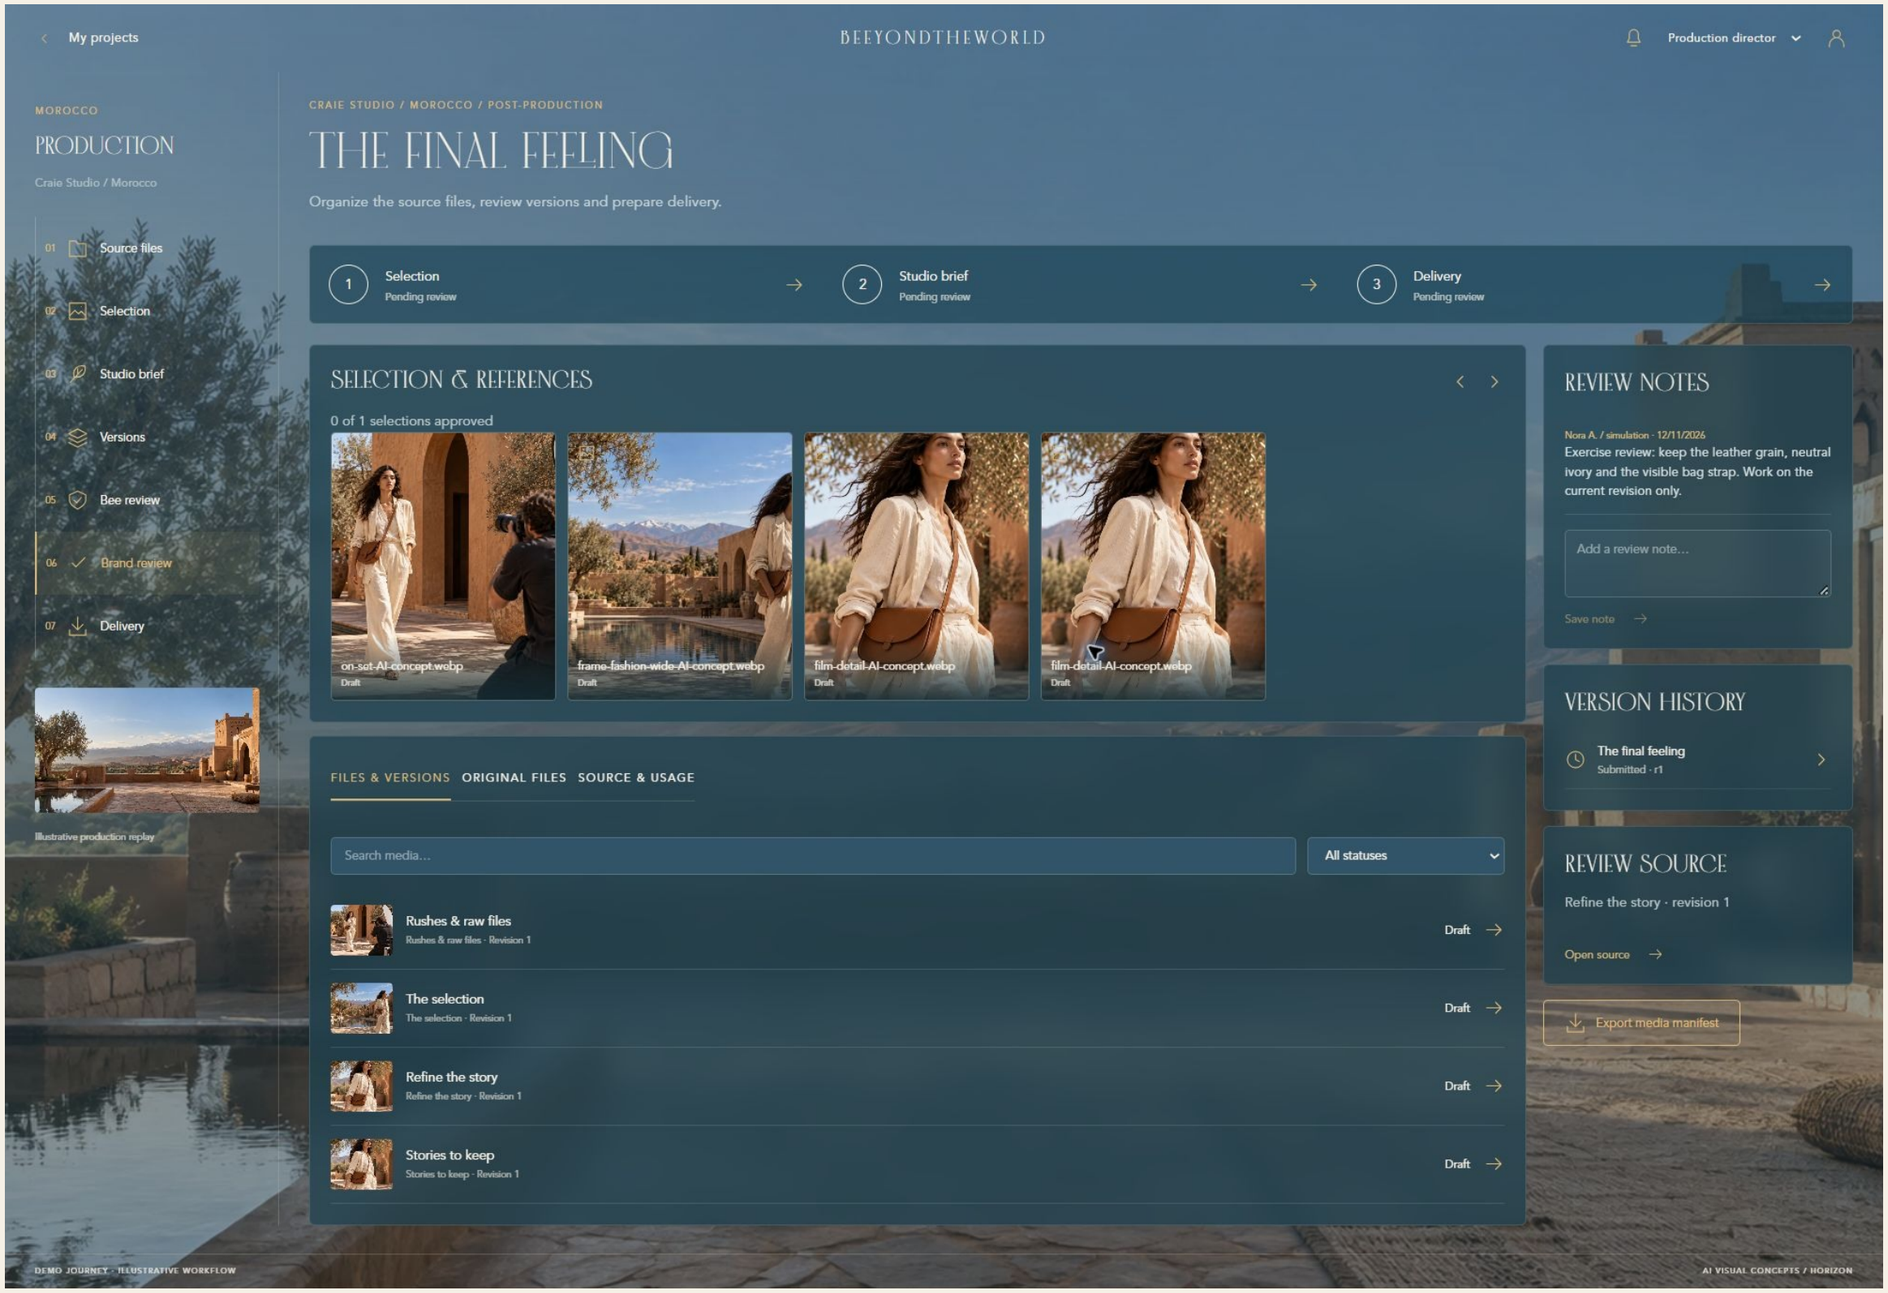

À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Comparer la version reçue au brief. Accepter la création ou préciser une correction exploitable, en restant sur la même révision.

CE QUI PASSE À LA SUITE

Si la source change, les validations liées doivent être réexaminées. Montage et retouche vers Bee, puis marque.

10 / LIVRAISON ET ARCHIVAGE • 20 NOVEMBRE

Livraison des masters

Préparer / compléter

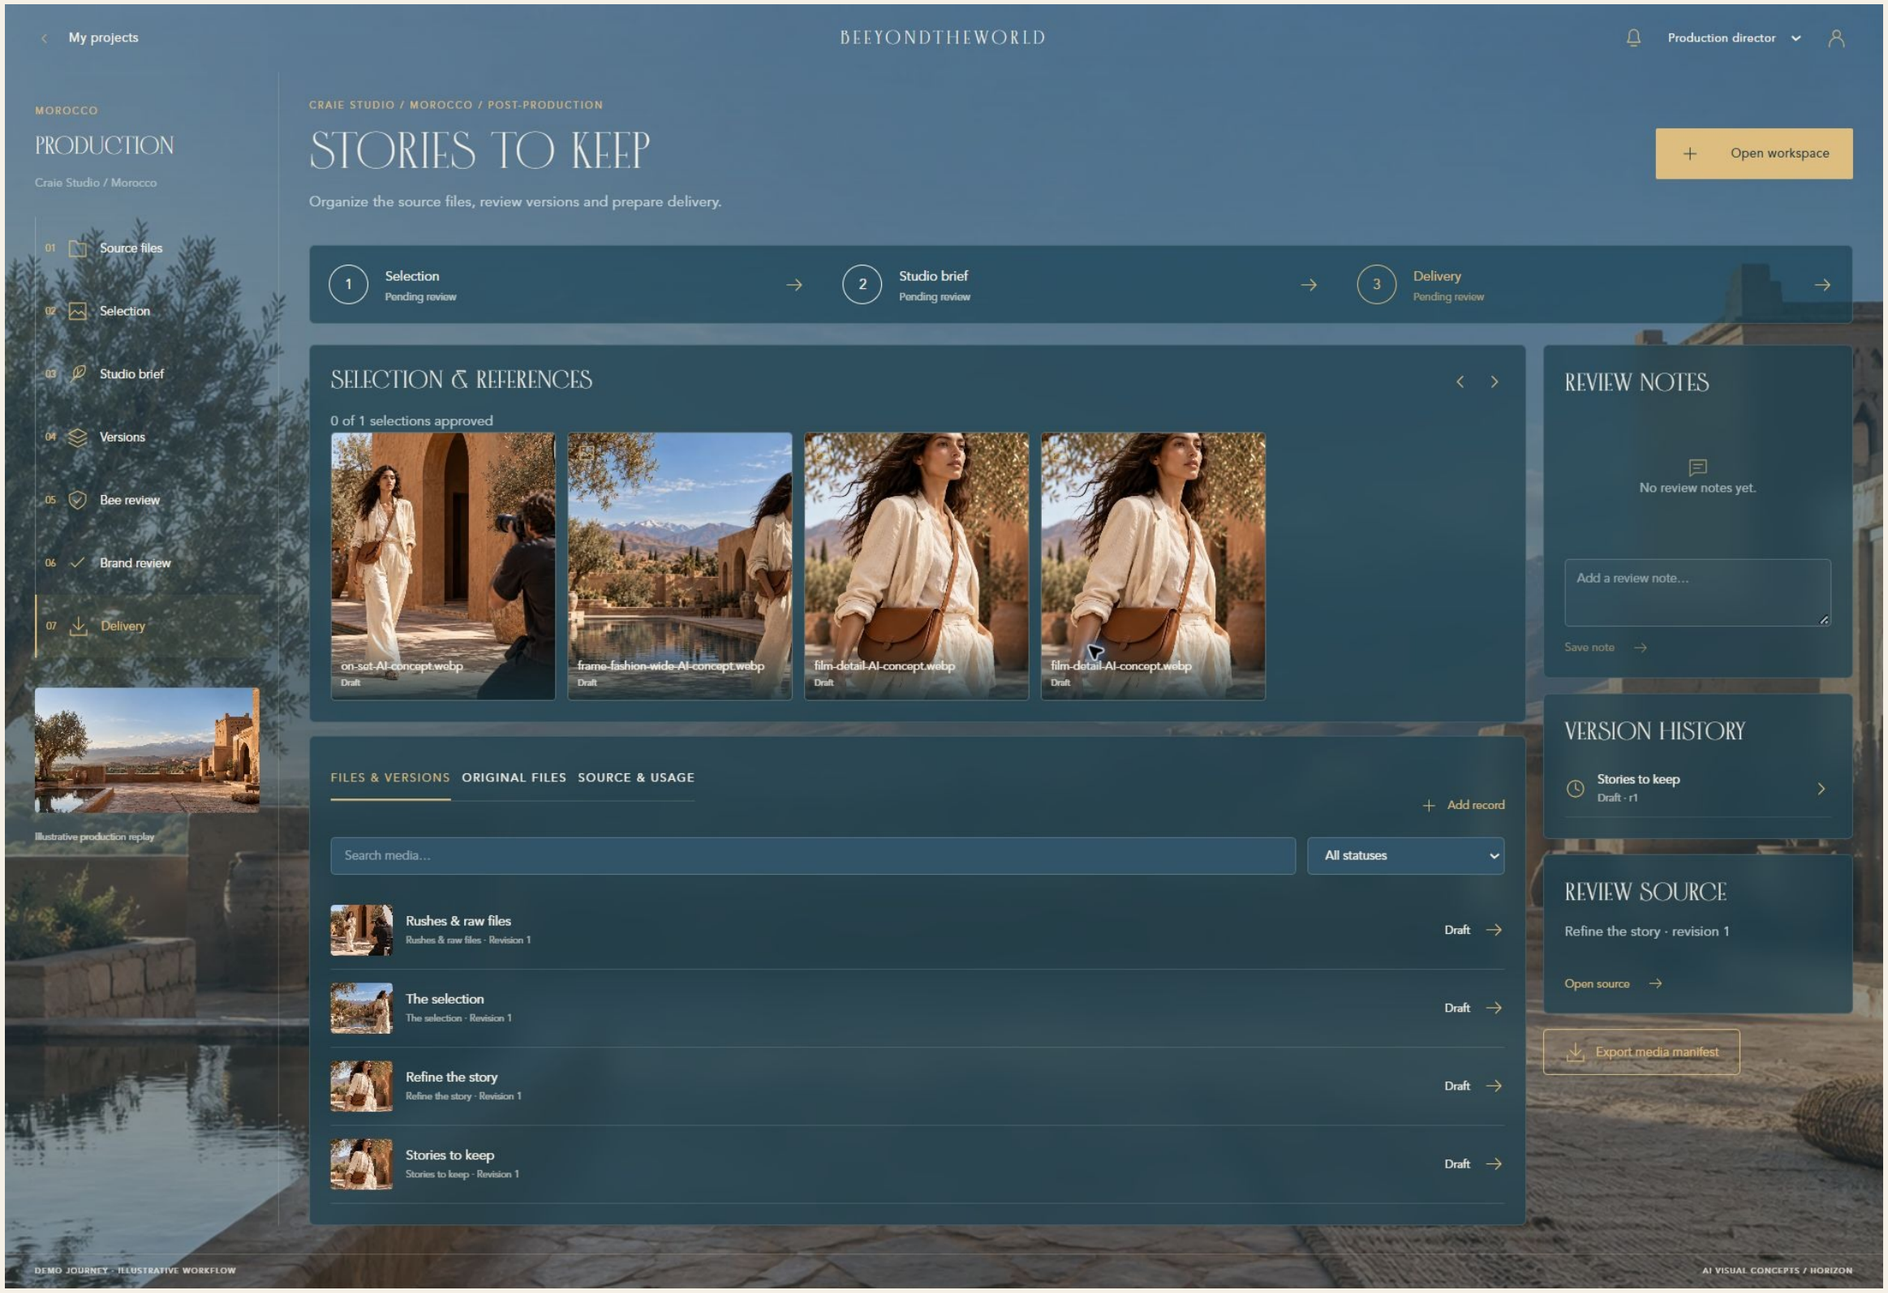

À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Vérifier les fichiers, formats, versions et usages. Le cas prévoit 12 photos et 6 exports film ; ce guide illustre leur livraison, il ne fournit pas de films.

CE QUI PASSE À LA SUITE

Une livraison ne vaut ni publication publique ni extension des droits. Postproduction et Bee vers marque.

10 / LIVRAISON ET ARCHIVAGE • 20 NOVEMBRE

Droits et extensions

Préparer / compléter

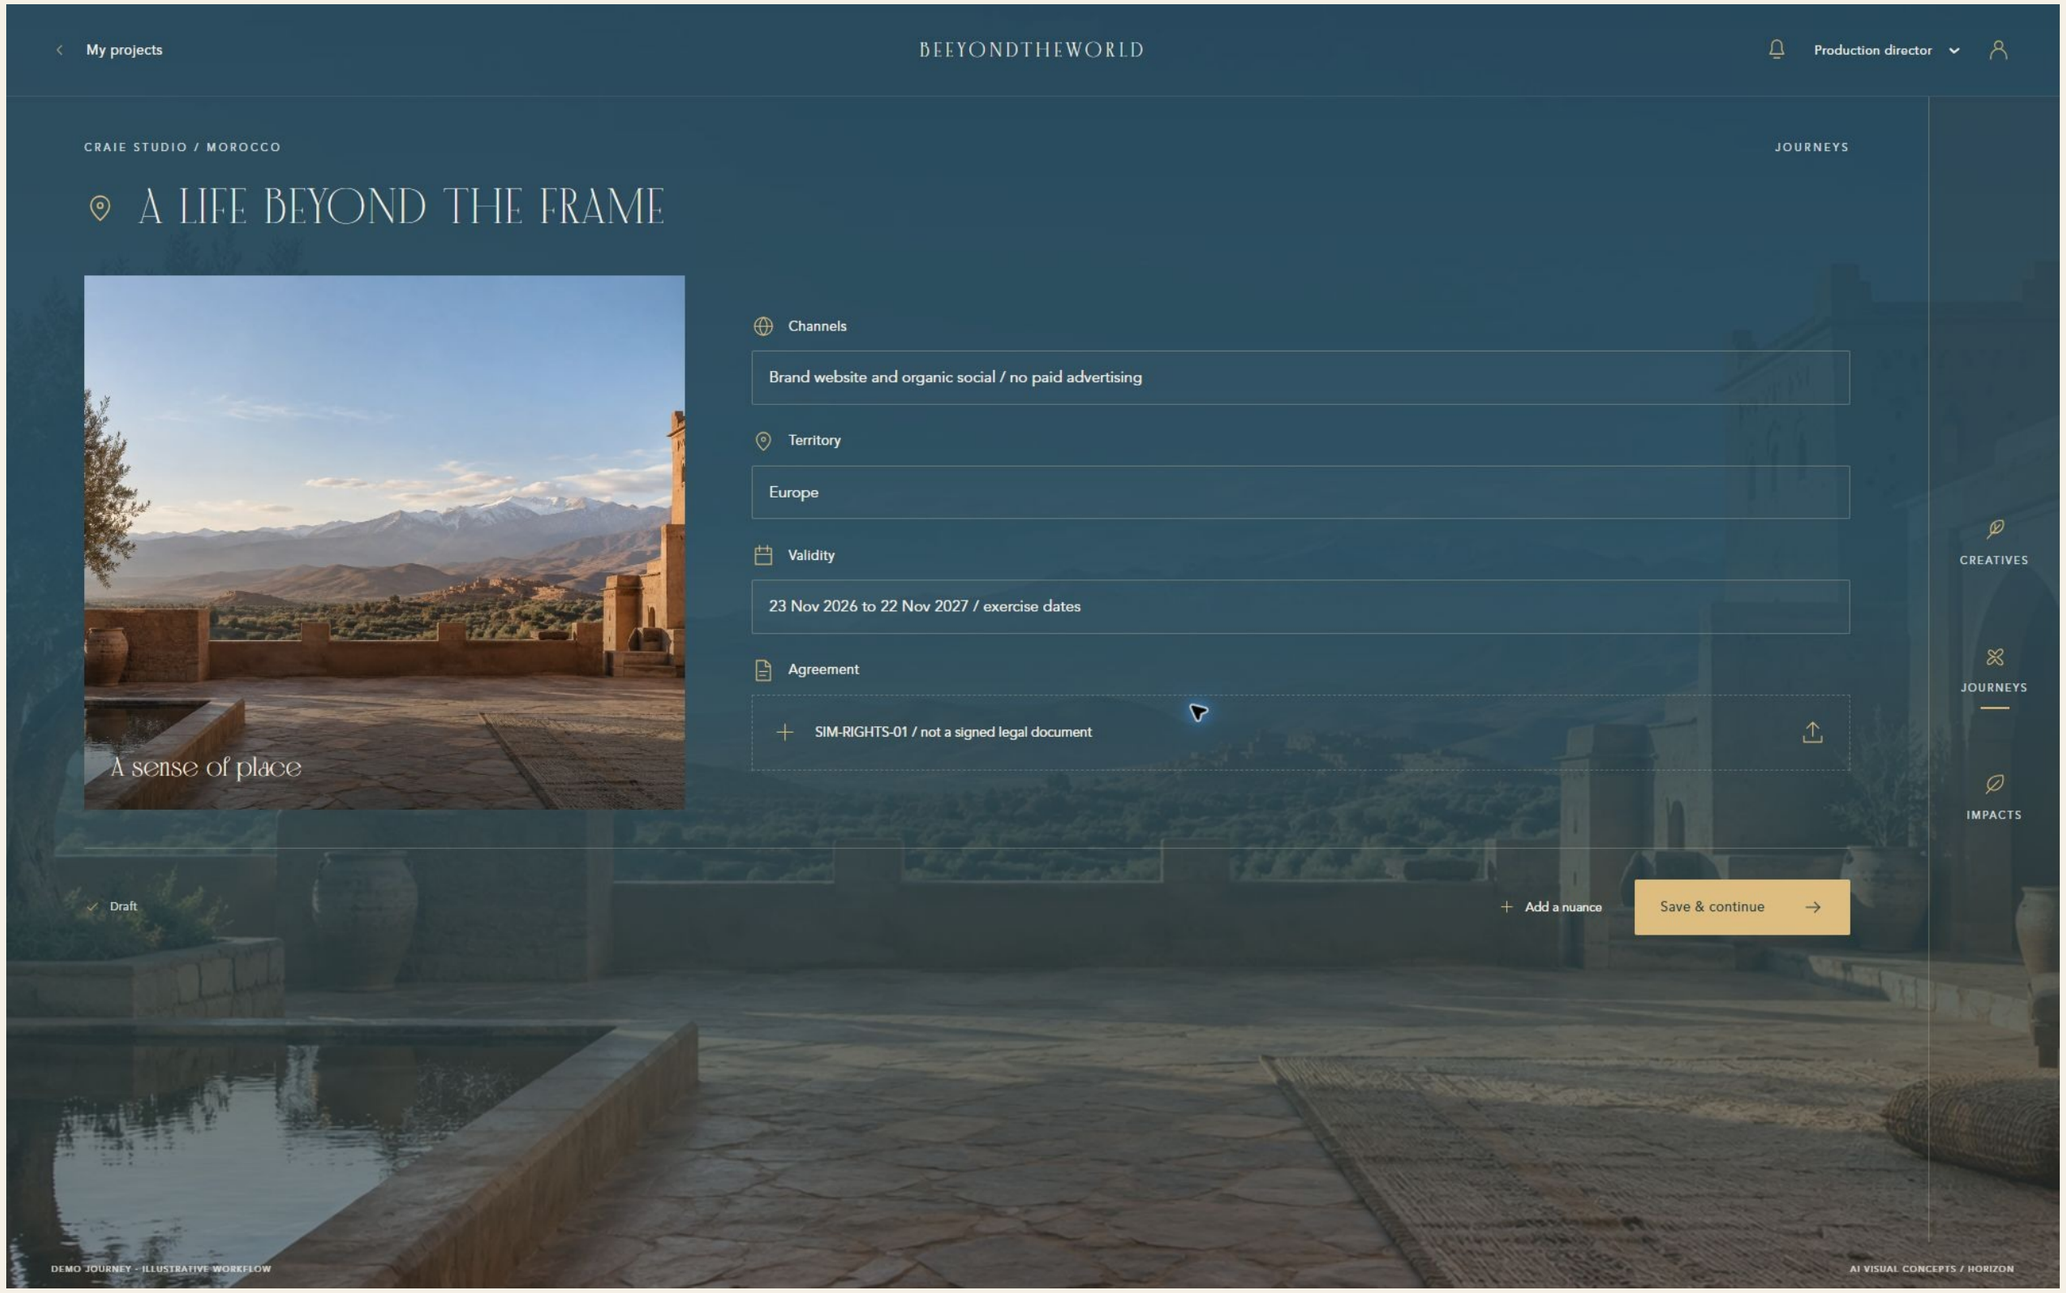

À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Préparer les informations et références affichées, vérifier leur cohérence avec le brief puis transmettre au responsable de l'étape.

CE QUI PASSE À LA SUITE

Une livraison ne vaut ni publication publique ni extension des droits. Postproduction et Bee vers marque.

10 / LIVRAISON ET ARCHIVAGE • 20 NOVEMBRE

Archives et enseignements

Préparer / compléter

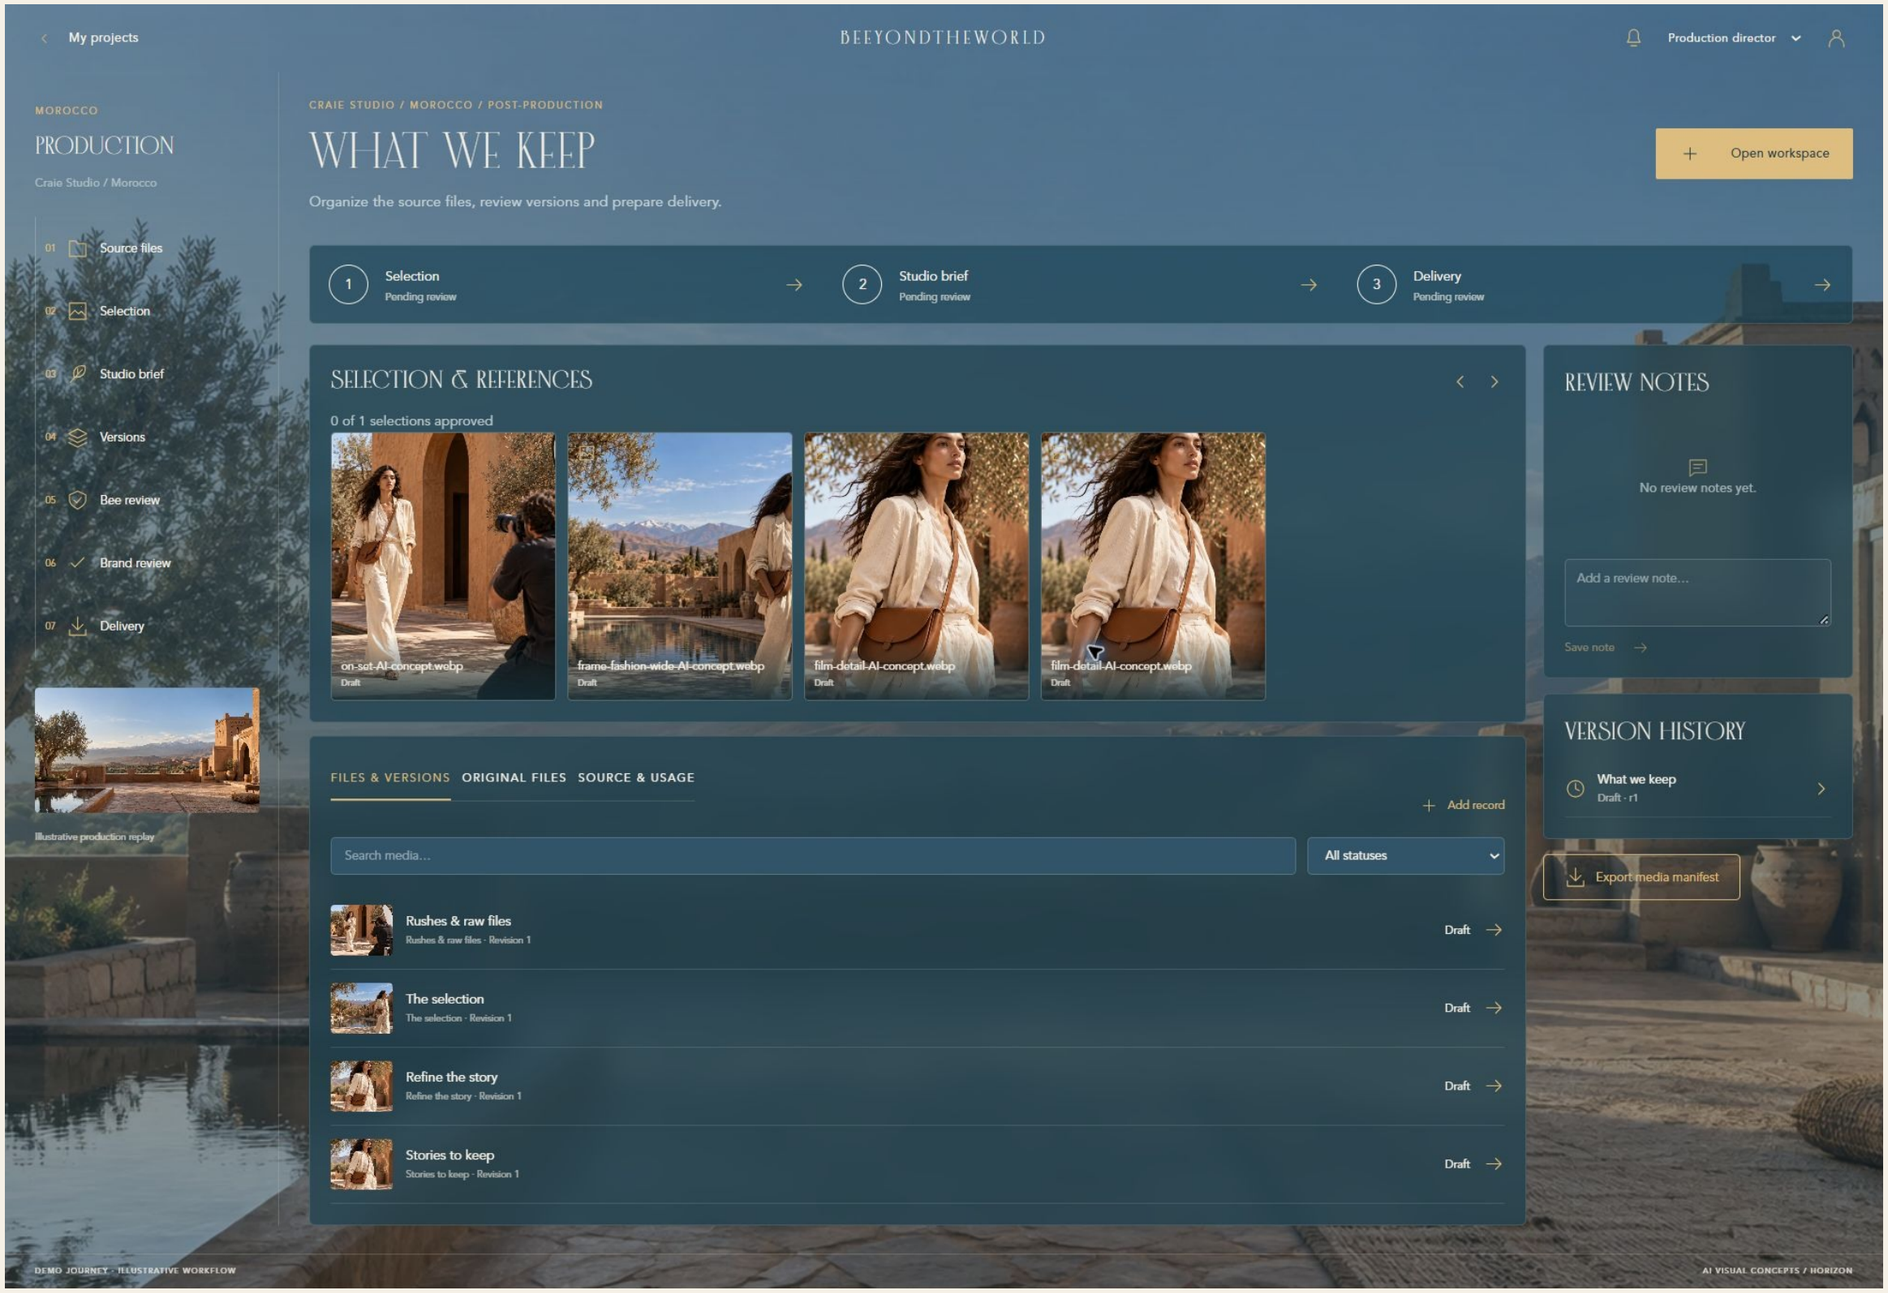

À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Préparer les informations et références affichées, vérifier leur cohérence avec le brief puis transmettre au responsable de l'étape.

CE QUI PASSE À LA SUITE

Une livraison ne vaut ni publication publique ni extension des droits. Postproduction et Bee vers marque.

12 / HONEY : BILAN ET PROCHAINE PRODUCTION • APRÈS RÉCONCILIATION

Bilan de production

Préparer / compléter

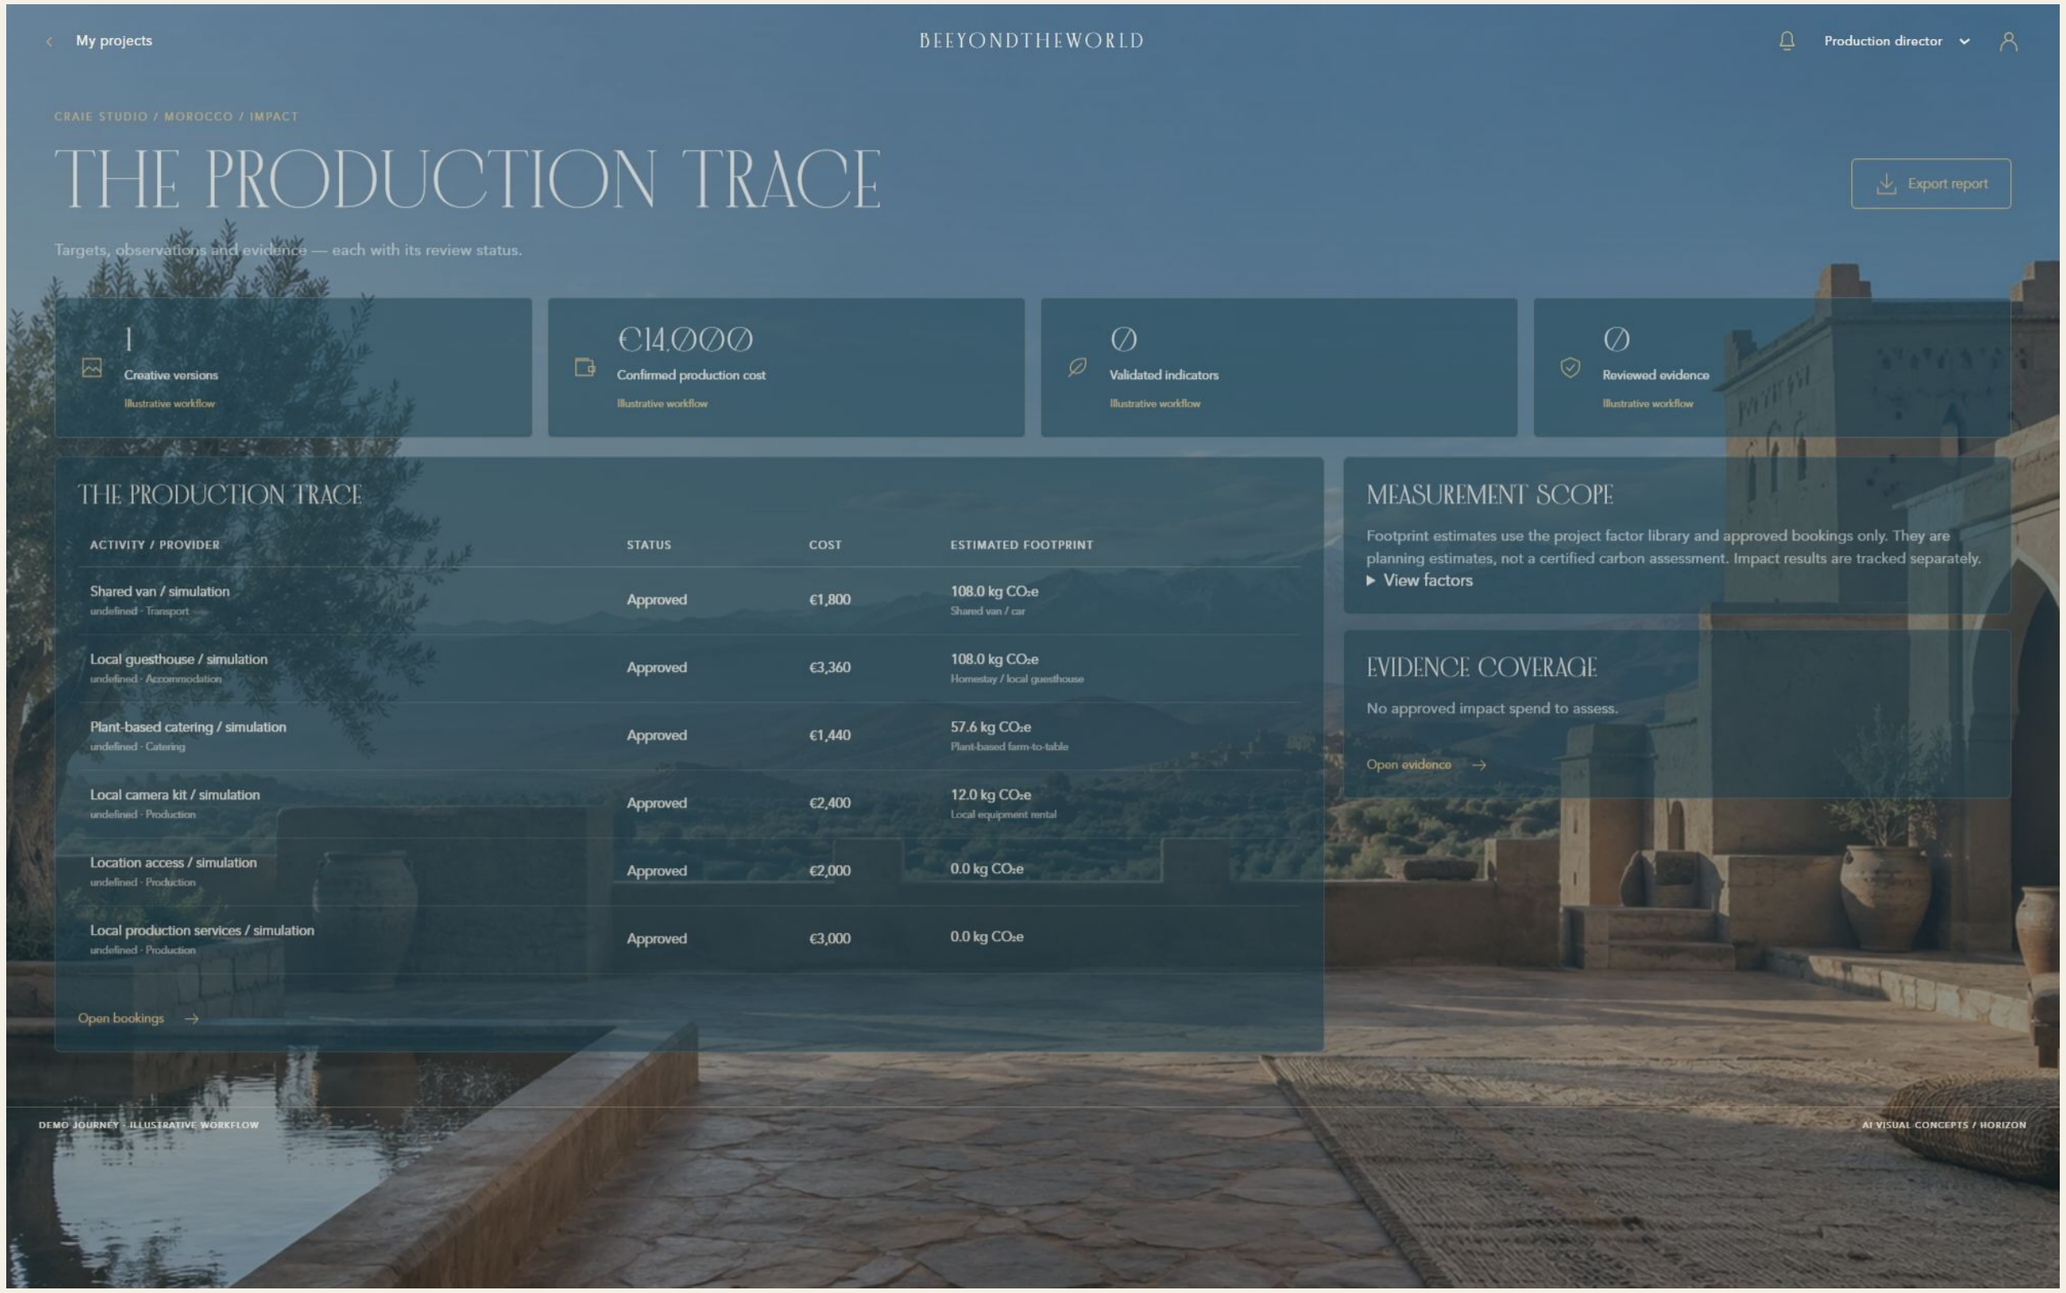

À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Préparer les informations et références affichées, vérifier leur cohérence avec le brief puis transmettre au responsable de l’étape.

CE QUI PASSE À LA SUITE

Les montants et mesures de ce dossier sont fictifs ; aucune allégation réelle n’est publiée. Bee vers marque et équipe.

12 / HONEY : BILAN ET PROCHAINE PRODUCTION • APRÈS RÉCONCILIATION

Bilan social de production

Préparer / compléter

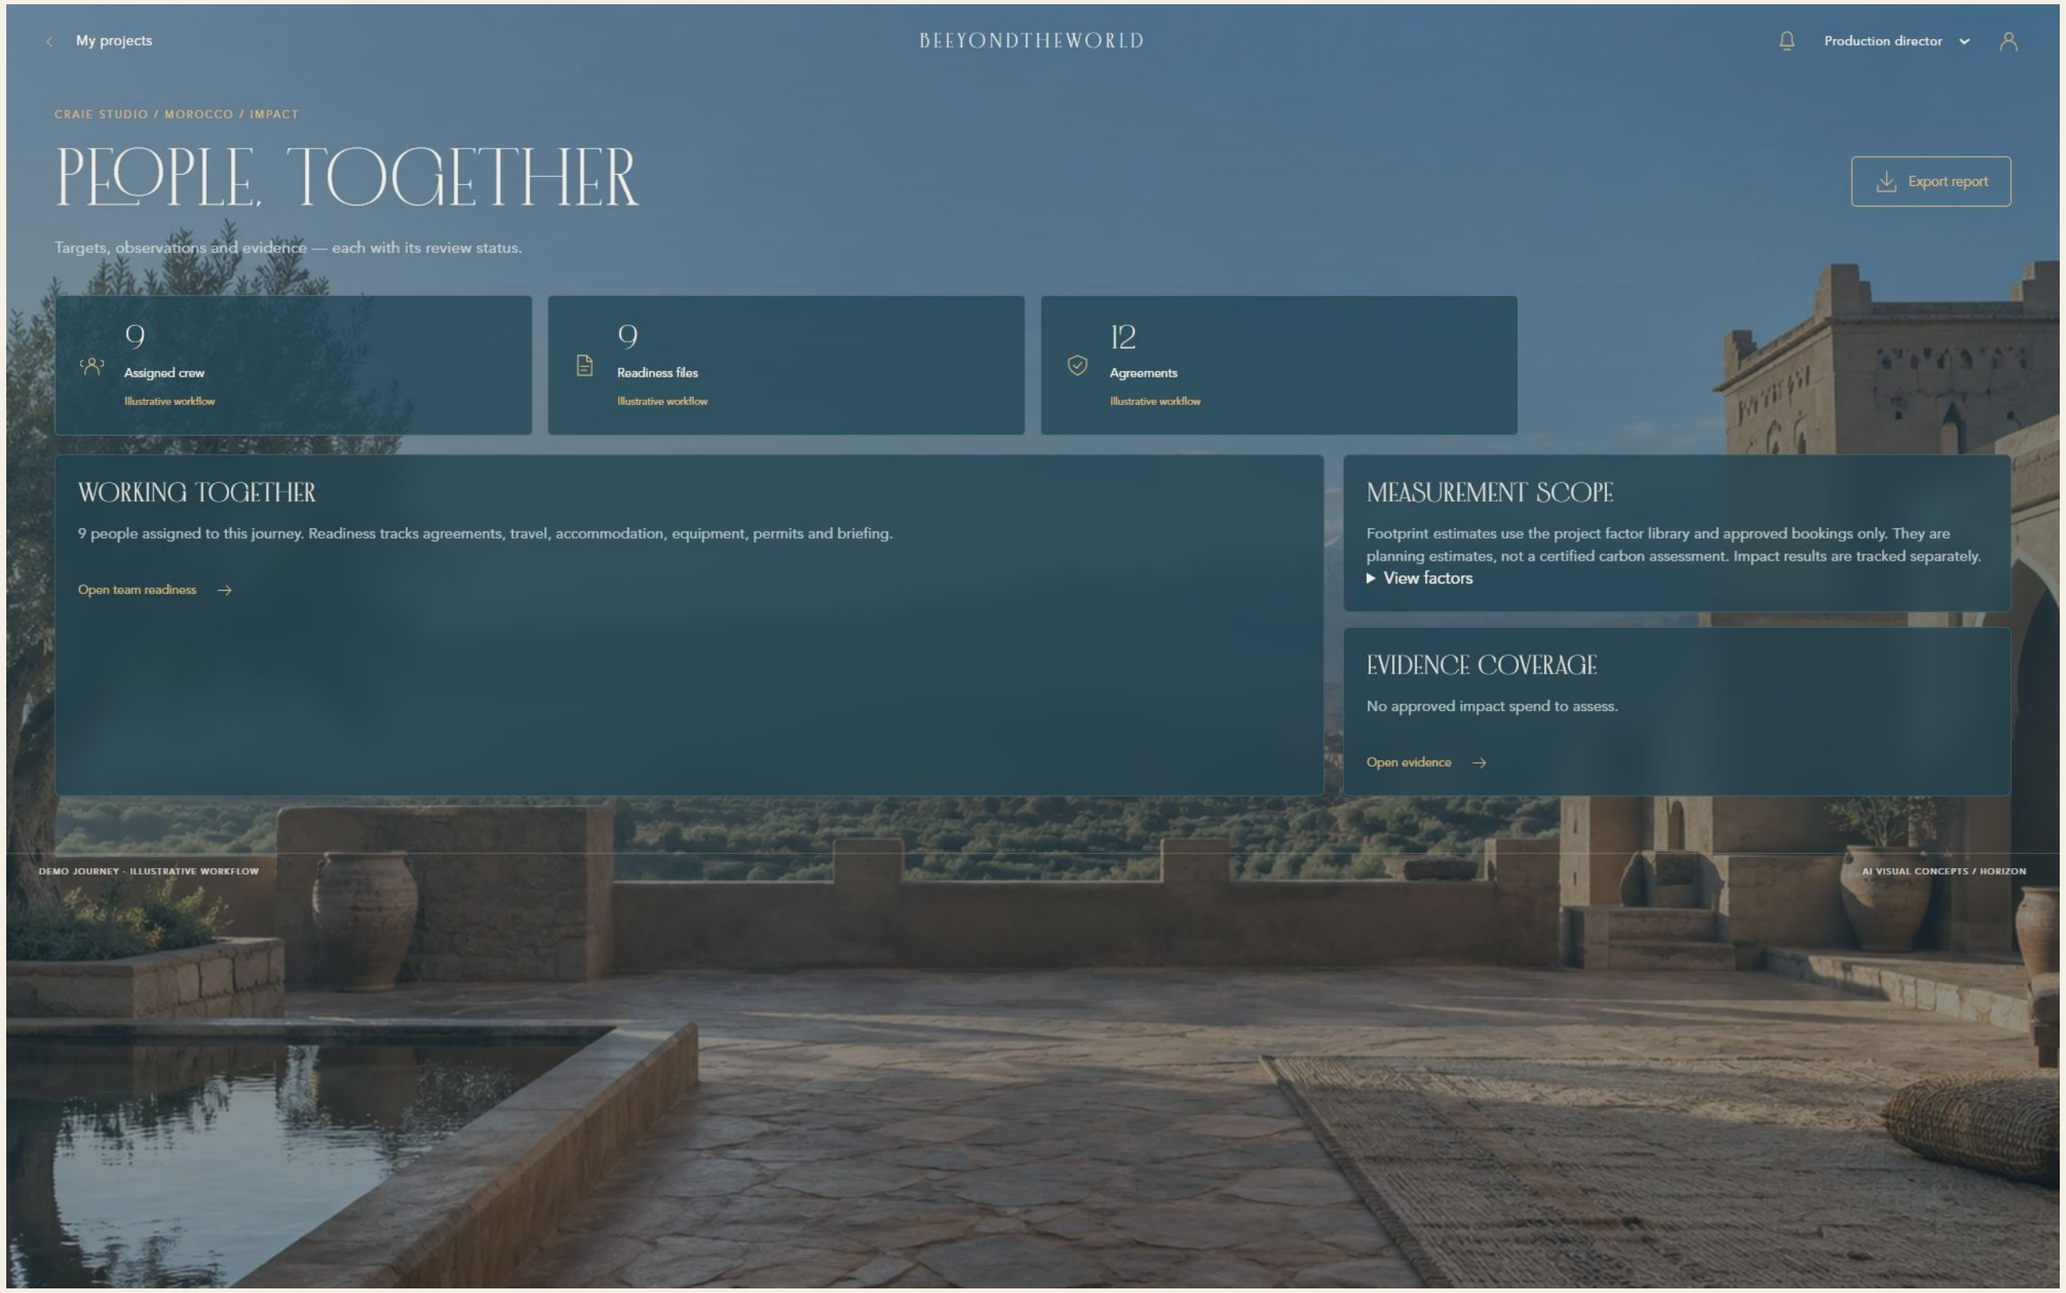

À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Préparer les informations et références affichées, vérifier leur cohérence avec le brief puis transmettre au responsable de l’étape.

CE QUI PASSE À LA SUITE

Les montants et mesures de ce dossier sont fictifs ; aucune allégation réelle n’est publiée. Bee vers marque et équipe.

12 / HONEY : BILAN ET PROCHAINE PRODUCTION • APRÈS RÉCONCILIATION

Bilan environnemental de production

Préparer / compléter

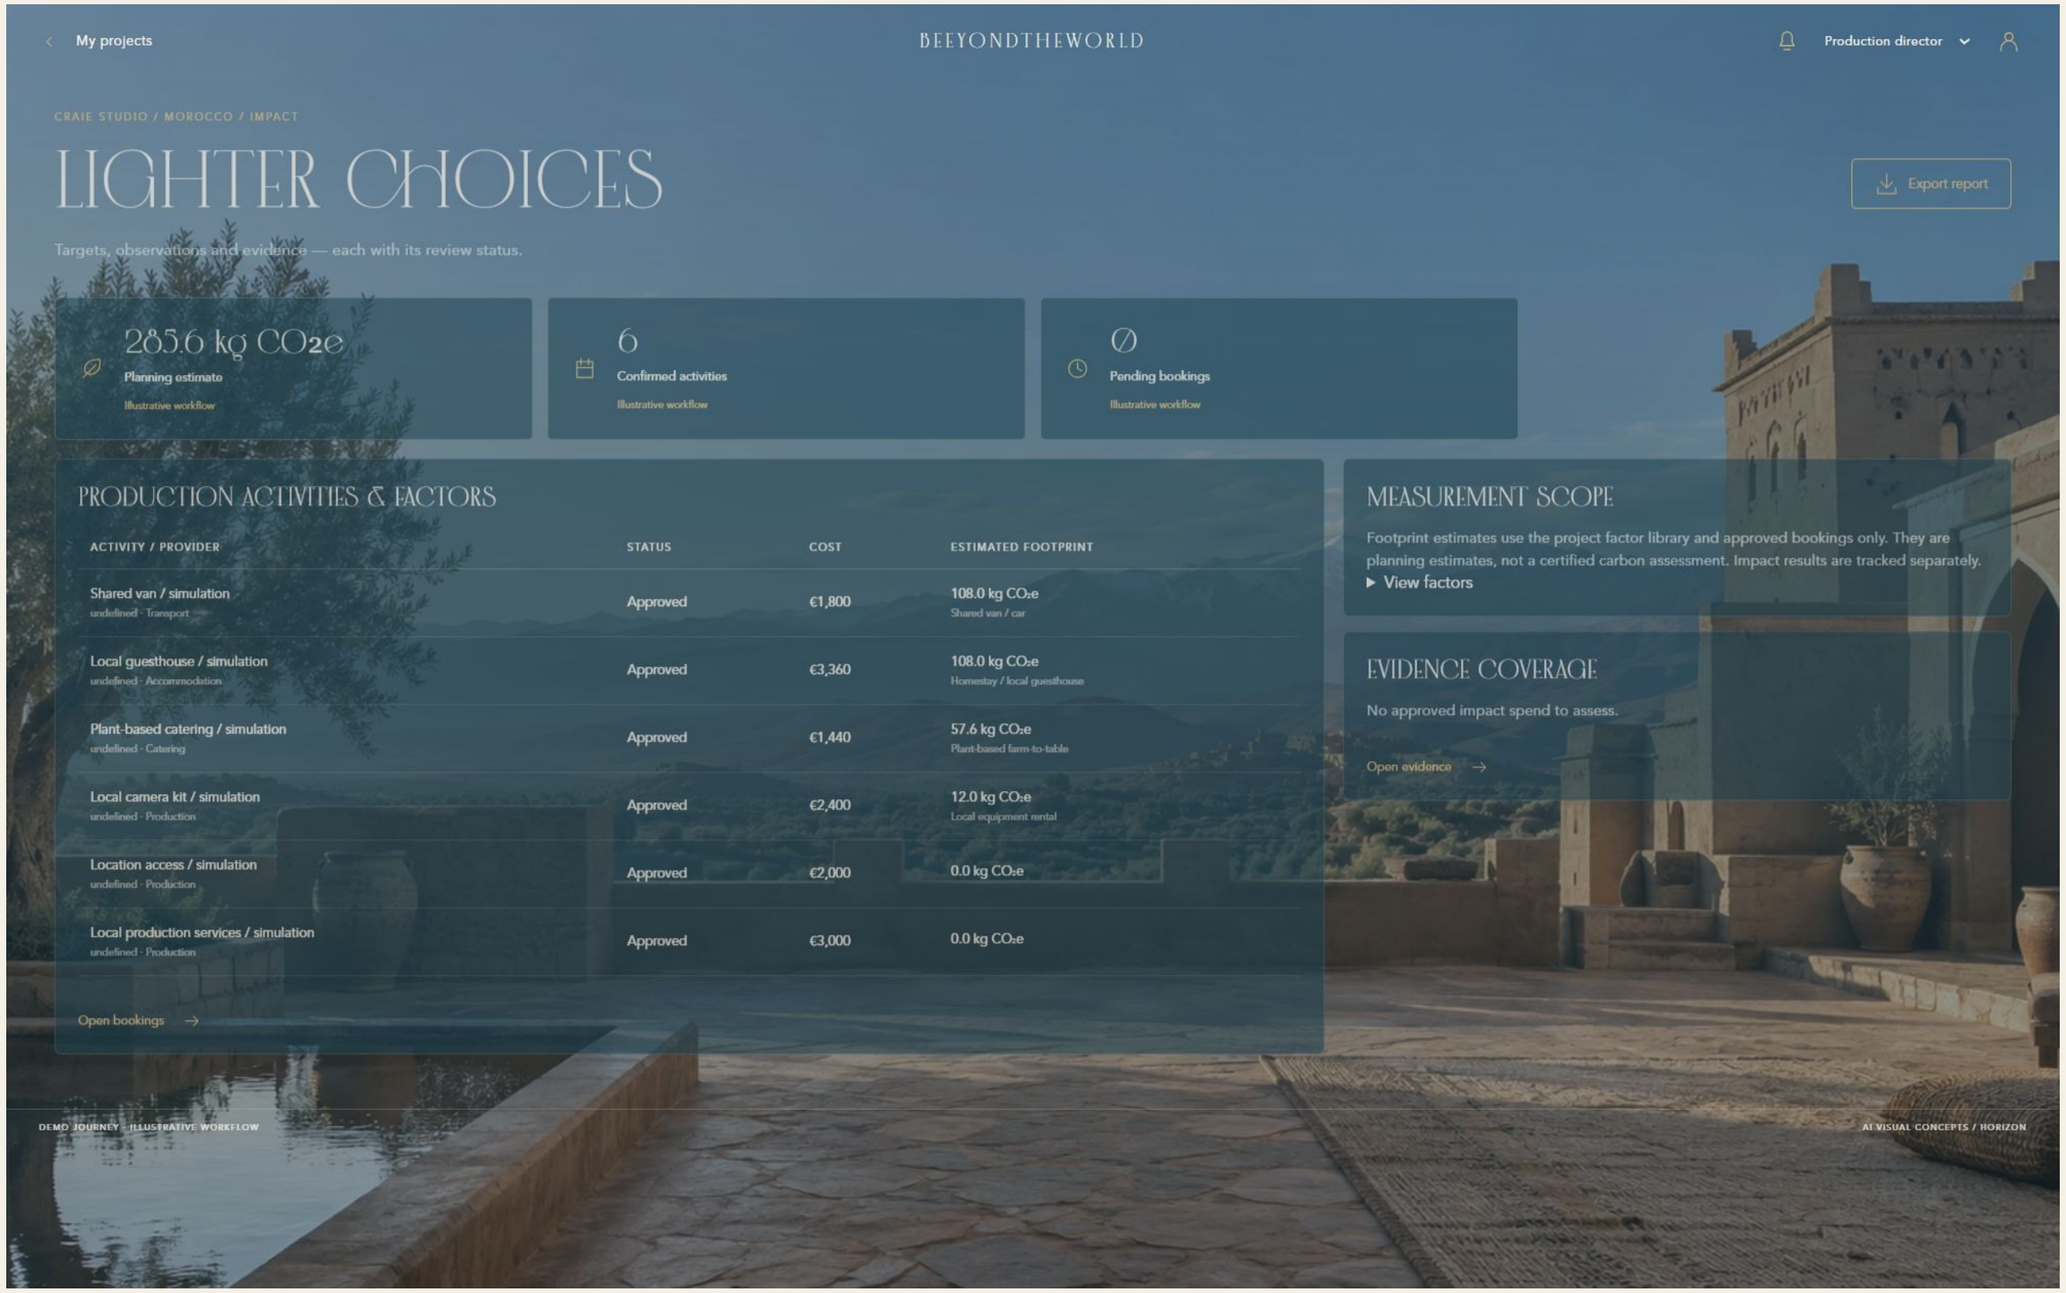

À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Préparer les informations et références affichées, vérifier leur cohérence avec le brief puis transmettre au responsable de l'étape.

CE QUI PASSE À LA SUITE

Les montants et mesures de ce dossier sont fictifs ; aucune allégation réelle n'est publiée. Bee vers marque et équipe.

12 / HONEY : BILAN ET PROCHAINE PRODUCTION • APRÈS RÉCONCILIATION

Bilan économique de production

Préparer / compléter

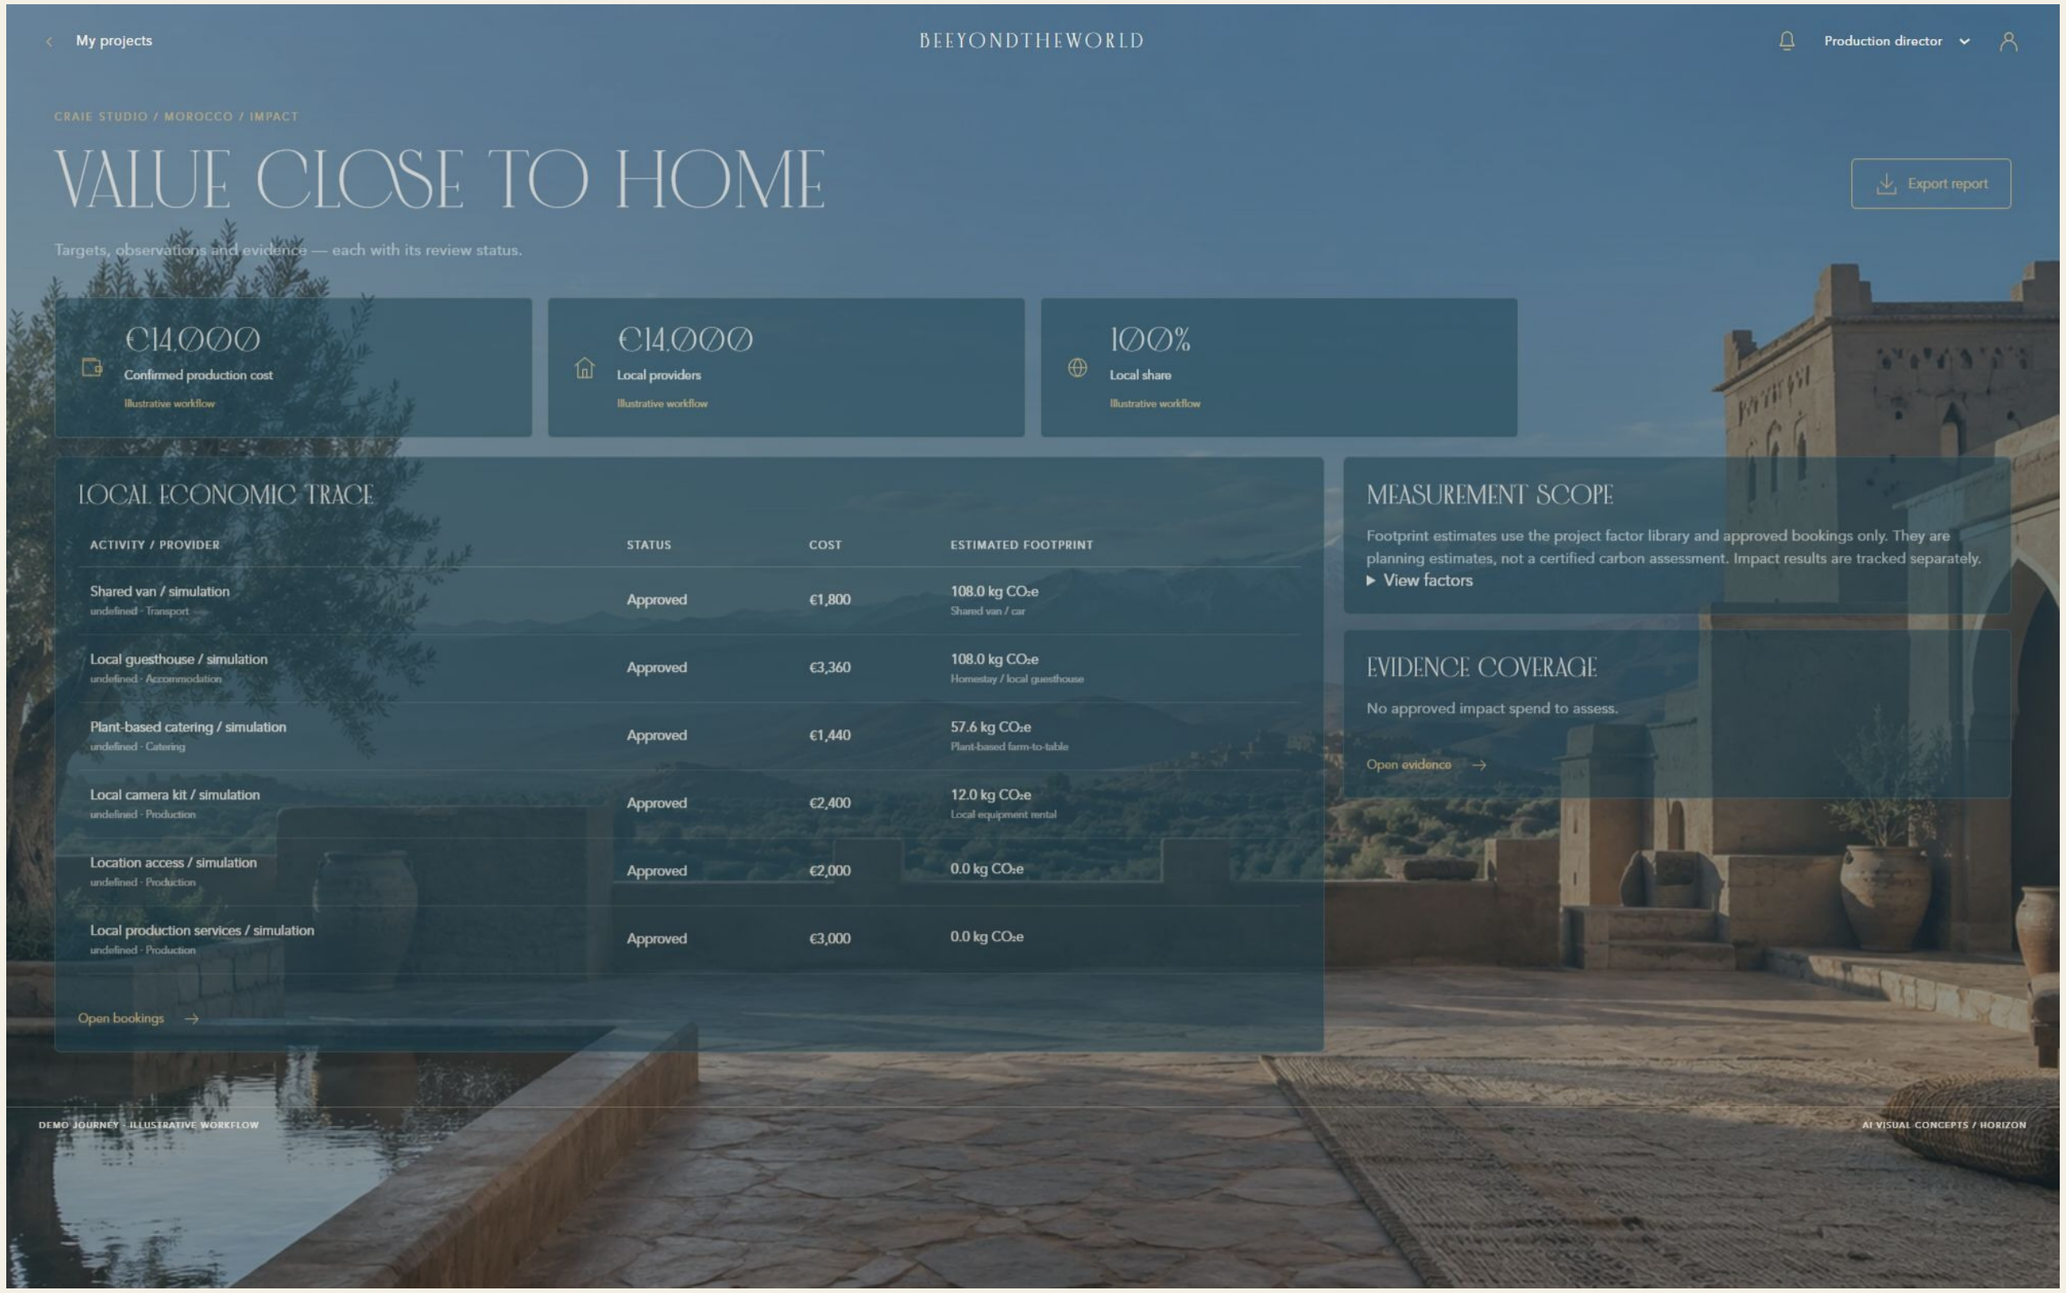

À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Préparer les informations et références affichées, vérifier leur cohérence avec le brief puis transmettre au responsable de l’étape.

CE QUI PASSE À LA SUITE

Les montants et mesures de ce dossier sont fictifs ; aucune allégation réelle n’est publiée. Bee vers marque et équipe.

12 / HONEY : BILAN ET PROCHAINE PRODUCTION • APRÈS RÉCONCILIATION

Synthèse du capital créatif

Consulter

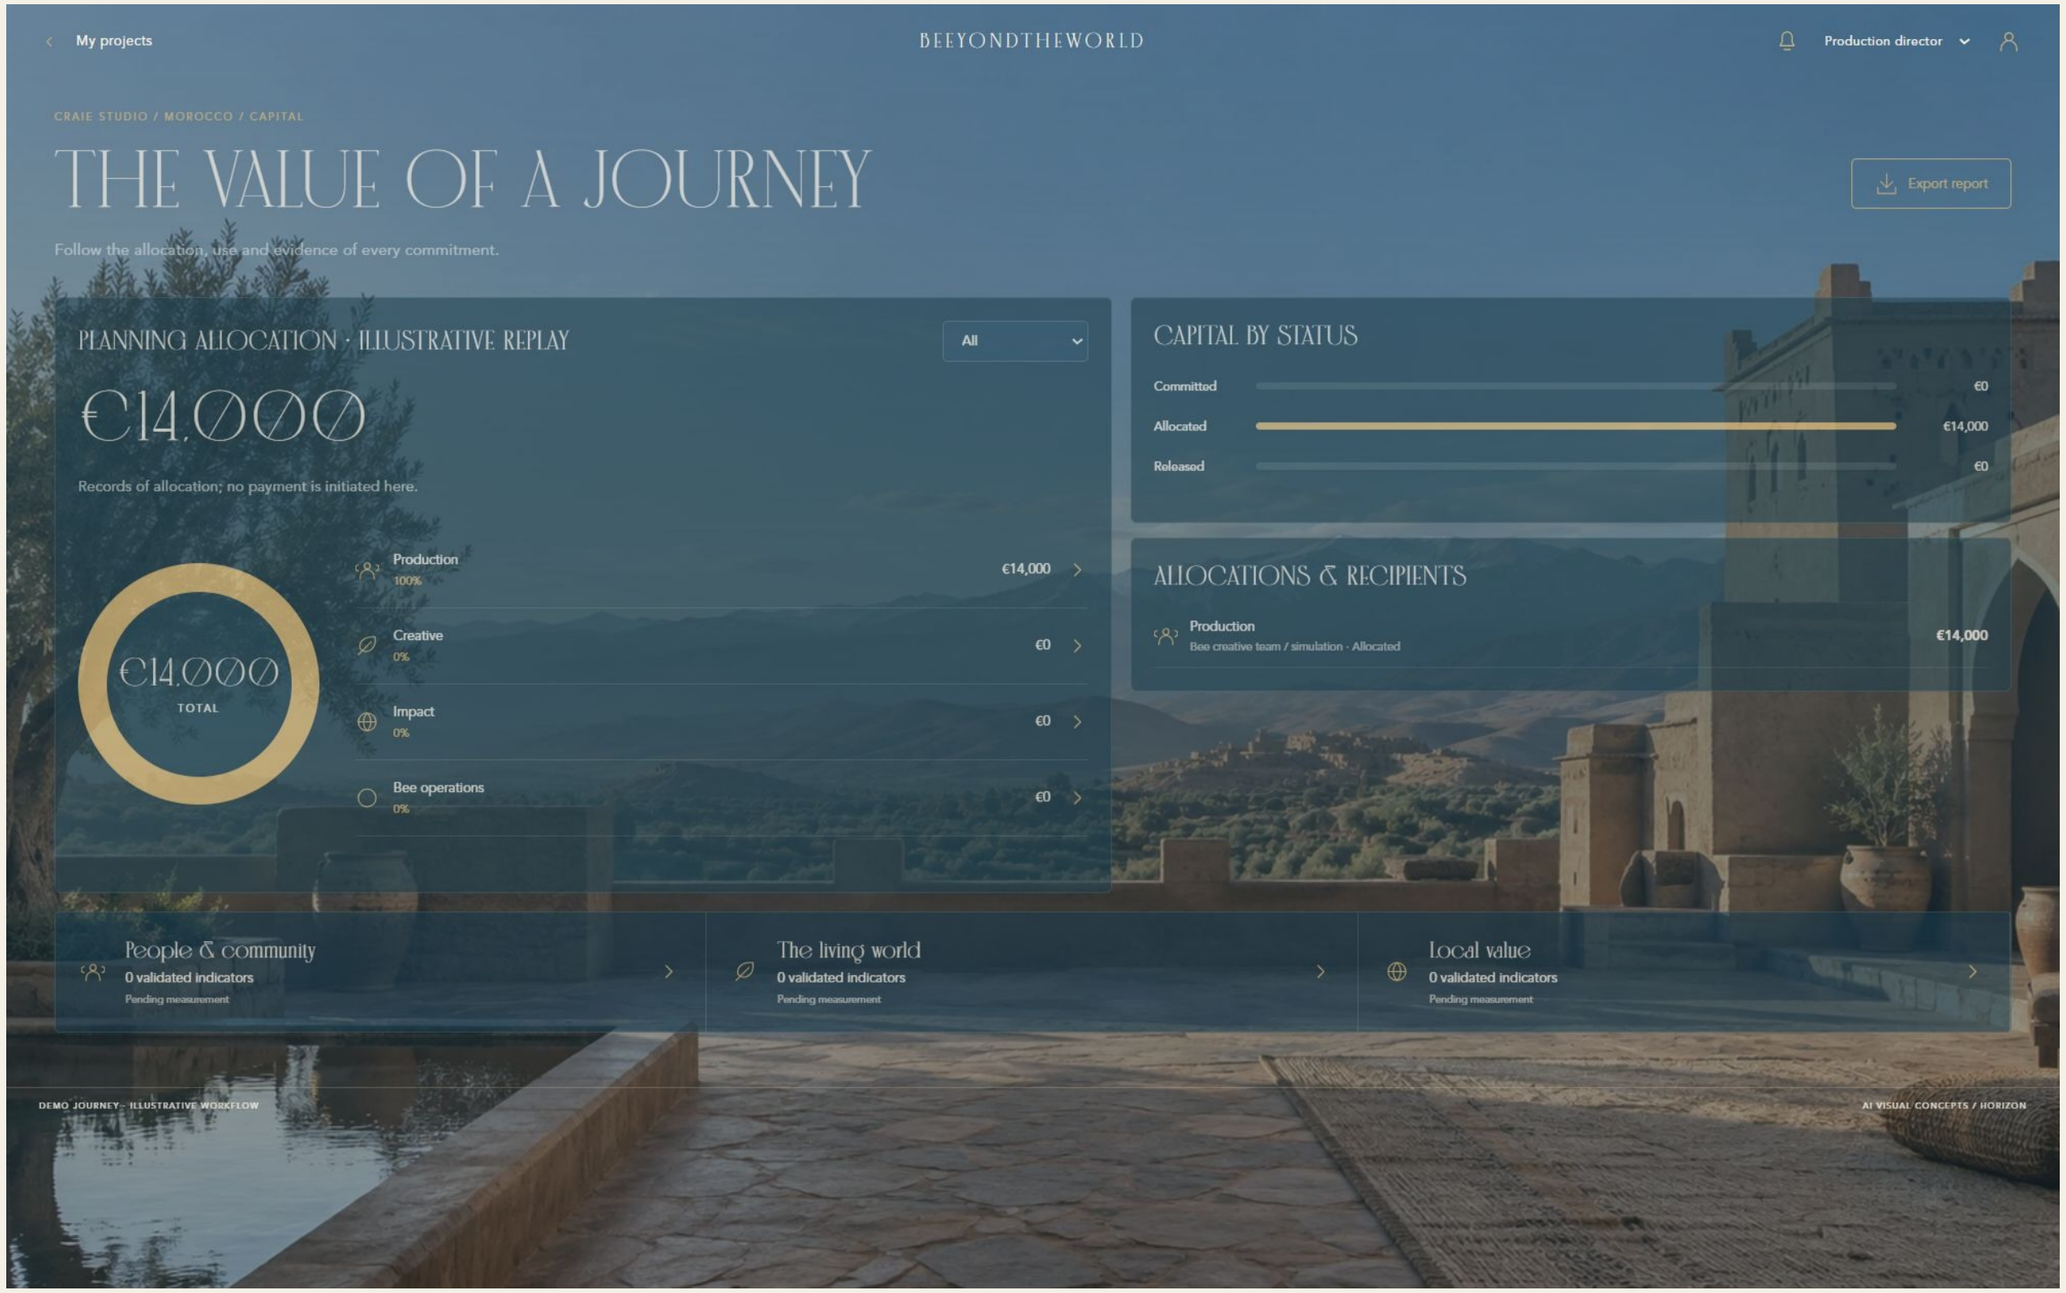

À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Lire les informations utiles à sa mission et vérifier la version. Transmettre une question au responsable de cette étape si un élément manque.

CE QUI PASSE À LA SUITE

Les montants et mesures de ce dossier sont fictifs ; aucune allégation réelle n'est publiée. Bee vers marque et équipe.

12 / HONEY : BILAN ET PROCHAINE PRODUCTION • APRÈS RÉCONCILIATION

Rapport et diffusion

Consulter et orienter

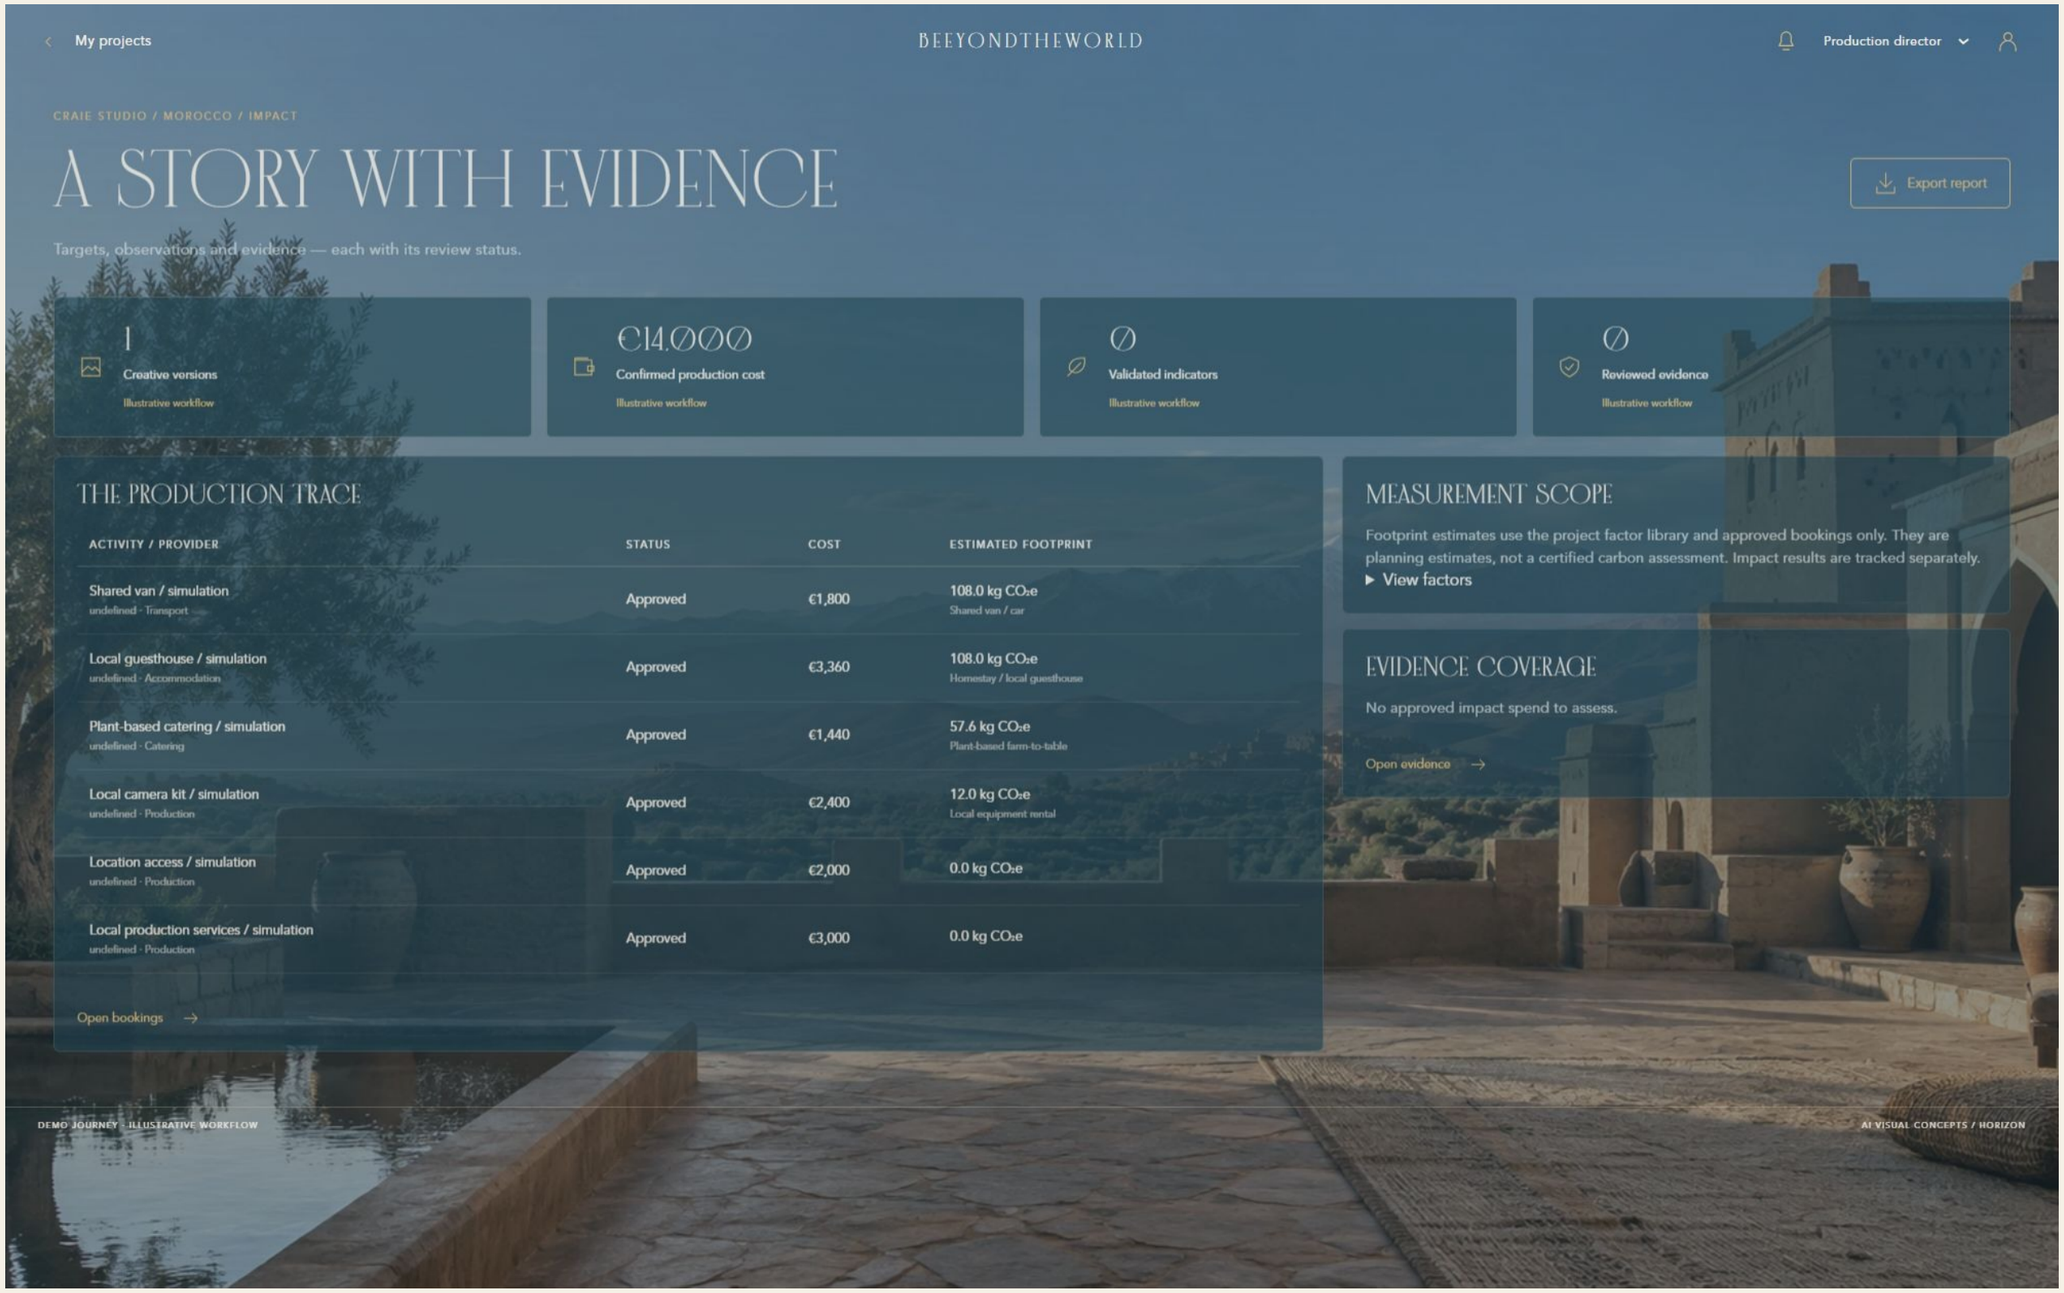

À FAIRE SUR CET ÉCRAN

Relier les livrables créatifs, dépenses, activité de production et résultats admis. Conserver le périmètre et les limites de chaque mesure.

CE QUI PASSE À LA SUITE

Les montants et mesures de ce dossier sont fictifs ; aucune allégation réelle n'est publiée. Bee vers marque et équipe.

Votre contribution est prête quand…

01 LE BESOIN EST COMPRIS

Faire arriver la bonne personne, le bon produit et le bon matériel au bon endroit.

02 VOTRE PARTIE EST EXPLOITABLE

Un planning réaliste, une équipe prête, les accès, réservations et sources organisées.

03 LE RELAIS EST IDENTIFIÉ

Le brief, les cadres approuvés, le budget autorisé et les disponibilités.

04 LE PÉRIMÈTRE EST RESPECTÉ

La production propose les dépenses ; Bee garde la décision budgétaire.

05 LA VERSION EST TRAÇABLE

Toute décision doit se rattacher à la bonne révision, au bon projet et au bon responsable.

06 LE CAS RESTE HONNÊTE

Les 12 photos et 6 exports film sont des livrables attendus du scénario. Le présent dossier fournit des écrans et images de concept ; aucun film réel ni preuve d’impact n’est livré.

Comment lire les fichiers

Utilisez les signets du lecteur PDF ou le parcours cliquable de la page 3. Zoomez dans chaque capture pour lire les champs. La galerie index.html permet de changer de métier, de phase et de page ; elle donne également accès aux autres guides et aux assets.

Référence réelle : beeyondtheworld.com/campaigns/craie-maroc
Méthode : rendu local des composants existants, données de simulation isolées, photographies de concept générées avec ChatGPT Image. Les schémas d’étapes et annotations sont éditoriaux. Aucune donnée de production n’a été modifiée pour fabriquer ce dossier.
